



T.C.
ADANA VALİLİĞİ



ADANA İLİ YATIRIMLARI

AĞUSTOS-2017



T.C.
ADANA VALİLİĞİ



ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



ULAŖTIRMA

Proje Adı	Çukurova Üniversitesi 57. Alay Camii 2 Adet Minare Ve Minare DıŖ Cephe Kaplaması İnŖaatı Yapım İŖi
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Üstyapı
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - BitiŖ Tarihi	15.05.2015-11.12.2016
Proje Bedeli(TL)	990.735,50 TL
İhale Bedeli(TL)	848.635,84 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	137.239,00 TL
2016Yıl İçi Harcama (TL)	696.393,94 TL
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	199.999,06 TL
2016Yılı Ödeneđi(TL)	1.220.000,00 TL
2016Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi GerçekleŖme (%)	70 %
Fiziki GerçekleŖme (%)	90%
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.
Proje Özet Bilgisi	

- ❖ 65 metre yüksekliğinde olacak 2 adet minare ve minarenin dıŖ cephesinin kaplanması
- ❖ Minarelerin yapılan yüksekliği bu aşamada 51 mt dir.
- ❖ Minare yüksekliği revize edilerek yüksekliği 61 metreden 65 metreye çıkarılmıştır.



ULAŖTIRMA

Proje Adı	Adana BykŖehir Belediyesi Hayvan Barınađı Yapılması Yapım İŖi
Proje No	-
Sektr ve Altsektr	styapı
Proje Yeri(İle)	ukurova
BaŖlama - BitiŖ Tarihi	11.12.2015-03.04.2017
Proje Bedeli(TL)	6.630.217,82 TL
İhale Bedeli(TL)	4.741.200,40 TL
nceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2016Yıl İi Harcama (TL)	2.377.530,42 TL
2016Yılı deneđi(TL)	8.250.000,00 TL
2016Yılı Gnderilen Ek denek(TL)	-
Nakdi GerekleŖme (%)	29%
Fiziki GerekleŖme (%)	75%
Projenin Bugnk Durumu	Devam Ediyor.
Proje zet Bilgisi	

- ❖ 40 dekar alan zerine yapılacak olan hayvan barınađı 2000 hayvan alanı ve idari bina yapılmaktadır.
- ❖ Belediyemiz sınırları ierisinde bulunan eski hayvan barınađının yerinin Ŗehir stadyumu olması nedeni ile ; ukurova ilesi Sđtl mahallesi civarlarında yapılan ok kapsamlı, modern hayvan barınađı yapılmaktadır.
- ❖ Hayvan Barınađı 2. Etap Proje alıŖmaları tamamlanmıŖ olup ihale aŖamasındadır.



ULAŖTIRMA

	Feke İlçesinde Muhtelif Yerlerde Taş Duvar İnşaatı Yapılması
Proje Adı	
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Üstyapı
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	24.08.2016-21.10.2016
Proje Bedeli(TL)	734.326,60 TL
İhale Bedeli(TL)	629.760,00 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2016Yıl İçi Harcama (TL)	548.175,00 TL
2016Yılı Ödeneđi(TL)	159.537.062,00 TL
2016Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	1 %
Fiziki Gerçekleşme (%)	85 %
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.
Proje Özet Bilgisi	
	<ul style="list-style-type: none">❖ Feke İlçesine bađlı Aytepesi, Belenköy, Kayadibi,Ormancık ve Sarız mevkieilerine taş duvar inşa edilmiştir.❖ Toplamda 158 metre uzunluğunda ortalama 2,5 metre eninde taş duvar yapılmıştır.



ULAŖTIRMA

	Beton Bariyer Alım İŖi
Proje Adı	
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Üstyapı
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - BitiŖ Tarihi	16.01.2017-16.06.2017
Proje Bedeli(TL)	1.341.120,00 TL
İhale Bedeli(TL)	1.260.000,00 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017Yıl İçi Harcama (TL)	408.870,00TL
2017Yılı Ödeneđi(TL)	7.074.785,49TL
2016Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	32%
Fiziki Gerçekleşme (%)	28%
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.
Proje Özet Bilgisi	



ULAŖTIRMA

Adana BykŖehir Belediyesinin Sorumluluęunda Olan Muhtelif Yollarda Sıcak Asfalt İle Yama Yapılması İŖi

Proje Adı

Proje No

Sektr ve Altsektr

Proje Yeri(İle)

BaŖlama - BitiŖ Tarihi

Proje Bedeli(TL)

İhale Bedeli(TL)

nceki Yıllar

Harcamaları(TL)

2017Yıl İi Harcama (TL)

2017Yılı deneęi(TL)

2016Yılı Gnderilen Ek

denek(TL)

Nakdi GerekleŖme (%)

Fiziki GerekleŖme (%)

Projenin Bugnk Durumu

Proje zet Bilgisi

❖ 39.000 m² sıcak asfalt ile yama yapılması

-

styapı

Adana

10.2.2017-6.12.2017

2.067.060,84 TL

1.575.600,00 TL

-

-

-

73.165.094,76TL

-

-

%

25 %

Devam Ediyor.



ULAŖTIRMA

Toki Adana Stadyum İnŖaatı Çevre Yollarının AŖılabilmesi İin İstinat Duvarı Yapım İŖi

Proje Adı

Proje No

-

Sektörü ve Altsektörü

Üstyapı

Proje Yeri(İle)

Adana

Başlama - BitiŖ Tarihi

16.2.2017-

Proje Bedeli(TL)

1.069.432,14 TL

İhale Bedeli(TL)

939.707,77TL

Önceki Yıllar

Harcamaları(TL)

-

2016Yıl İi Harcama (TL)

-

2016Yılı Ödeneđi(TL)

216.500.000,00 TL

2016Yılı Gönderilen Ek

Ödenek(TL)

-

Nakdi Gerekleşme (%)

1 %

Fiziki Gerekleşme (%)

65 %

Projenin Bugünkü Durumu

Devam Ediyor.

Proje Özet Bilgisi

❖ Farklı yükseklikte toplam 722 metre istinat duvarı yapılması



ULAŖTIRMA

Turhan Cemal Beriker Bulvarı
Altgeçidi Yangın Algılama,
Söndürme ve Üstgeçit Dekoratif
Aydınlatma Yapım İŖi

Proje Adı	
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Üstyapı
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	10.03.2017-07.06.2017
Proje Bedeli(TL)	409.903,57 TL
İhale Bedeli(TL)	290.327,00 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	325.297,00 TL
2017Yılı Ödeneđi(TL)	216.500.000,00 TL
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	- %
Fiziki Gerçekleşme (%)	100 %
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı
Proje Özet Bilgisi	

- ❖ 11 Kalem muhtelif yangın algılama, söndürme ve dekoratif aydınlatma işi.



ULAŖTIRMA

6 Kolordu Er Dinlenme Salonu İle
Askeri Hastane İersindeki Er
KoęuŖu Onarımı Yapılması Yapım İŖi

Proje Adı	
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Üstyapı
Proje Yeri(İle)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	08.03.2017-06.05.2017
Proje Bedeli(TL)	3.284.793,56 TL
İhale Bedeli(TL)	2.856.000,00 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İi Harcama (TL)	123.807,16 TL
2017Yılı Ödeneęi(TL)	5.000.000,00 TL
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerekleşme (%)	- %
Fiziki Gerekleşme (%)	- %
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.
Proje Özet Bilgisi	



ULAŖTIRMA

Ceyhan Kltr Tesisi İnaaatı
Yapılması Yapım İŖi

Proje Adı

Proje No

Sektr ve Altsektr

Proje Yeri(İle)

BaŖlama - BitiŖ Tarihi

Proje Bedeli(TL)

İhale Bedeli(TL)

nceki Yıllar

Harcamaları(TL)

2017 Yıl İi Harcama (TL)

2017Yılı deneĐi(TL)

2017Yılı Gnderilen Ek

denek(TL)

Nakdi GerekleŖme (%)

Fiziki GerekleŖme (%)

Projenin Bugnk Durumu

Proje zet Bilgisi

❖ 2.000 m² Ceyhan Kltr Tesisi inaaatı yapılması iŖi.




ULAŖTIRMA

Çukurova Üniversitesi Ceyhan
Meslek Yüksekokulu Çevre
Düzenlemesi ve Onarım Yapım İŖi

Proje Adı	
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Üstyapı
Proje Yeri(İlçe)	Ceyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	22.03.2017 19.06.2017
Proje Bedeli(TL)	166.971,09TL
İhale Bedeli(TL)	104.633,33 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	57.226,53 TL
2017Yılı Ödeneđi(TL)	5.000.000,00TL
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	1%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100%
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı
Proje Özet Bilgisi	

❖ 3.000 m² alanda çevre düzenlenmesi ve sulama sistemi yapılması

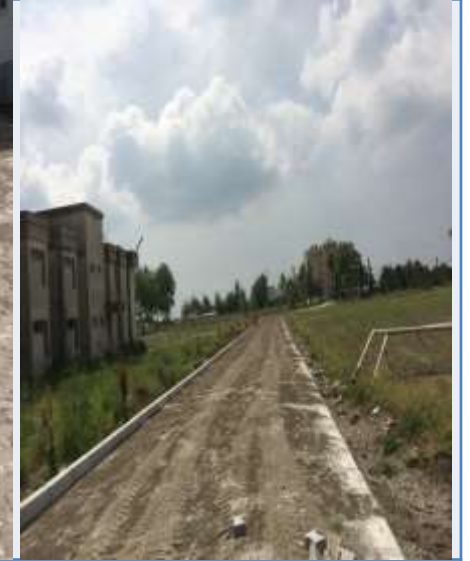

ULAŖTIRMA

Koruge Boru ve Lastik Conta Mal Alımı

Proje Adı

Proje No

Sektörü ve Altsektörü

Proje Yeri(İlçe)

Başlama - Bitiş Tarihi

Proje Bedeli(TL)

İhale Bedeli(TL)

Önceki Yıllar

Harcamaları(TL)

2017 Yıl İçi Harcama (TL)

2017Yılı Ödeneđi(TL)

2017Yılı Gönderilen Ek

Ödenek(TL)

Nakdi Gerçekleşme (%)

Fiziki Gerçekleşme (%)

Projenin Bugünkü Durumu

Proje Özet Bilgisi

Üstyapı

Adana

29.03.2017 24.10.2017

4.196.765.00 TL

2.839.140.00 TL

-

-

-

60.000.000TL

-

-

- %

- %

Devam Ediyor.

❖ 19.800 mt koruge boru

❖ 1650 adet lastik conta alımı



ULAŖTIRMA

	İdare Malı Malzeme İle Büyükşehir Belediyemiz Sorumluluęunda Bulunan Yerler İle Ana Cadde ve Bulvarlarda Kumlamalı Beton Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi Yapım İŖi
Proje Adı	
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Üstyapı
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	04.04.2017 01.08.2017
Proje Bedeli(TL)	1.205.572,15 TL
İhale Bedeli(TL)	1.200.000,00TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	-
2017Yılı Ödeneęi(TL)	207.606.578,55 TL
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	- %
Fiziki Gerçekleşme (%)	45 %
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.
Proje Özet Bilgisi	
❖ 40.000 m ² kumlamalı beton parke ve 19.000 m kumlamalı beton bordür döşenmesi	



ULAŖTIRMA

Proje Adı	Adana İli ukurova, Sarıam, Yüregir İlelerinin Baėlantısını Saėlayacak Olan Seyhan Nehri Üzeri elik ve Betonarme Köprüleri ile Bu Köprülere Baėlantılı Yol ve Kavşak İkmal İnşaatı Yapılması Yapım İŖi
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Üstyapı
Proje Yeri(İle)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	13.04.2017 -08.10.2018
Proje Bedeli(TL)	252.615.805,75 TL
İhale Bedeli(TL)	214.371.450,00 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İi Harcama (TL)	-
2017Yılı Ödeneėi(TL)	320.000.000,00 TL
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerekleşme (%)	- %
Fiziki Gerekleşme (%)	- %
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.
Proje Özet Bilgisi	
❖ 1.700 mt uzunluėunda 42 mt eninde köprü ve yan yolların yapılması.	



ULAŖTIRMA

Proje Adı	Büyükşehir Sorumluluğunda Bulunan Yerler ve Ana Cadde ve Bulvarlarda Kullanılmak Üzere Kumlamalı Beton Parke ve Bordür Taşı Alımı
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Üstyapı
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	13.04.2017 -11.07.2017
Proje Bedeli(TL)	1.415.490,00 TL
İhale Bedeli(TL)	1.396.500,00 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	499.131,16 TL
2017Yılı Ödeneği(TL)	207.606.578,55 TL
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	1 %
Fiziki Gerçekleşme (%)	30 %
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.
Proje Özet Bilgisi	

❖ 40.000 metrekare kumlamalı prizma taşı ve 30.000 adet kumlamalı bordür taşı alımı.



ULAŖTIRMA

Adalet Sarayının Gvenlięinde
Kullanılmak zere Demir Korkuluk
Yapılması Yapım İŖi

Proje Adı

Proje No

-

Sektr ve Altsektr

styapı

Proje Yeri(İlęe)

Adana

Başlama - BitiŖ Tarihi

10.05.2017-23.06.2017

Proje Bedeli(TL)

166.195,56 TL

İhale Bedeli(TL)

159.703,70 TL

nceki Yıllar

Harcamaları(TL)

-

2017 Yıl İi Harcama (TL)

176.967,86 TL

2017Yılı deneęi(TL)

3.224.577,66TL

2017Yılı Gnderilen Ek

denek(TL)

-

Nakdi GerekleŖme (%)

- %

Fiziki GerekleŖme (%)

100 %

Projenin Bugnk Durumu

Tamamlandı

Proje zet Bilgisi

❖ 296 mt korkuluk yapılması



ULAŖTIRMA

Proje Adı	Seyhan Uygulama Hastanesi Önüne Taş Duvar Yapılması ve Ceyhan Öğretmen Evi Zihinsel Engelli Öğrenciler İş ve Meslek Okulu Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ 1.Kısım Seyhan Uygulama Hastanesi Önüne Taş Duvar Yapılması İşİ
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Üstyapı
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	15.05.2017-13.06.2017
Proje Bedeli(TL)	175.335,89 TL
İhale Bedeli(TL)	149.636,51 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	-
2017Yılı Ödeneđi(TL)	24.349.634,98 TL
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	- %
Fiziki Gerçekleşme (%)	- %
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.
Proje Özet Bilgisi	
	❖ 601,45 m ³ ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması



ULAŖTIRMA

Proje Adı	Seyhan Uygulama Hastanesi Önüne Taş Duvar Yapılması ve Ceyhan Öğretmenevi Zihinsel Engelli Öğrenciler İş ve Meslek Okulu Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ 2 .Kısım Ceyhan Öğretmen Evi Zihinsel Engelli Öğrenciler İş ve Meslek Okulu Çevre Düzenlenmesi Yapım İşİ
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Üstyapı
Proje Yeri(İlçe)	Ceyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	15.05.2017-12.09.2017
Proje Bedeli(TL)	119.896,75 TL
İhale Bedeli(TL)	87.637,75TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	-
2017Yılı Ödeneđi(TL)	3.732.714,99 TL
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	- %
Fiziki Gerçekleşme (%)	90 %
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.
Proje Özet Bilgisi	
❖ 2600 m ² 6 cm yüksekliğinde parke taşı döşenmesi	



ULAŖTIRMA

Adana İli , Türkmenbaşı Bulvarı
Havaalanı Arası Devlet Demiryolları
Altgeçidi Tünel Aydınlatma
Armatürü ve Jeneratör Alımı İŖi

Proje Adı

Proje No

-

Sektörü ve Altsektörü

Üstyapı

Proje Yeri(İlçe)

Adana

Başlama - Bitiş Tarihi

18.05.2017-

Proje Bedeli(TL)

162.268,00 TL

İhale Bedeli(TL)

156.900,00 TL

Önceki Yıllar

Harcamaları(TL)

-

2017 Yıl İçi Harcama (TL)

-

2017Yılı Ödeneđi(TL)

200.377.630,53TL

2017Yılı Gönderilen Ek

Ödenek(TL)

-

Nakdi Gerçekleşme (%)

- %

Fiziki Gerçekleşme (%)

100 %

Projenin Bugünkü Durumu

Tamamlandı

Proje Özet Bilgisi

❖ 206 Adet Armatür

❖ 1 Adet Jeneratör mal alım işi



ULAŖTIRMA

	1.Kısım:Kıyboyu İstinat Duvarı Yapımı ve Ceyhan İlçesi Sarımaçı Yolu (1 Adet), Sarıçam İlçesi Yağızlar Mahallesi (1 Adet), Kargakekeç-Karaömerli Ana Yolu (1 Adet) Menfez Yapım İŖi
Proje Adı	
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Üstyapı
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - BitiŖ Tarihi	29.05.2017-
Proje Bedeli(TL)	646.855,72TL
İhale Bedeli(TL)	507.342,81TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	- TL
2017Yılı Ödeneđi(TL)	202.813.949,38TL
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi GerçekleŖme (%)	- %
Fiziki GerçekleŖme (%)	25 %
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.
Proje Özet Bilgisi	



ULAŖTIRMA

	2.Kısım: Dolaplı Mah. Eyüp Kurt Camii Çevre Duvarı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İŖi
Proje Adı	
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Üstyapı
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	148643,04 TL
İhale Bedeli(TL)	110.174,00 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	- TL
2017Yılı Ödeneđi(TL)	4.443.281,94 TL
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	- %
Fiziki Gerçekleşme (%)	- %
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.
Proje Özet Bilgisi	



ULAŖTIRMA

Proje Adı	5 Adet Hizmet Aracı
Proje No	-
Sektörü ve Alt sektörü	Denizcilik
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	10.08.2016 – 09.06.2017
Proje Tutarı (Yaklaşık Maliyet)	485.000
İhale Bedeli(TL)	448.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	248.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	200.000
2016 Yılı Ödeneđi(TL)	650.000
Toplam Ödenek	650.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	% 100
Fiziki Gerçekleşme (%)	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

Proje Özet Bilgisi

- 4 adet Gondol
- 1 adet Gezi Teknesi

Çevre Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile temin edilmektedir. Tüm su taşıtları teslim alınmış olup; Hizmete sunulmuştur.



ULAŖTIRMA

Proje Adı	30 Adet Hizmet Aracı ve İş Makinesi Alımı
Proje No	-
Sektörü ve Alt sektörü	Otomotiv – İş Makinesi
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	12.04.2016 –07.03.2017
Proje Tutarı (Yaklaşık Maliyet)	7.499.373.29
İhale Bedeli(TL)	6.987.363,67
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	6.627.385,35
2017 Yılı İçerisinde Harcama (TL)	359.978,32
2016 Yılı Ödeneği(TL)	7.499.373.29
Toplam Ödenek	7.499.373.29
Nakdi Gerçekleşme (%)	% 100
Fiziki Gerçekleşme (%)	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

Proje Özet Bilgisi

- 5 adet toprak silindiri,
- 1 adet mobil konkasör,
- 5 adet vakumlu süpürme aracı,
- 5 adet çekici,
- 1 adet lastik tekerlekli silindir,
- 2 adet bitüm tankeri, (**iptal edildi**)
- 1 adet kombine satıh kaplama makinesi,
- 7 adet cenaze nakil aracı,
- 3 adet hasta nakil ambulansı

Devlet Malzeme Ofisinden sipariş edilmiştir. Proje içinde yer alan 2 adet asfalt bitüm tankeri alımı işi iptal edilmiştir. 2017 yılı içinde kombine satıh kaplama makinesi alımı ile tüm araçlar teslim alınmış olup; Hizmete sunulmuştur.



ULAŖTIRMA

Proje Adı	Akülü Fayton Alımı
Proje No	-
Sektörü ve Alt sektörü	Otomotiv – İş Makinesi
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	10.05.2017
Proje Tutarı (Yaklaşık Maliyet)	67.260
İhale Bedeli(TL)	67.260
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.166.241,84
2017 Yılı Ödeneđi(TL)	12.650.000
Toplam Ödenek	12.650.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	% 100
Fiziki Gerçekleşme (%)	% 100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

Proje Özet Bilgisi

- 1 Adet Akülü Fayton

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı hizmet birimlerinde kullanılmak üzere; doğrudan temin usulü ile satın alınmıştır.



ULAŖTIRMA

Proje Adı	6 Adet Araç Alımı
Proje No	-
Sektörü ve Alt sektörü	Otomotiv – İş Makinesi
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	01.03.2017 – DMO Termini Bekleniyor
Proje Tutarı (Yaklaşık Maliyet)	434.171,64
İhale Bedeli(TL)	-
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	27.102.022
2017 Yılı İçi Harcama (TL)	359.978,32
2017 Yılı Ödeneđi(TL)	438.000
Toplam Ödenek	27.900.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	% 98
Fiziki Gerçekleşme (%)	% 98
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

- 1 Adet Minibüs
- 3 Adet Kombivan
- 2 Adet Panelvan

İller bankası Anonim Şirketi'nin 29.03.2016 Tarih ve 7465 Sayılı yazısında; Büyükşehir Belediyemize muhtelif iş makinesi ve araç alımı işinde kullanılmak üzere 27.900.000 TL tutarında kredi açılması uygun bulunmuş olup, söz konusu kredi kullanılarak 2016 yılı içerisinde ve 2017 yılı başında belirlenen araçların DMO kanalı ile satın alınması gerçekleştirilmiştir ve açılan bu krediden bir miktar para artmıştır. Arta kalan para ile 1 adet 8+1 kişilik minibüs, 3 adet kombivan ve mobil bakım aracı olarak kullanılabilen nitelikte 2 adet panelvan tipi araçların satın alınması için DMO kurumuna sipariş geçilmiş olup termin süresi beklenmektedir.





T.C.
ADANA VALİLİĞİ



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ç.Ü. Kuzey Çarşı Projesi
Proje No	1998 H 03 0440
Sektörü ve Altsektörü	EĞİTİM
Proje Yeri(İlçe)	Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	24.03.2015-09.01.2017
Proje Bedeli(TL)	5.876.751,00 TL
İhale Bedeli(TL)	4.766.034,18 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017 Yılı Harcama	4.766.034,18 TL
2017 Yılı Ödeneği(TL)	
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	Geçici kabulü yapılmış ve bina teslim alınmıştır.

Proje Özet Bilgisi

Şubat 2015' te işe başlanmıştır. Kompleks 20000 m2 arazi üzerine 3000 m2 kapalı, 1950 m2 yarı açık olacak şekilde planlanmıştır. Proje kapsamında sinema ve sergi salonları, kafeterya ve restoranlar, kitapevi, terzi, kuaför, mescit vs. için çeşitli büyüklükte mekanlar yer almaktadır.

Dükkan : 23 adet
Sinema :1 adet
Kafeterya : 9 adet
Pastane : 1 adet
Sergi salonu : 1 adet
Saat kulesi : 1 adet
Mescit : 1 adet
WC : 19 adet
Engelli WC : 3 adet
ATM : 7 adet



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ç.Ü. sağlık Hizmetleri MYO Binası Yapımı İşi		
Proje No	2014 H 05 0060		
Sektörü ve Altsektörü	EĞİTİM		
Karakteristiği			
Proje Yeri(İlçe)	Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA		
Başlama - Bitiş Tarihi	11.06.2015-10.02.2017		
Proje Bedeli(TL)	9.088.483,47		
İhale Bedeli(TL)	6.867.766,69 TL		
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)			
2017 Yılı Ödeneği(TL)			
201 Yılı Gönderilen Ödenek(TL)			
2017 Yılı Harcamaları(TL)	6.867.766,69 TL		
Nakdi Gerçekleşme (%)	100		
Fiziki Gerçekleşme (%)	100		
Projenin Bugünkü Durumu	Geçici kabulü yapılmış ve bina teslim alınmıştır.		
Proje Özet Bilgisi			
<p>Bu işin ihalesi 05.05.2015 tarihinde yapılmıştır. Eğitim binasında; zemin katta ikisi 104, ikisinde 206 kişilik olmak üzere 4 adet amfi, hem yarı açık hem de açık olmak üzere Ambulans garajları, Ambulans eğitim alanları, 16 Derslik, 5 Adet çok amaçlı laboratuvar, kütüphane, okuma salonu, kantin ve bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bütçesinin 2.150.000,00 TL' si Filpa Ambalaj ve Dış.Tic. A.Ş. Tarafından bağış olarak desteklenmiştir</p>			
Toplam Yapı Alanı	: 6011m2	ilk ve acil yrd.spor od.	:1 Adet
Laboratuvar	: 5 Adet	ilk ve acil yrd.derslik	:2 Adet
Amfi	: 4 Adet	Kantin	: 1 Adet
Ofis	:47 Adet	Teras	: 1 Adet
Atölye	: 1 Adet	Acil yrd.çam.od.	: 1 Adet
Salon	: 2 Adet	Ders araçları od.	:1 Adet
Asansör	: 1 Adet	ilk ve acil yrd.eğt.malz.od.	: 1 Adet
Merdiven	: 2 Adet	Temizlik odası	: 1 Adet
Yangın merdiveni	: 1 Adet	Ambulans garaj ve garaj içi uyg.salonu	:1 Adet
Engelli WC	: 4 Adet	Ambulans eğitim yarı açık alan	:1 Adet
İnternet odası	: 1 Adet	WC	: 9 adet



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ç.Ü. Tömer Binası Yapım İşi
Proje No	1998 H 03 0440
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim
Proje Yeri(İlçe)	Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	26.03.2015-11.09.2017
Proje Bedeli(TL)	
İhale Bedeli(TL)	3.961.193,66
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017 Yılı İçi Harcama	3.370.332,87
201 Yılı Ödeneği(TL)	
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	85
Fiziki Gerçekleşme (%)	88
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Ç.Ü.Tömer Binası Yapım İşi dir.Bu işin ihalesi 15.01.2015 tarihinde yapılmıştır. Bu ihale kapsamında Betonarma, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır.

Toplam Bina Alanı	:3400 m2	Toplantı Odası	: 1 Adet
Derslik	: 14 Adet	Sınav Birimi	: 1 Adet
Okutman Odası	: 10 Adet	WC Grubu	: 11 Adet
Kütüphane	: 1 Adet	İdari Per. Odası	: 7 Adet
Konferans Odası	: 1 Adet	Depo	: 2 Adet
Siğınak	: 1 Adet	Asansör	: 1 Adet
Aktivite Terası	: 133 m2	Enerji Odası Santral	: 1 Adet
Kafeterya	: 1 Adet		
Mescit(Bay-Bayan)	: 2 Adet		
Öğr.İşl-Muhasebe	: 1 Adet		
Çay Ocağı	: 2 Adet		
Mekanik Oda	: 1 Adet		



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ç.Ü. Onkoloji Hastanesi Yapım İşi
Proje No	2014I000150
Sektörü ve Altsektörü	SAĞLIK
Karakteristiği	
Proje Yeri(İlçe)	Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	21.03.2016-13.07.2019
Proje Bedeli(TL)	45.000.000,00 TL
İhale Bedeli(TL)	31.041.000,00 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	13.000.000 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek(TL)	
Toplam Harcama	4.654.482,45 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	14
Fiziki Gerçekleşme (%)	17
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Erişkin ve çocuk hasta grubu için Hematoloji ve Onkoloji bilim dallarına ait klinik ve poliklinikler yer alacaktır. 18'i kemik iliği nakil ünitesine ait toplam 190 hasta yatağı olacaktır. İhalesi 30.06.2015 tarihinde yapılmış olup 30.03.2016 tarihinde işe başlanmıştır. Binada 4 adet yüksek doz iyot uygulama odası, laboratuvarlar ve görüntüleme üniteleri bulunacaktır. Bütçesinin 16.000.000,00 TL' si Adana Verem Savaş Derneği tarafından bağış olarak desteklenmiştir.

Toplam Bina Alanı : 20.000 m2	Sığınak : 2 Adet
Hasta Odası :98 Adet	Asansör : 10 adet
Yoğun Bakım Od. : 9 Adet	Ayakta Ted.od. : 4 Adet
Öğr.Üyesi Odası : 16 Adet	WC Grubu : 5 Adet
Poliklinik : 19 Adet	Giyinme od. :24 Adet
Uzman Dok .Odası : 9 Adet	Tıbbi Müd. Od. : 13 Adet
İnt. Doktor Odası : 4 Adet	Pano ve Mek. Od.: 12 Adet
Hemşire Odası : 11 Adet	Top. Odası : 8 Adet
Laboratuvarlar : 2 Adet	Din ve Tek. Od. : 3 Adet
Özel Oda : 4 Adet	Arşiv : 2 Adet
İzoleli Oda : 4 Adet	Çamaşırhane : 1 Adet
Depo : 15Adet	Mutfak : 9 Adet
İyot Odası : 4 Adet	



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ç.Ü. Bakım İşletme Binası Yapım İşi
Proje No	1998H030440
Sektörü ve Altsektörü	EĞİTİM
Karakteristiği	
Proje Yeri(İlçe)	Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	13.01.2017-01.08.2017
Proje Bedeli(TL)	2.456.542,96
İhale Bedeli(TL)	1.650.000,00 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	
2017 Yılı Gönderilen Ödenek(TL)	
Toplam Harcama	937.695,54 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	56,80
Fiziki Gerçekleşme (%)	58
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Ç.Ü. Bakım işletme binası 13.01.2017 tarihinde sözleşmesi yapılmış olup 19.01.2017 tarihinde işe başlanmıştır. Toplam alanı 822 m2 olup 3 kattan oluşan betonarme karkas yapıdır. Yapım işi yıl içerisinde tamamlanacaktır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Binası Yapım İşi
Proje No	1998H030440
Sektörü ve Altsektörü	EĞİTİM
Karakteristiği	
Proje Yeri(İlçe)	Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	07.04.2017-30.09.2018
Proje Bedeli(TL)	11.451.946.91 TL
İhale Bedeli(TL)	8.387.000,00 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	
2017 Yılı Gönderilen Ödenek(TL)	
Toplam Harcama	605.992,04 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	7
Fiziki Gerçekleşme (%)	9
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Ç.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapım İşi dir. 29.03.2017 Tarihinde sözleşmesi yapılmış olup 07.04.2017 tarihinde işe başlanmıştır. işin süresi 540 gündür. 30.09.2018 tarihinde yapımı tamamlanacaktır.

Toplam kapalı Alan : 6000 m2
Derslik amfi : 15 Adet
Toplantı seminer odası : 8 adet
Oda depo vs : 10 adet.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ç.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yapım İşİ
Proje No	1998H030440
Sektörü ve Altsektörü	EĞİTİM
Karakteristiği	
Proje Yeri(İlçe)	Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	
2017 Yılı Gönderilen Ödenek(TL)	
Toplam Harcama	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	İhalesi 08.06.2017 tarihinde yapılmış olup, ihale komisyon değerlendirmesi devam etmektedir.
Proje Özet Bilgisi	
17.000 m2 toplam kapalı alana sahip betonarme yeni binadır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 870 takvim günüdür. ödenek durumu : 2017 % 25 2018 % 35 2019 % 40	



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Yapım İşi
Proje No	1998H030440
Sektörü ve Altsektörü	EĞİTİM
Karakteristiği	
Proje Yeri(İlçe)	Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	
2017 Yılı Gönderilen Ödenek(TL)	
Toplam Harcama	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	İhalesi ilanda olup, 20.07.2017 tarihinde yapılacaktır.
Proje Özet Bilgisi	
<p>İşin ihalesi 20.07.2017 tarihinde yapılacaktır.16.000 m2 kapalı inşaat alanına sahip betonarme yeni bina yapılacaktır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 720 takvim günüdür.</p> <p>ödenek durumu:</p> <ul style="list-style-type: none">2017 % 102018 % 502019 % 40	





T.C.
ADANA VALİLİĞİ



ADANA
BTÜ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Proje No	2013H050090
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim/Yüksek Öğretim
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2018
Proje Bedeli(TL)	15.500.000
İhale Bedeli(TL)	-
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yılı İçi Harcama	-
2017 Yılı Ödeneği(TL)	3.500.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	-
Fiziki Gerçekleşme (%)	-
Projenin Bugünkü Durumu	Hiç Başlamadı

Proje Özet Bilgisi

Üniversitemiz için, Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 10 parselde 1.431.712 m² lik arazinin kampüs alanı olarak; 40.000 m² lik arazinin ise yurt alanı olarak ayrılmak üzere tahsisi gerçekleşmiştir.

Proje çalışmaları tamamlanmış olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (7.437 m²) projesi için ihale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiştir. 2017 yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine, 2017 yılı Yatırım Programı kapsamında 3.500.000 TL tahsis edilmiştir. 2015-2016 Yılında kullanılmayan 4.500.000 TL ödenek, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi'ne aktarılmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (7.437 m²) inşaatının ihale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiştir. 2017 yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Proje No	2013H031960
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim/Yüksek Öğretim
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2018
Proje Bedeli(TL)	40.000.000
İhale Bedeli(TL)	73.370.000 TL + KDV Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile birlikte ihale edilmiştir.
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	23.326.156
2017 Yıl İçi Harcama	3.348.354
2017 Yılı Ödeneği(TL)	7.300.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	% 45,87 (2017 yılı ödeneğine göre)
Fiziki Gerçekleşme (%)	-
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Üniversitemiz için, Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 10 parselde 1.431.712 m² lik arazinin kampüs alanı olarak; 40.000 m² lik arazinin ise yurt alanı olarak ayrılmak üzere tahsisi gerçekleştirilmiştir.

Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi birlikte ihaleye çıkmış ve yüklenici ile 24 Nisan 2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 27 Nisan 2015 tarihinde yer teslimi yapılmış , çalışmalara başlanmıştır.

Kampüs Altyapısı Projesine, 2017 yılı itibariyle 7.300.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında başlayan inşaat süreciyle, bugüne kadar toplam 26.674.510 TL harcama yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile Kampüs Altyapısı İnşaatı birlikte ihale edilmiş olup, inşaatın başlamasıyla birlikte altyapı harcamalarının fazla olması sonucu 2015 ve 2016 yılında mevcut ödenekten fazla harcama yapılmıştır. Yerleşke arazisinin doğusunda EnerjiSA'nın trafo merkezi yapması için ayrılan alanın bedelsiz irtifak hakkı kurulmuştur. Söz konusu trafo merkezi ENERJİSA tarafından ilgili yere konulmuştur. ENERJİSA'ya iç trafo kontrol başvurusu yapılmıştır. Temmuz ayı içerisinde ENERJİSA'nın iç trafolarımızın kontrolünü gerçekleştirmesine müteakip enerji bağlantısı yapılacaktır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Proje No	2013H031970
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim/Yüksek Öğretim
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2018
Proje Bedeli(TL)	82.333.000
İhale Bedeli(TL)	73.370.000 TL + KDV Kampüs Altyapısı Projesi ile birlikte ihale edilmiştir.
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	46.066.680
2017 Yıl İçi Harcama	15.564.728
2017 Yılı Ödeneği(TL)	19.000.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	4.500.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	% 66,23 (2017 yılı ödeneğine göre)
Fiziki Gerçekleşme (%)	-
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Üniversitemiz için, Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 10 parselde 1.431.712 m² lik arazinin kampüs alanı olarak; 40.000 m² lik arazinin ise yurt alanı olarak ayrılmak üzere tahsisi gerçekleşmiştir.

Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi birlikte ihaleye çıkmış ve yüklenici ile 24 Nisan 2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 27 Nisan 2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Proje; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Rektörlük Binası ve Merkezi Kafeterya Binası olmak üzere toplamda 51.426 m² bina yapımını kapsamaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2017 yılı başlangıç ödeneği 19.000.000 TL olup, ; Projeye, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi'nin 2015-2016 Yılı kullanılmayan ödeneğinden, 4.500.000 TL ödenek aktarılarak toplam ödenek 19.000.000 TL'den 23.500.000 TL'ye ulaşmıştır. 2015 yılında inşaat sürecinin başlamasıyla bugüne kadar 61.631.408 TL harcama yapılmıştır.



Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları



Rektörlük Binası



Merkezi Kafeterya

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje No	2017H032060
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim/Yüksek Öğretim
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli(TL)	500.000
İhale Bedeli(TL)	-
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yılı İçi Harcama	-
2017 Yılı Ödeneği(TL)	500.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	-
Fiziki Gerçekleşme (%)	-
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine, 2017 yılı Yatırım Programı kapsamında 500.000 TL tahsis edilmiştir.

Projede “Adana Btu Yabancı Diller Yüksekokulu (Yadyo) Statik, Betonarme, Mekanik ve Elektrik Tesisatları İle Yerleşke Alanı Yangın Suyu Altyapısı Projelerinin Hazırlanması İşi” tamamlanmış olup; 55.000 TL+KDV ödeme yapılacaktır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Muhtelif İşler
Proje No	2017H032070
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim/Yüksek Öğretim
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli(TL)	4.500.000
İhale Bedeli(TL)	-
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama	195.050
2017 Yılı Ödeneği(TL)	4.500.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	%4,33
Fiziki Gerçekleşme (%)	-
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Geleceğe yönelik yapılaşma sürecinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik Eğitim ve Öğretimin kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak üzere İdari ve Akademik birimlerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak için, her türlü bakım onarım ve tadilat, makine teçhizat alımı, yazılım, bilgisayar donanım, taşıt alımlarını hedeflenen Muhtelif İşler Projesinde, 2017 yılı Yatırım Programı kapsamında toplam 4.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda 195.050 TL harcama yapılmıştır.



Yeşiloba Yerleşkesi



Ziyapaşa Yerleşkesi



Kurttepe Yerleşkesi

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Yayın Alımı
Proje No	2017H032080
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim/Yüksek Öğretim
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli(TL)	900.000
İhale Bedeli(TL)	-
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yılı İçi Harcama (TL)	314.037
2017 Yılı Ödeneği(TL)	900.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	%34,89
Fiziki Gerçekleşme (%)	-
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Eğitim-Öğretim Araştırma ve Yönetim Hizmetlerinin sürdürülebilmesi için Basılı Ortamda ve Elektronik ortamda Kitap, Dergi, Gazete ve Diğer Materyallerin Alımı ve Abone olunmasını hedef alan projede, 2017 yılı Yatırım Programı kapsamında 900.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 314.037 TL harcama yapılmıştır.



Yeşiloba Yerleşkesi Kütüphanesi



Ziyapaşa Yerleşkesi Kütüphanesi



Kurttepe Yerleşkesi Kütüphanesi

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Proje No	2014K120120
Sektörü ve Altsektörü	DKH-Sosyal/Merkezi Araştırma
Proje Yeri(İlçe)	Adana
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2017
Proje Bedeli(TL)	14.535.000
İhale Bedeli(TL)	-
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	2.419.100
2017 Yıl İçi Harcama	-
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.600.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	-
Fiziki Gerçekleşme (%)	-
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim kalitesini arttırmaya yönelik İleri Teknolojiler Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları ile temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği büyük ölçekli bir araştırma altyapısı tesisi yapısının oluşturulması hedeflenen projede, 2017 yılı Yatırım Programı kapsamında 2.600.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Proje; 2.827 m² bina İnşaatı ve laboratuvarlar için Makine-Teçhizat Alımı olmak üzere iki alt kalemden oluşmaktadır.

Mimari, statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri tamamlanmış olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası için ihale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, 2017 yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır.

2015 yılında Laboratuvarlar için malzeme alımı gerçekleştirilerek 2.419.100 TL harcanmış, 2017 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.



T.C.
ADANA VALİLİĞİ



ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Adana İl Emn. Müd. Hizmet Binası İnşaati
Proje No	1987K020510/2009
Sektörü ve Altsektörü	Güvenlik (İnşaat-Yatırım)
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan/ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	11.01.2010 – 19.01.2016 (Süre Uzatımı Verildi ve 25.05.2019 Bitiş Tarihi)
Proje Bedeli(TL)	42.016.210,00
İhale Bedeli(TL)	25.347.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	34.789.027,73
2017 Yıl İçi Harcama	3.157.321,10
2017Yılı Ödeneği(TL)	8.262.825,71
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	90
Fiziki Gerçekleşme (%)	94
Projenin Bugünkü Durumu	Adana İl Emn. Müd. Hizmet Binası İnşaati

Proje Özet Bilgisi

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Adana İli Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 5520 Ada, 7 Parsel no'lu taşınmaz üzerinde, 08.09.2009 tarihinde ihalesi Adana İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve yapı denetim hizmetleri Adana İl Özel İdaresi tarafından yürütülmekte iken, fiziki seviyesi %56 seviyesinde 14.kata (son kat) ulaşmış Adana İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaati, Seyhan Belediye Başkanlığınca 16.06.2011 tarihinde Havalimanı pist merkezli 6 km yarıçap alan içerisinde mania planına (Uçuş seyrinin güvenliği ile ilgili şerit, saha, geçiş yüzeyi, iç yatay düzlem, konik yüzey ve yaklaşma turmanma şeridinden oluşan alan içerisinde uçağın seyrine ve manevralarına tehlike oluşturacak doğal, yapay yapılar) aykırılığından dolayı mühürlenmiştir. İnşaatin durdurulması ve mühürlenmesiyle ilgili açılan davalar tamamlanmış ve mahkeme kararına istinaden hizmet binasının son 6 katının yıkılması ile ilgili 01.07.2015 tarihinde ihalesi yapılmış ve son 6 katın yıkım işlemi tamamlanmıştır.

Binanın yeniden inşaatına devam edilmesi için İlimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından maliyet çalışmalarına başlanılmış olup, maliyet çalışması tamamlanarak ödenek talebinde bulunulmuştur. 28.06.2016 tarihi itibariyle fiili olarak yeniden işe başlanılmıştır. Binanın iç ve dış imalatlarının % 94' ü tamamlanmış olup, binanın B-D-E-G-J-K ve H Blok B-1, B-2, nizamiye, mescit, kantin, depo vb. bölümlerin kısmi kabulü yapılmıştır. Ayrıca, çevre düzeni çalışmaları da devam etmektedir..



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı
Proje No	1987K020510/2015
Sektörü ve Altsektörü	Güvenlik (İnşaat-Yatırım)
Proje Yeri(İlçe)	Ceyhan/ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	20.11.2015-30.12.2017
Proje Bedeli(TL)	13.136.871,51
İhale Bedeli(TL)	7.666.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	3.000.650,97 TL
2017Yılı İçi Harcama	3.852.756,40
2017Yılı Ödeneği(TL)	6.500.000,00 TL
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	%52
Fiziki Gerçekleşme (%)	%70
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaat aşamasında
Proje Özet Bilgisi	

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatının kaba çalışmaları tamamlanmış ve Binanın döşeme yapımı %90 tamamlanmıştır. Binanın dış cephe kaplamaları tamamlanmış ve bina iç imalatları % 70 seviyelerindedir. Çevre düzeni için dış sahada ki yağmur suyu ve pis su rögarları ile bağlantıları tamamlanmıştır. Elektrik tesisat imalatları ve sıhhi tesisat imalatları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı
Proje No	1987K020510/2015
Sektörü ve Altsektörü	Güvenlik (İnşaat-Yatırım)
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam/ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	15.02.2016-31.12.2017
Proje Bedeli(TL)	7.299.151,87 TL
İhale Bedeli(TL)	4.184.000,00 TL
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	2.144.567,28 TL
2017Yıl İçi Harcama	1.570.666,65 TL
2017Yılı Ödeneği(TL)	3.062.705,85 TL
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	%50
Fiziki Gerçekleşme (%)	%87
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaat aşamasında

Proje Özet Bilgisi

Yapımı devam eden Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının kaba inşaatı tamamlanmış olup, elektrik ve sıhhi tesisat imalatları %90 oranında tamamlanmış ve çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir.





T.C.
ADANA VALİLİĞİ



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Adı	ADANA İLİ YUMURTALIK İLÇESİ AÇB BORU DEĞİŞİM İÇMEUYU PROJE YAPIM İŞİ (JİCA KREDİSİ)
Proje No	000000.
Sektörü ve Altsektörü	DKH-Sosyal
Proje Yeri(İlçe)	Yumurtalık-Ceyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2017
Proje Bedeli (TL)	13.490.971
İhale Bedeli(TL)	11.197.020
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	11.197.020
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	7
Projenin Bugünkü Durumu	PROJE KAPSAMINDA YUMURTALIK İLÇESİNE AÇB BORU DEĞİŞİM PROJESİ KAPSAMINDA <u>TOPLAM 28 KM</u> İÇMESUHATTI YAPILACAK OLUP <u>TOPLAM 2 KM</u> İÇ SU HATTI YAPILMIŞTIR. PROJE DEVAM ETMEKTEDİR.

Proje Özet Bilgisi

YUMURTALIK İLE CEYHAN BÖLGESİNİ KAPSAYAN 28 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLAN HAT, BÖLGE HALKININ TEMİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYUNA KAVUŞMASINA OLANAK SAĞLAYACAKTIR. PROJE KAPSAMINDA 350 MM'LİK DUKTİL BORU DÖŞEMESİ YAPILACAKTIR. YENİ HAT TAMAMLANDIKTAN SONRA **KURTPINARI, KARATEPE, İNCİRLİ, KURTKULAĞI, NARLIK, ÇEVRETEPE, KÖRKUYU, GÖLOVASI, HAMZALI, NARLIÖREN, DEMİRTAŞ VE SUGÖZÜ** BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA MAHALLE VE KÖYÜN SAĞLIKLI İÇME SUYU SORUNU TAMAMEN ÇÖZÜLMÜŞ OLACAKTIR. PROJE DEVAM ETMEKTEDİR.



PROJE KAPSAMINDA TOPLAM METRAJ = 28 KM
SÖZLEŞME BEDELİ:11.197.020 TL



Proje Adı	SEYHAN İLÇESİ MUSTAFA KEMALPAŞA BULVARI BORU YENİLEME PROJESİ İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ
Proje No	000000.
Sektörü ve Altsektörü	DKH-Sosyal
Proje Yeri (İlçe)	Seyhan-Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2017
Proje Bedeli (TL)	5.870.467
İhale Bedeli(TL)	5.676.980
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yılı İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	5.676.980
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	16
Projenin Bugünkü Durumu	PROJE KAPSAMINDA SEYHAN-YÜREĞİR İLÇESİ MUSTAFA KEMALPAŞA BULVARINA 3 KM Q1000 MM DUKTİL İÇMESU HATTI YAPILACAKTIR. 500 METRE İÇMESU HATTI YAPIMI TAMAMLANMIŞ OLUP; PROJE DEVAM ETMEKTEDİR.
Proje Özet Bilgisi	
<p>PROJENİN UYGULANMASIYLA BİRLİKTE SEYHAN VE YÜREĞİR İLÇESİ'NE BAĞLI MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI ÜZERİNDE YER ALAN İÇME SUYU ANA HATTINDA ,MEVCUT HATTIN ESKİ OLMASINDAN KAYNAKLANAN ARIZALAR NEDENİYLE, SIK SIK SU KESİNTİLERİNE MARUZ KALAN BÖLGE HALKININ BU SORUNU TAMAMEN ORTADAN KALDIRILACAKTIR. BİRÇOK MAHALLEYE SU ULAŞMASINI SAĞLAYAN HAT YENİLENECEKTİR. ANA ŞEBEKE HATTINDA DEFORME OLAN ESKİ BORULARIN YERİNE 3 KM 1000 MM ÇAPINDA YENİ NESİL DUKTİL BORULARIN DÖŞEMESİ YAPILACAKTIR. PROJE DEVAM ETMEKTEDİR.</p>	



PROJE KAPSAMINDA TOPLAM METRAJ = 3 KM
SÖZLEŞME BEDELİ:5.676.980 TL

Proje Adı	KOZAN İLÇESİ GÖLLER YAYLASI İÇ.SU. PROJ. İLE SAİMBEYLİ İLÇESİ MUH. MAH. İSALE -TERFİ VE İÇ. SU. DAĞ. ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ.
Proje No	000000.
Sektörü ve Altsektörü	DKH-Sosyal
Proje Yeri(İlçe)	Kozan-Saimbeyli
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2017
Proje Bedeli (TL)	9.795.969
İhale Bedeli(TL)	7.634.600
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	5.692.230
2017 Yıl İçi Harcama	1.369.903
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.942.370
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	92,5
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Projenin Bugünkü Durumu	PROJE KAPSAMINDA KOZAN İLÇESİ GÖLLER YAYLASI SAİMBEYLİ İLÇESİ VE CİVARINA TOPLAM 143 KM İÇMESUHATTI YAPILACAKTIR. PROJE KAPSAMINDA TOPLAM 95 KM İÇ SU HATTI YAPILMIŞ OLUP BÖLGEYE İÇME SUYU TEMİNİ SAĞLANMIŞTIR.PROJE DEVAM ETMEKTEDİR.



PROJE KAPSAMINDA TOPLAM METRAJ = 143 KM
SÖZLEŞME BEDELİ:7.634.600 TL

Proje Özet Bilgisi

PROJE KAPSAMINDA DAHA ÖNCE İSALE HATTI YAPIM ÇALIŞMALARINI TAMAMLANAN GÖLLER YAYLASI ,SAİMBEYLİ İLÇESİ VE CİVARINA **TOPLAM 143 KM İÇ.SU ŞEBEKESİ İLE 1 ADET 200 m³, 1ADET 100 m³ İÇ.SU DEPOSU OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ SANAT YAPILARI YAPILACAK OLUP;**PROJE KAPSAMINDA TOPLAM 95 KM İÇMESU HATTI YAPIMI VE TOPLAM 300 m³ İÇMESU DEPOSU YAPIMI TAMAMLANMIŞTIR. PROJE DEVAM ETMEKTEDİR.****



Proje Adı

**ADANA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ İLÇELERİ
MUHTELİF MAHALLELER
(2016-2 NOLU) İÇMESUYU
İNŞAATI YAPIM İŞİ**

Proje No	000000.
Sektörü ve Altsektörü	DKH-Sosyal
Proje Yeri(İlçe)	TÜM İLÇELER
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2017
Proje Bedeli (TL)	13.977.311
İhale Bedeli(TL)	11.793.478
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	1.392.106
2017 Yıl İçi Harcama	1.318.262
2017 Yılı Ödeneği(TL)	10.401.372
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	23
Fiziki Gerçekleşme (%)	60

PROJE KAPSAMINDA 6360 SAYILI YASA İLE HİZMET ALANIMIZA GİREN TÜM İLÇELERİMİZE VE MERKEZ İLÇELERİMİZE **TOPLAM 223 KM İÇMESUYU ŞEBEKESİ** YAPILACAKTIR.

Projenin Bugünkü Durumu

Proje Özet Bilgisi

PROJE KAPSAMINDA 6360 SAYILI YASA İLE HİZMET ALANIMIZA GİREN TÜM İLÇELERİMİZE VE MERKEZ İLÇELERİMİZE **TOPLAM 223 KM İÇMESUYU ŞEBEKESİ** VE BUNUNLA BAĞLANTILI SANAT YAPILARI YAPILACAK OLUP PROJE KAPSAMINDA **140 KM İÇMESU HATTI YAPIMI** TAMAMLANMIŞTIR.



SARIÇAM İLÇESİ İNCİRLİK MAHALLESİ



ÇUKUROVA İLÇESİ SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ



PROJE KAPSAMINDA TOPLAM METRAJ = 223 KM
SÖZLEŞME BEDELİ:11.793.478 TL

SAİMBEYLİ İLÇESİ HİMMETLİ MAHALLESİ



SEYHAN İLÇESİ AYDINLAR MAHALLESİ

Proje Adı	ÇUKUROVA İLÇESİ ASKİ SPOR SALONU-SOSYAL TESİS YAPIM İŞİ.
Proje No	000000.
Sektörü ve Altsektörü	DKH-Sosyal
Proje Yeri(İlçe)	ÇUKUROVA
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2017
Proje Bedeli (TL)	22.258.665
İhale Bedeli(TL)	21.830.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	11.754.582
2017 Yıl İçi Harcama	6.096.995
2017 Yılı Ödeneği(TL)	10.075.418
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	82
Fiziki Gerçekleşme (%)	98
Projenin Bugünkü Durumu	PROJE KAPSAMINDA BETONARME İNŞAATI,DIŞ CEPHE ÇATI KAPLAMASI ,SERAMİK DÖŞEME YAPIM ÇALIŞMALARI,KOLTUK MONTAJI TAMAMLANMIŞ OLUP, FİBA ONAYLI SAHA ZEMİN DÖŞEMESİ,PEYZAJ ÇALIŞMALARI YAPILMIŞTIR; PROJE TAMAMLANMAK ÜZEREDİR.
Proje Özet Bilgisi	
	PROJE KAPSAMINDA ÇUKUROVA İLÇESİ YURT MAHALLESİ'NDE SPOR PARKI İÇERİSİNDE KENDİ AYDINLATMASINI KENDİSİNİN ÜRETECEĞİ 2.500 SEYİRCİ KAPASİTELİ,GERİ DÖNÜŞÜMLÜ LEED GOLD SERTİFİKALI, YAĞMURSUYUNU KULLANIM SUYUNA DÖNÜŞTÜREN ÖZEL SİSTEMLİ, FİTNESS SALONUNA SAHİP VE ULUSLAR ARASI FİBA ONAYLI TÜRKİYE'NİN İLK YEŞİL OLİMPİK SPOR SALONU YAPILACAKTIR.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller **KANALİZASYON İNŞ.**

Proje Adı	Seyhan İlçesi B-6 Kollektörü Kanalizasyon Terfi Hattı ve Terfi Merkezi İnş. Yapım İşi
Proje No	000000.
Sektörü ve Altsektörü	DKH-Sosyal
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	2017 - DE
Proje Bedeli(TL)	2.334.949
İhale Bedeli(TL)	2.280.870
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	651.880
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.280.870
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	29%
Fiziki Gerçekleşme (%)	40%
Projenin Bugünkü Durumu	PROJE KAPSAMINDA 1 ADET TERFİ MERKEZİ YAPILACAKTIR.
Proje Özet Bilgisi	
B-6 KOLLEKTÖRÜ CAZİBE İLE SEYHAN AAT TESİSİNE DEŞARJ EDİLEMEDİĞİNDEN B-6 KOLLEKTÖRÜ İLE SARIHAMZALI, KÜÇÜKDİKİLİ BÖLGESİ VE ŞAMBAYAT - KARAHAN BÖLGELERİNİN ATIKSULARININ BU TERFİ MERKEZİ İLE SEYHAN AAT DEŞARJI AMAÇLANMIŞTIR.	



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller **KANALİZASYON İNŞ.**

Proje Adı	Seyhan-Çukurova İlçesi B-6 Kolektörü Kanalizasyon İnş. Yapım İşi (JICA Dış Kredi)
Proje No	000000.
Sektörü ve Altsektörü	DKH-Sosyal
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan-Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	2017 - DE
Proje Bedeli(TL)	10.858.480
İhale Bedeli(TL)	7.747.682
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yılı İçi Harcama	1.532.708
2017 Yılı Ödeneği(TL)	7.747.682
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	20%
Fiziki Gerçekleşme (%)	40%
Projenin Bugünkü Durumu	PROJE KAPSAMINDA BUGÜNE KADAR 2500-MT Ø600 VE Ø800 MM ÇAPLI BETONARME BORU İLE KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI YAPILMIŞTIR.
Proje Özet Bilgisi	
B-6 KOLEKTÖRÜ İLE SARIHAMZALI, KÜÇÜKDİKİLİ BÖLGESİ VE ŞAMBAYAT - KARAHAN BÖLGELERİNİN ATIKSULARININ SEYHAN AAT DEŞARJI AMAÇLANMIŞTIR. BU PROJE KAPSAMINDA 11.692-MT Ø400-Ø600-Ø800 MM ÇAPLI BETON VE BETONARME BORU İLE KANALİZASYON HATTI YAPILMASI AMAÇLANMIŞTIR.	



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller **KANALİZASYON İNŞ.**

Proje Adı	Adana İli Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi Kanalizasyon Projesi İnş. Yapım İşi (JICA Dış Kredi)
Proje No	000000.
Sektörü ve Altsektörü	DKH-Sosyal
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan-Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	2017 - DE
Proje Bedeli(TL)	18.021.541
İhale Bedeli(TL)	9.357.260
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	9.357.260
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0%
Fiziki Gerçekleşme (%)	20%
Projenin Bugünkü Durumu	PROJE KAPSAMINDA BUGÜNE KADAR 550-MT Ø1600 MM ÇAPLI BETONARME BORU İLE KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILMIŞTIR.
Proje Özet Bilgisi	
BİRİNCİ ETABI TAMAMLANAN TD8 PROJESİNİN KIYIBOYU CADDESİNİN KUZEYİNDEN GEÇEN 3.00*3.00 MT EBATLI BAKSA BAĞLANMIŞ OLAN KANALİZASYON HATLARININ ATIKSULARININ TOPLANARAK BATI ATIKSU ARITMA TESİSİNE DEŞARJI AMAÇLANMIŞTIR.	



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

KANALİZASYON İNŞ.

Proje Adı	Yüreğir İlçesi Yunusoğlu Mahallesi Dere Islahı-Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Proje No	000000.
Sektörü ve Altsektörü	DKH-Sosyal
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	2017 - DE
Proje Bedeli(TL)	7.856.912
İhale Bedeli(TL)	5.466.142
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	2.466.027
2017 Yılı Ödeneği(TL)	5.466.142
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	45%
Fiziki Gerçekleşme (%)	70%
Projenin Bugünkü Durumu	PROJE KAPSAMINDA BUGÜNE KADAR 1.400-MT U-KESİTLİ BETONARME KANAL İLE DERE ISLAHI YAPILMIŞTIR.

Proje Özet Bilgisi

YÜREĞİR İLÇESİ YUNUSOĞLU MAHALLESİNDE YER ALAN DERENİN TERRESUBATININ TEMİZLENMESİ VE DERE ISLAHININ YAPILMASIYLA, YAĞIŞLI MEVSİMLERDE OLUŞABİLECEK TAŞKINLARIN ENGELLENMESİ AMAÇLANMIŞTIR. PROJE KAPSAMINDA TOPLAM 2.181-MT DERE ISLAHI YAPILMASI PLANLANMAKTADIR.



Proje Adı	Seyhan İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon-Yağmursuyu-İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi
Proje No	000000.
Sektörü ve Altsektörü	DKH-Sosyal
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	2016 - DE
Proje Bedeli(TL)	7.165.116
İhale Bedeli(TL)	6.405.650
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	614.429
2017 Yıl İçi Harcama	4.287.807
2017 Yılı Ödeneği(TL)	5.791.221
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	77%
Fiziki Gerçekleşme (%)	90%
Projenin Bugünkü Durumu	PROJE KAPSAMINDA YAKLAŞIK 6.250-MT BETON VE BETONARME VE BAKS DEPLASESİ YAPILMIŞTIR.

Proje Özet Bilgisi

TCDD TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN HIZLI TREN HATTI PROJESİ GÜZERGAHININ İÇERİSİNDE KALAN YAĞMURSUYU-KANALİZASYON VE İÇMESUYU HATLARIMIZIN BU GÜZERGAHLAR DIŞINA ÇIKARILARAK DEPLASE EDİLMESİ AMAÇLANMIŞTIR. AYRICA İHTİYAÇ VE ACİLİYET ARZ EDEN DİĞER YAĞMURSUYU-KANALİZASYON VE İÇMESUYU HATLARININ YAPILMASI PLANLANMAKTADIR.





T.C.
ADANA VALİLİĞİ



KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ




Proje Adı	Ceyhan-Çukurköprü-Kozan Devlet Yolu
Proje No	2013E040720
Sektörü ve Altsektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri(İlçe)	ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2019
Proje Bedeli(TL)	116.400.000
İhale Bedeli(TL)	72.941.351
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	4.090.000
2017Yıl İçi Harcama	-
2017Yılı Ödeneği(TL)	6.425.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	4
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Toplam 72 km uzunluğundaki yolun 56 km' si Adana ili sınırlarındadır. İki projesinde 10 Km BY-62 Km TY iken 06.01.2017 tarihli Ön Değerlendirme Olur'u ile Ceyhan-Çukurköprü arası 36 km 'lik kesimin tamamı BY standardına dönüştürülmüş olup, yolun önceki ihaleler kapsamında 18,8 Km'lik (2,6 BY-16,2 TY) kesimi SK seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Bu ihale bünyesinde, yolun tamamının BSK'lı olarak yapılması ve 4 adet köprü yapılması planlanmaktadır. 14.12.2015 tarihinde çalışmalara başlanmıştır.

2016 yılı sonu itibariyle 1 adet (48 m) çift köprü, 1 adet (42 m) tek köprü yapılmıştır. 2017 yılında 3 km BY-BSK yapılması hedeflenmiştir.

Güzergahta Tedaş, Teiaş, Aski ve Telekom'a ait tesislerin deplase edilmesi gerekmektedir.

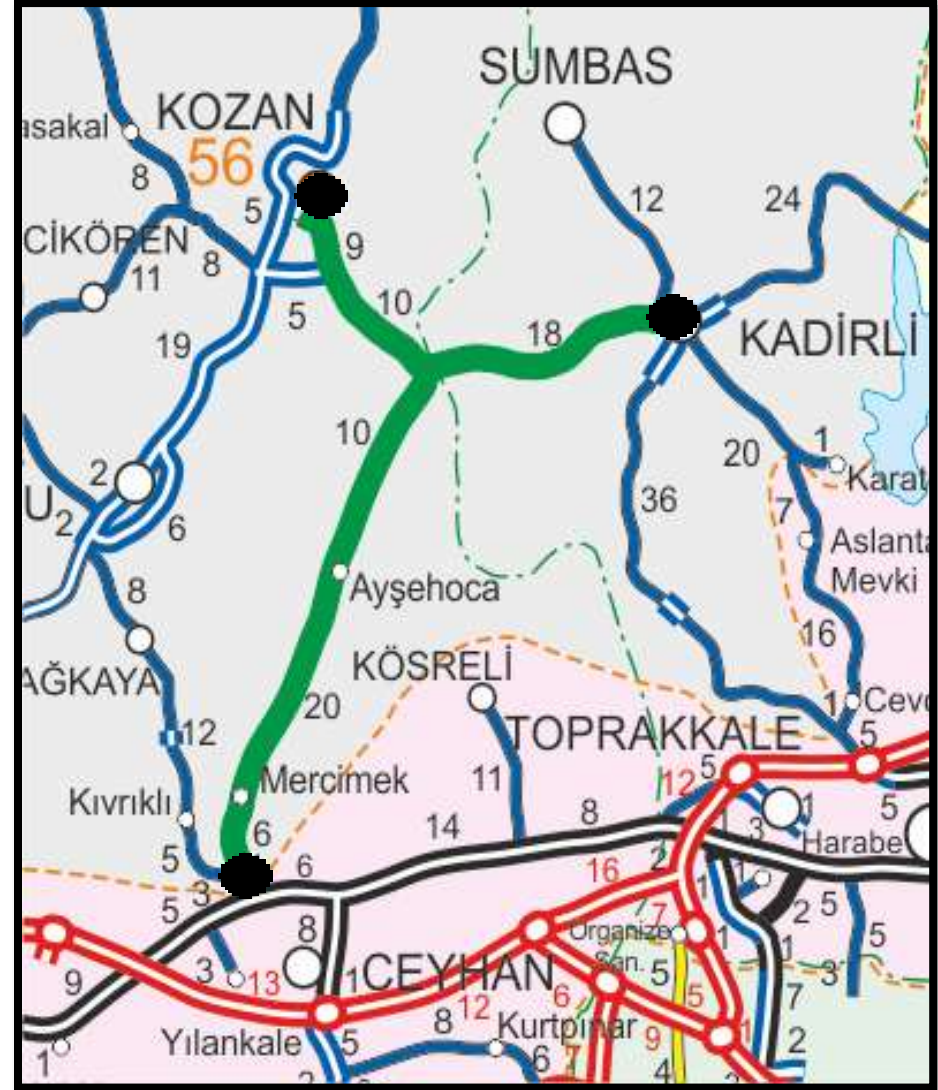

Proje Adı	ADANA-KOZAN (BSK YAPILMASI)
Proje No	2010E040170
Sektörü ve Altsektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri(İlçe)	KOZAN
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2018
Proje Bedeli(TL)	123.280.000
İhale Bedeli(TL)	95.303.871
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	20.823.000
2017Yıl İçi Harcama	25.500.000
2017Yılı Ödeneği(TL)	2.570.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	22.930.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	40
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Toplam **67 km** uzunluğunda (Kozan Çevre Yolu dahil) BY standardındaki yolun tamamı önceki yıllarda SK seviyesinde tamamlanmıştır. Bu ihale bünyesinde SK>BSK yapılacak olup **29.04.2015** tarihinde çalışmalara başlanmıştır.

2016 yılı sonu itibariyle **11,8 km** SK>BSK yapılarak trafiğe açılmış olup **20.823.000 TL** harcama yapılmıştır.

2017 yılında **25.500.000 TL** harcama yapılarak **12,5 km** SK>BSK yapılmıştır.



Proje Adı	Adana Güney Çevre Yolu
Proje No	1986E040360
Sektörü ve Altsektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri (İlçe)	ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2019
Proje Bedeli (TL)	300.000.000
İhale Bedeli (TL)	218.579.953
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	330.000
2017Yılı İçi Harcama	3.437.000
2017Yılı Ödeneği (TL)	20.000.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek (TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	7
Fiziki Gerçekleşme (%)	1
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor
Proje Özet Bilgisi	
<p>Toplam 29 km uzunluğundaki yol 2x3 standardındadır. Projede 5 adet köprü (446 m) ve 8 adet (11.051 m) farklı seviyeli kavşak tasarlanmıştır. Bölünmüş yola göre (2x3) uygulama projesi Genel Müdürlüğümüz tarafından 16.12.2015 tarihinde onaylanmış olup 11.08.2016 tarihinde yapım çalışmalarına başlanmıştır.</p> <p>2016 sonu itibariyle toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılarak 330.000 TL harcama yapılmıştır. 2017 yılında 3.437.460 TL harcama yapılmıştır.</p> <p>Kamulaştırma planı hazırlanmış ve Kamu Yararı Kararı alınmıştır. İmarsız kesimlerde pazarlık görüşmeleri yapılmış, anlaşma sağlanan maliklere ödemeleri yapılmakta olup anlaşma sağlanamayan malikler için hukuki süreç başlatılmıştır. İmarlı kesimler için ilgili ilçe ve Büyükşehir Belediyesinden imar tadilatları beklenmektedir.</p> <p>TEDAŞ, TEİAŞ, ASKİ, BOTAŞ, AKSAGAZ, NATO, TELEKOM ve SUPERONLINE'a ait hatların deplase süreci devam etmektedir.</p>	



Proje Adı	(Adana-Kozan) Ayr. Mansurlu-6.Böl.Hud. Km: 44+052-104+152 Arası
Proje No	1964E042100
Sektörü ve Altsektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri(İlçe)	KOZAN MANSURLU
Başlama - Bitiş Tarihi	2011-2017
Proje Bedeli(TL)	56.700.000
İhale Bedeli(TL)	40.865.400
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	54.930.000
2017Yıl İçi Harcama	100.000
2017Yılı Ödeneği(TL)	1.300.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	8
Fiziki Gerçekleşme (%)	98
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Toplam **60,1 km** uzunluğunda 2A standardındaki yolun yapım çalışmaları **11.11.2011** tarihinde başlatılmıştır. 2016 yılı sonu itibariyle muhtelif kesimlerdeki toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmıştır..

Projede Km:44+052-51+000 arasında 08.11.2013 tarihinde yapılan değişiklikle yatay düşey standartlar değişmiştir. Buna bağlı olarak geoteknik raporlar doğrultusunda şev desteklemeler ve toprakarme imalatların yapılması zorunluğu doğmuştur. Km:52+000-86+000 arasına ait yatay-düşey hat Genel Müdürlüğümüz onayına sunulmuştur. Km:86+000-100+000 arasına ait maden sahalarından ötürü revize kılavuz plan hazırlanarak Genel Müdürlüğümüz tarafından 26.04.2017 tarihinde onaylanmıştır. Güzergahın eksik kalan kesimlerinde Etüt Proje Mühendislik Hizmetlerine yönelik ihale süreci devam etmektedir. Bu kapsamda **8867 m** uzunluğunda **8** adet tünel ve **1400 m** uzunluğunda **6** adet viyadük yapılması planlanmakta olup, tahmini Proje Bedeli 410.000.000 TL'dir. Güzergahın değişik kesimlerinde meydana gelen heyelanlarla ilgili geoteknik çalışmalar devam etmektedir. İşin kalan kesimi için ikmal ihalesi yapılması zorunludur.



Proje Adı	(Adana-Kozan) Ayr. Mansurlu-6.Böl.Hud. Km:37+500 ve Km:39+300 de bulunan Salmanlı Heyelan Islah İşi
Proje No	1964E042100
Sektörü ve Altsektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri(İlçe)	KOZAN MANSURLU
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2017
Proje Bedeli(TL)	88.700.000
İhale Bedeli(TL)	61.649.713
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	38.030.000
2017Yıl İçi Harcama	33.200.000
2017Yılı Ödeneği(TL)	5.380.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	27.820.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	82
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Km:37+500 ve Km:39+350 de bulunan Salmanlı mevkiinde meydana gelen heyelanların ıslahı ve Km:32+150 'de bulunan yarma şevindeki kopmaların iyileştirilmesi için **03.08.2016** tarihinde çalışmalara başlanmıştır.

2016 yılı sonu itibariyle muhtelif kesimlerdeki destekleme imalatlarında çalışılmış olup **38.030.000 TL** harcama yapılmıştır. **2017** yılında şev destekleme imalatlarında çalışılması ve yolun **1,2 Km**'sinin TY-SK seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmekte olup şuana kadar 33.200.000 TL harcanmıştır.

Km:32+150 TEİAŞ'a ait ENH direği bulunmakta olup bu kesimde akma ve kopmalar meydana gelmiştir. Bu akma ve kopmaların ıslah edilebilmesi için söz konusu ENH direğinin deplase edilmesi gerekmektedir.




Proje Adı	Kozan-Feke-Saimbeyli Yolu Km: 82+300-136+000 Arası
Proje No	1986E040380
Sektörü ve Altsektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri(İlçe)	KOZAN FEKE SAİMBEYLİ TUFANBEYLİ
Başlama - Bitiş Tarihi	2011-2018
Proje Bedeli(TL)	33.300.000
İhale Bedeli(TL)	18.888.800
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	8.030.000
2017Yıl İçi Harcama	-
2017Yılı Ödeneği(TL)	250.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	26
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Toplam **53,7 km** uzunluğunda 2A standardındaki yolun yapım çalışmalarına **04.11.2011** tarihinde başlanılmıştır.

2016 yılı sonu itibariyle **11,1 km** SK olarak tamamlanmış olup toplam **8.030.000 TL** harcama yapılmıştır. 2017 yılında **1 km** SK yapılması hedeflenmektedir.

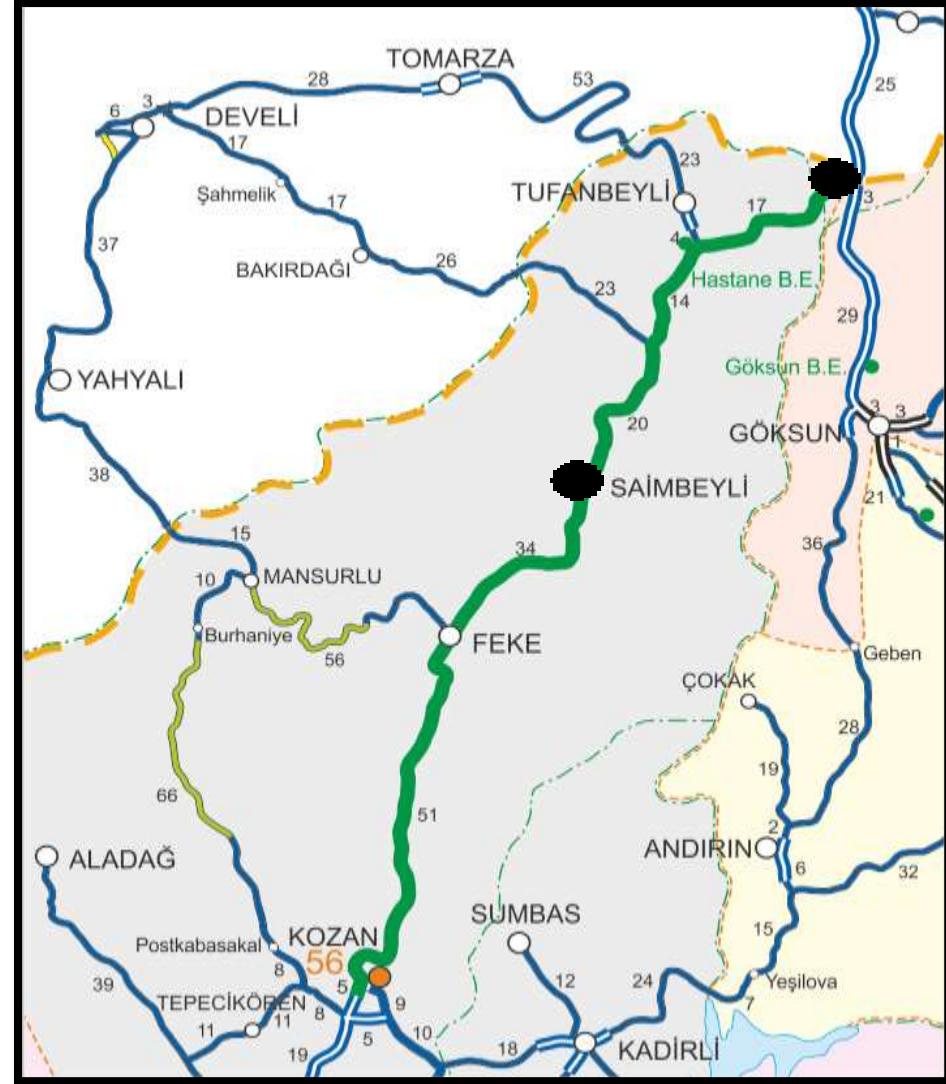

Proje Adı	Kozan-Feke-Saimbeyli Yolu Km: 2+000-82+300 Arası
Proje No	1986E040380
Sektörü ve Altsektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri(İlçe)	KOZAN FEKE SAİMBEYLİ
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2018
Proje Bedeli(TL)	34.300.000
İhale Bedeli(TL)	20.145.814
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	2.250.000
2017Yıl İçi Harcama	1.000.000
2017Yılı Ödeneği(TL)	500.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	200
Fiziki Gerçekleşme (%)	13
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor


Proje Özet Bilgisi

Toplam **83,9 km** uzunluğunda 2A standardındaki yolun yapım çalışmaları **03.09.2015** tarihinde başlamıştır .

2016 yılı sonu itibariyle **59,1 km** (**56,6 km**'si önceki ihaleler kapsamında) SK seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmış olup **2.250.000 TL** harcanmıştır. 2017 yılında **4,5 km** TY-SK tamamlanması hedeflenmektedir. 2017 yılında **1.000.000 TL** harcama yapılmıştır.

Proje bedeli **34.300.000 TL**'dir.

Km:21+700-22+000 arasında heyelan meydana gelmiş olup heyelan projesi hazırlanmaktadır.

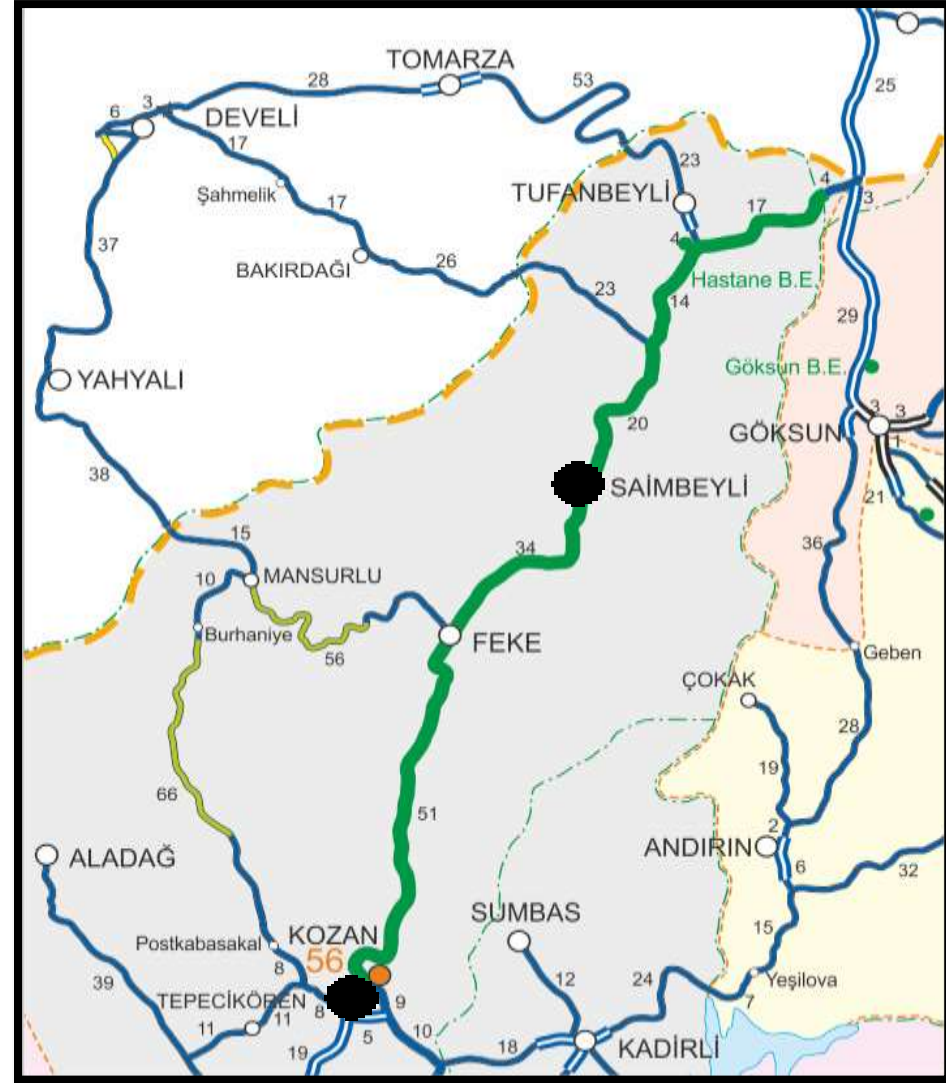

Proje Adı	TAG OTOYOLU ADANA ŞEHİR HASTANESİ KAVŞAĞI
Proje No	2017E040250
Sektörü ve Altsektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri(İlçe)	ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli(TL)	32.200.000
İhale Bedeli(TL)	23.160.235
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017Yıl İçi Harcama	1.000.000
2017Yılı Ödeneği(TL)	18.890.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	3
Fiziki Gerçekleşme (%)	4
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi


TAG Otoyolu Adana Şehir Hastanesi Kavşağı Sağlık Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan çerçeve protokol kapsamında yapımına karar verilmiştir.

Adana 6. Mekanize Komutanlığı sahası için MSB. ile protokol çalışmaları devam etmektedir.

Adana Yüreğir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında gerekli kamulaştırma ve yer tahsis işlemleri başlatılmıştır. Milli Emlak'tan yer tahsis edilmesi işlemleri devam etmektedir.

16.02.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 03.04.2017 tarihinde yapım çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmaların 2017 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Kuzey Doğu kolunda Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'a ait baz istasyonlarının, Kuzey Batı kolunda TEDAŞ ve TEİAŞ'a ait ENH ve EİH'nin deplase edilmesi gerekmektedir.

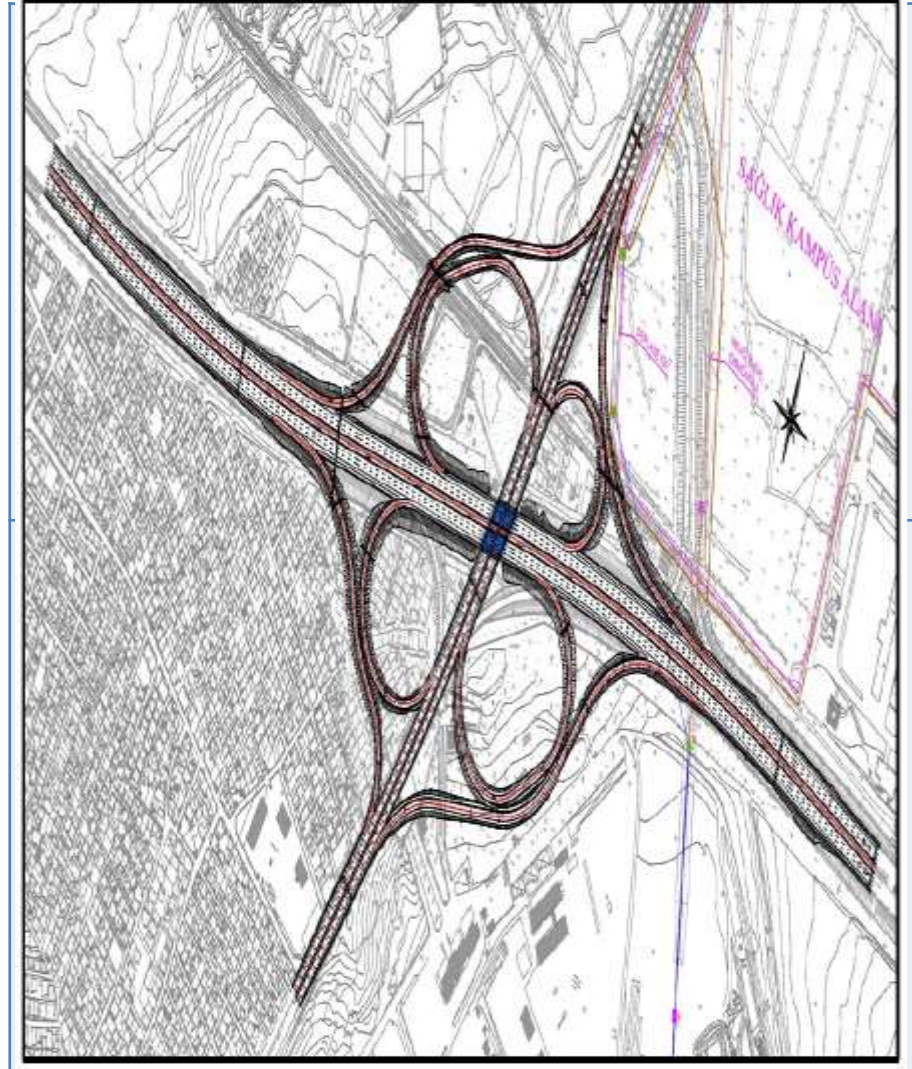

Proje Adı	(Adana-İmamoğlu) Ayr.-Aladağ Yolu Km:0+000-52+500 Arası
Proje No	1964E042100
Sektörü ve Altsektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri(İlçe)	İMAMOĞLU ALADAĞ
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli(TL)	42.000.000
İhale Bedeli(TL)	32.363.988
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017Yıl İçi Harcama	
2017Yılı Ödeneği(TL)	2.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje uzunluğu **52,5 km** olan yol 2A standardındadır.

2016 yılı sonuna kadar yolun **35 km**'lik kesimi sathi kaplama seviyesinde tamamlanıp trafiğe açılmıştır. Km:38+000-52+500 arasına ait revize proje çalışmaları kapsamında yatay-düşey hat Genel Müdürlüğümüz tarafından 11.07.2012 tarihinde onaylanmıştır. Önceki ihalelerde yapımı eksik kalan kesimlerin ve Km:38+000-52+500 arasında bulunan Akören Köyü bağlantısı dahil toplam **24 km**' lik kesimin yapım ihalesi **15.03.2017** tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi imzalanmıştır.

Kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olup anlaşma sağlanan maliklere ödeme yapılmakta, anlaşma sağlanmayan malikler için dava süreçleri devam etmektedir. Proje değişikliği yeni tamamlanan kesimlerde kamulaştırma planı üretimi çalışmalarına başlanılmıştır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller


EK-4

Proje Adı	TARSUS-ADANA-GAZİANTEP VE TOPRAKKALE-İSKENDERUN OTOYOLU
Proje No	2012E040870
Sektörü ve Altsektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri (İlçe)	ADANA -OSMANİYE
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2017
Proje Bedeli(TL)	23.797.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	4.920.644
2017Yıl İçi Harcama	3.533.123
2017Yılı Ödeneği(TL)	3.533.123
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	35
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Toplam 23 km uzunluğunda (8,9 km Adana İlinde) 2X3 standardındaki yolda BSK yenileme çalışmaları yapılacaktır. 2016 yılı sonu itibariyle 8 km' si (4,4 km Adana İlinde, 3,6 km Osmaniye İlinde) tamamlanmış olup 4.920.644 TL harcama yapılmıştır. 2017 yılında 8 km'sinin yapılması (2,5 km Adana İlinde, 5,5 km Osmaniye İlinde) hedeflenmektedir. 2017 yılında 1,335 km'si tamamlanmıştır. İldeki proje bedeli 23.797.000 TL'dir.


Ayrıca Km:59+800 -61+200 arasında Adana gişeleri girişi kontrol cebi-park alanı (20 m *200 m)yapımı ile ilgili olarak yapım çalışmalarına başlanmış olup istinat duvarı ve dolgu yapımı çalışmaları devam etmektedir. Bu kesimde yapım çalışmaları tamamlanmıştır. İşin yapım maliyeti 2.500.000 TL ' dir.

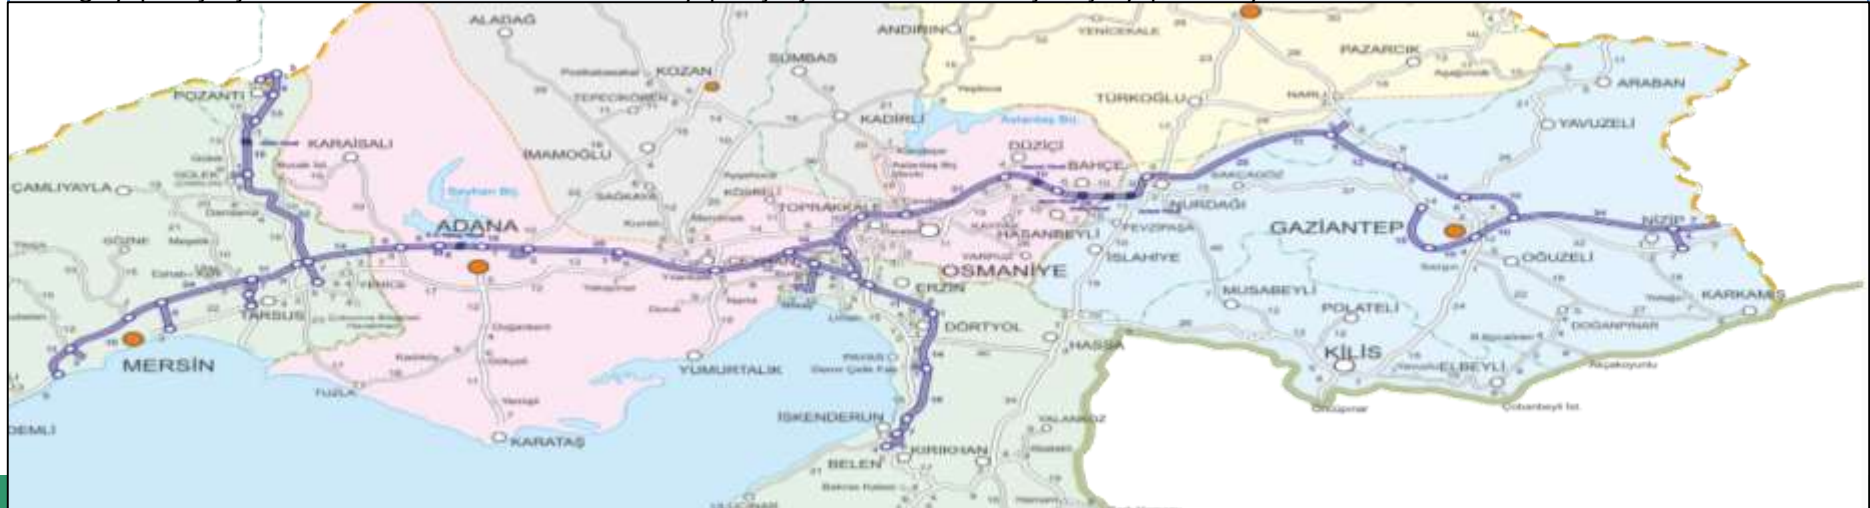

Proje Adı	TARSUS-TUZLA İL YOLU
Proje No	2017E040150
Sektörü ve Altsektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri (İlçe)	TARSUS
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2017
Proje Bedeli (TL)	4.374.732
İhale Bedeli (TL)	3.707.400
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	
2017Yıl İçi Harcama	
2017Yılı Ödeneği (TL)	
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek (TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Toplam 40 km uzunluğunda TY standardındaki yolun 17 Km'si Adana ili sınırları içerisindedir. 2017 yılında 01-50 KK No'lu Tarsus-Tuzla il yolu Km:0+000-8+000 arasında 8 km Fiziki Standartların iyileştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.

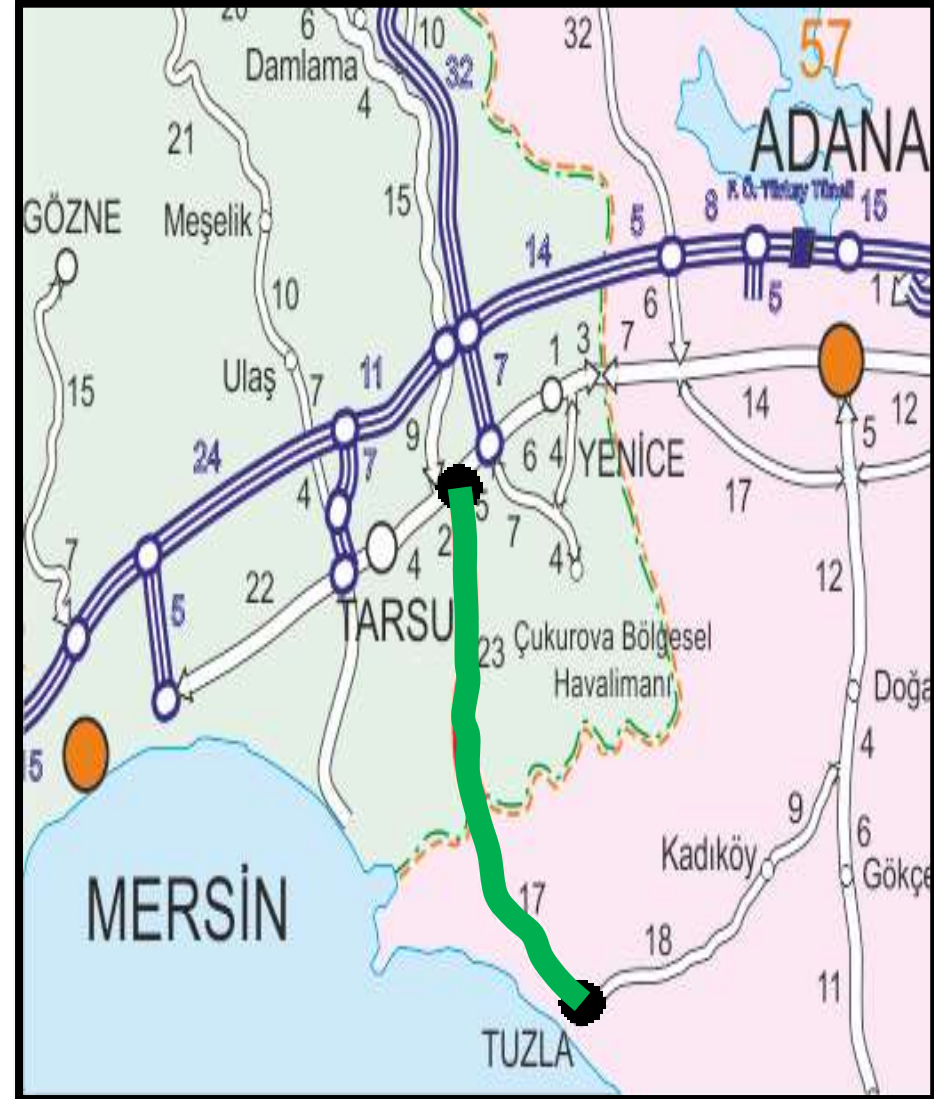

Proje Adı	MANSURLU-FEKE İL YOLU
Proje No	2017E040150
Sektörü ve Altsektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri(İlçe)	MANSURLU-FEKE
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli(TL)	7.025.413
İhale Bedeli(TL)	5.953.740
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017Yıl İçi Harcama	
2017Yılı Ödeneği(TL)	
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

2016 yılında 88+000 - 99+000 arası **11 km'lik** kesim temel seviyesinde tamamlanmış olup 2017 yılında asfalt kaplamasının yapılarak trafiğe açılması hedeflenmektedir. Ayrıca, bu ihale bünyesinde **2017** yılında 99+000 - 103+000 arası **4 km** fiziki ve geometrik standartların iyileştirilmesi çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. Ve 01-21 KK.No'lu Mansurlu - Yahyalı yolunun Km:0+000 - 15+000 arası Toprak İşleri sanat yapıları ve üstyapı yapım onarım işleri yapılarak asfaltlandırılması planlanmaktadır.



Proje Adı	ADANA-KARATAŞ YOLU
Proje No	2005E040290
Sektörü ve Altsektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri(İlçe)	ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2020
Proje Bedeli(TL)	120.000.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017 Yıl İçi Harcama	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.285.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Toplam 45 km uzunluğundaki yolun 42 km'si önceki ihaleler kapsamında Bölünmüş yol (30 km BY-SK,12 km BY-BSK) olarak tamamlanmış olup trafiğe açılmıştır. Eksik kalan 3 km BY (kamulaştırmadan dolayı) ile toplam 33 km'nin kesimin BSK ihalesi 13.04.2017 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi imzalanmıştır. Güzergahın büyük çoğunluğunda kamulaştırma işlemleri bitmiş olup, mahkemesi sonuçlanan parsel maliklerine ödemeleri yapılmaktadır.



Proje Adı	Ceyhan Yumurtalık Yolu
Proje No	1986E040380
Sektörü ve Altsektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri(İlçe)	CEYHAN YUMURTALIK
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli(TL)	58.800.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017Yıl İçi Harcama	
2017Yılı Ödeneği(TL)	1.000.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	İhale Aşamasında

Proje Özet Bilgisi

Toplam **27,4 km** uzunluğundaki yol BY standardında olup önceki yıllarda SK olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Otoyol Bağlantı Yolu ile Devlet Yolu Bağlantısına Farklı Seviyeli Kavşak Yapılması öngörülmektedir.

Bölge Müdürlüğümüzce **11.05.2017** tarihinde BSK ihalesi yapılmış olup ihale süreci devam ediyor.





T.C.
ADANA VALİLİĞİ




DEVLET SU İŞLERİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Adı	ADANA AŞAĞI CEYHAN MİSİS 2.MERHALE PROJESİ
Proje No	2011A010130
Sektörü ve Altsektörü	Tarım Sulama
Proje Yeri(İlçe)	Yumurtalık
Başlama - Bitiş Tarihi	2012-2017
Proje Bedeli(TL)	51.529.950
İhale Bedeli(TL)	37.826.640
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	34.066.139
2017 Yıl İçi Harcama	4.707.514
2017 Yılı Ödeneği(TL)	12.000.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	75
Fiziki Gerçekleşme (%)	70
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

Alt projeler: Adana Misis 2.Merhale Cazibe Sulaması
78 260 da arazinin sulama ve drenaj tesisi yapım işidir. (52 260 da alan sulamaya açılmıştır) (DE)

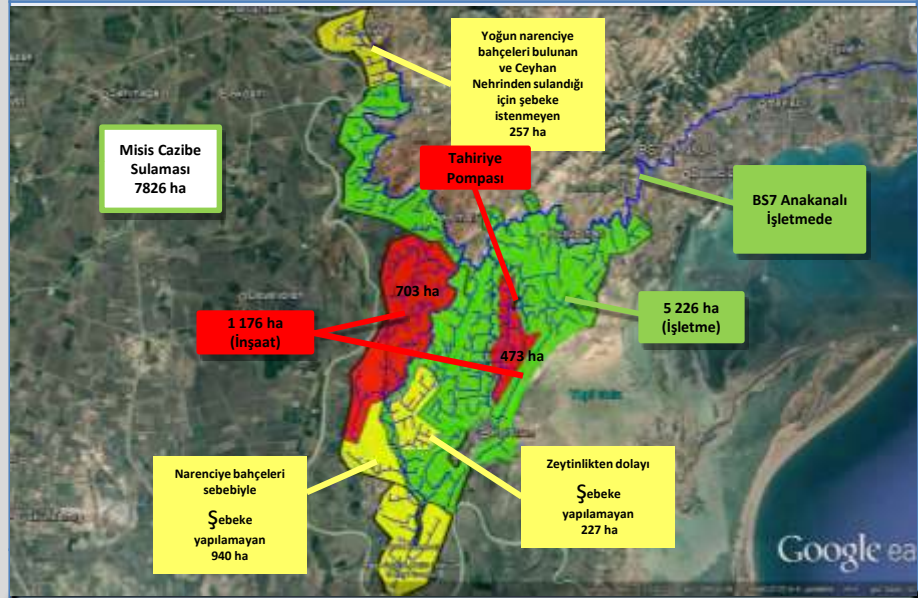


Proje Adı	AŞAĞI SEYHAN YEDİĞÖZE İMAMOĞLU SULAMASI 1.MERHALE PROJESİ
Proje No	2009A010100
Sektörü ve Altsektörü	Tarım Sulama
Proje Yeri(İlçe)	İmamoğlu
Başlama - Bitiş Tarihi	2009-2017
Proje Bedeli(TL)	141.724.961
İhale Bedeli(TL)	50.262.657
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	57.674.963
2017 Yıl İçi Harcama	2.598.119
2017 Yılı Ödenegi(TL)	10.050.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	50.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	86
Fiziki Gerçekleşme (%)	83
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

Alt Projeler:

- 1-İmamoğlu Sulaması İletim Kanalı: 14 610 m (BT)
 - 2- İmamoğlu Sulaması 1. Kısım : 45 520 da (BT)
 - 3- İmamoğlu Sulaması S1 Anakanal ve Şebekesi: 13 470 m, 13 230 da (DE)
 - 4- İmamoğlu Sulaması İletim Kanalı Emniyet Tedbirlerinin Alınması ve Tahliyelerinin İslahı
 - 5- S1 Anakanalı Anaboru Hattı ve Şebekesi İkmali Malzeme Alımı
 - 6- İmamoğlu Sulaması TCK Yol Geçişleri
- Ayrıca 1 087 714 dekar arazinin sulamasını sağlayacak 85 m³/sn kapasiteli iletim kanalının ve şebekesi işidir.

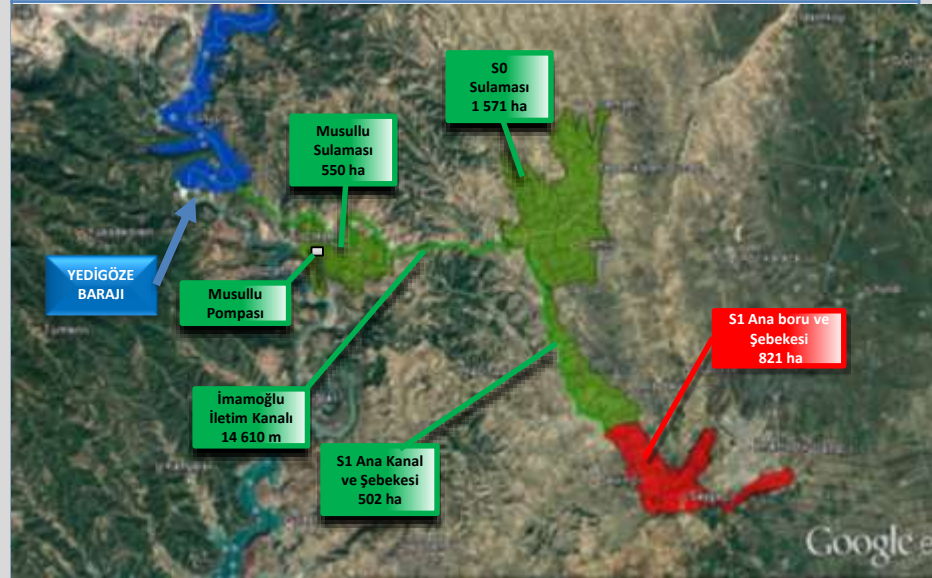


Proje Adı	AŞAĞI SEYHAN YEDİGÖZE İMAMOĞLU SULAMASI 2.MERHALE PROJESİ
Proje No	2009A010100
Sektörü ve Altsektörü	Tarım Sulama
Proje Yeri(İlçe)	İmamoğlu
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2019
Proje Bedeli(TL)	170.709.903
İhale Bedeli(TL)	134.400.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	16.000.000
2017 Yılı İçi Harcama	18.581.542
2017 Yılı Ödeneği(TL)	20.000.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	22
Fiziki Gerçekleşme (%)	20
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

Alt Proje: İmamoğlu Sulaması 2.Kısım (DE)

176 639 da sahanın sulama ve drenaj tesislerinin yapım işidir.

Çalışmalar devam etmektedir.

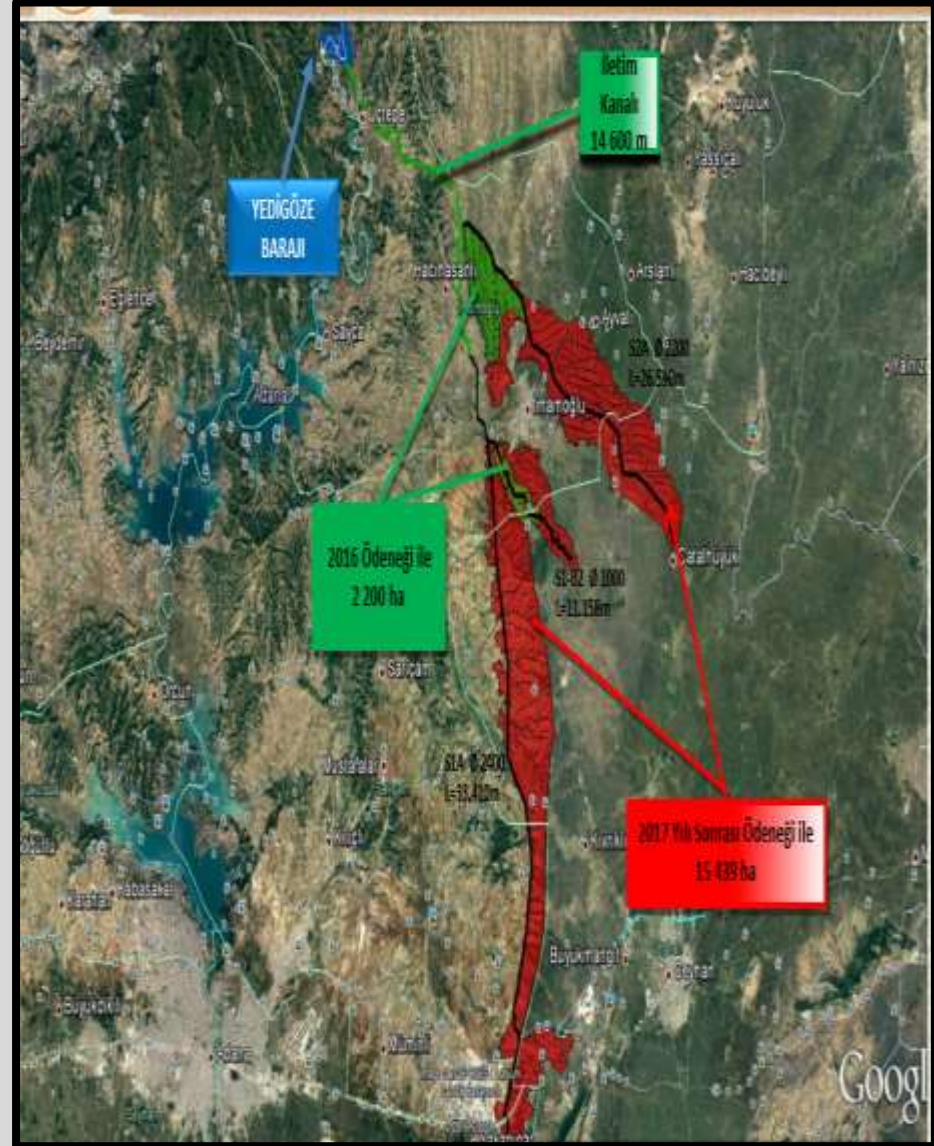

Proje Adı	AŞAĞI SEYHAN YEDİGÖZE İMAMOĞLU SULAMASI 3.MERHALE PROJESİ
Proje No	2016A010050
Sektörü ve Altsektörü	Tarım Sulama
Proje Yeri(İlçe)	İmamoğlu
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2021
Proje Bedeli(TL)	456.789.916
İhale Bedeli(TL)	175.245.691
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama	-
2017 Yılı Ödeneği(TL)	10.000.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	-
Fiziki Gerçekleşme (%)	-
Projenin Bugünkü Durumu	İA-DE

Proje Özet Bilgisi

Alt Proje:

1-İmamoğlu Sulaması 3.Kısım: 218 550 dekar sahanın sulama ve drenaj tesislerinin yapım işidir. (22.02.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.) (DE)

2-İmamoğlu Sulaması 3.Kısım Malzeme Alımı (İA)

3-İmamoğlu Sulaması 4.Kısım: 261 920 dekar sahanın sulama ve drenaj tesislerinin yapım işidir. (İhale işlemleri Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir) (İA)

4-İmamoğlu Sulaması 4.Kısım Malzeme Alımı (08.02.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.) (DE)




Proje Adı	AŞAĞI SEYHAN 4. MERHALE SULAMASI VE DRENAJ PROJESİ
Proje No	1991A010150
Sektörü ve Alt Sektörü	Tarım Sulama
Proje Yeri(İlçe)	Karataş Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	1991-2019
Proje Bedeli(TL)	84.965.473
İhale Bedeli(TL)	63.434.641
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	81.381.111
2017 Yıl İçi Harcama	1.055.721
2017 Yılı Ödeneği (TL)	3.084.862
2017 Yılı Gön. Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	98
Fiziki Gerçekleşme (%)	98
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

Alt Projeler:

- 1- 7 YP 1 Saha Sulama Tesisleri (1. Ünite): 44 300 da (BT)
- 2- 7 YP 1 Saha Sulama Tesisleri (2. Ünite): 69 430 da (DE) (62 610 da saha açıldı)
- 3- 7 YP 2 Saha Sulama Tesisleri (1. Ünite): 22 500 da (BT)
- 4- 7 YP 2 Saha Sulama Tesisleri (2. Ünite): 40 400 da (BT)
- 5- 8 YP 1 Saha Sulama Tesisleri (1. Ünite): 39 150 da (BT)
- 6- 8 YP 1 Saha Sulama Tesisleri (2. Ünite): 64 130 da (BT)
- 7- 8 YP 2 Saha Sulama Tesisleri (1. Ünite): 30 900 da (BT)
- 8- 8 YP 2 Saha Sulama Tesisleri (2. Ünite): 54 340 da (DE) (49 100 da saha açıldı.)
- 9- 6 YP Saha Sulama Tesisleri : 14 500 da (HB)

353 000 da alan tamamlanarak sulamaya açılmış olup, geri kalan 26 600 da alanın inşaatı devam etmektedir.

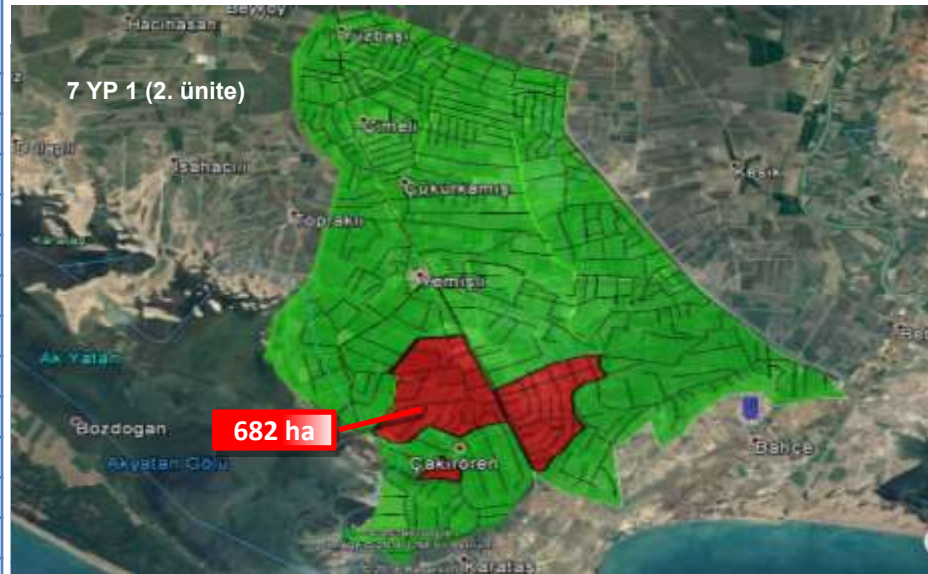



T.C.
ADANA VALİLİĞİ



TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale sinyalizasyon, telekominikasyon tesisi yapımı ve altyapı iyileştirilmesi
Proje No	2005.E010130.02
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma – Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri(İlçe)	Pozantı, K.Bucağı, Seyhan, Ceyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	30.10.2009 – 31.06.2017
Proje Bedeli(TL)	194.008.093
İhale Bedeli(TL)	194.008.093
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	172.216.100
2017 Yıl İçi Harcama	159.439
2017 Yılı Ödeneği(TL)	9.577.302
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	17
Fiziki Gerçekleşme (%)	97
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

- Projenin Boğazköprü-Yenice ve Adana-Toprakkale kesimindeki istasyon ve açık hatlardan oluşan 10 anlaşılan bölgeyi işletmeye alınmış olup, TSİ işletmeciliğe geçilmiştir.
- Adana ve Kayseri CTC merkezleri işletmeye alınmıştır.
- Proje kapsamında 23 adet tren seti ve lokomotif ECES L1 Araç Üstü Sistem kurulumu tamamlanmıştır.ETCSL1 yol boyu sistemlerinin montaj çalışmaları Boğazköprü-Yenice kesiminde tamamlanmak üzeredir.
- 3. ve 4. hat yapım işi dolayısı ile zaruri olarak sinyalizasyon sistemi kurulum çalışmaları askıya alınan Mersin-Adana kesimi hariç proje kapsamındaki tüm bölgelerde sinyalli işletmeciliğe geçilmiştir.
- Yüklenici firmaya 16.08.2017 tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir.




Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale elektrifikasyon tesisleri yapımı
Proje No	2010.E010070.03.01
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma – Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri (İlçe)	Pozantı, K.Bucağı, Seyhan, Ceyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	23.10.2012 – 31.06.2017
Proje Bedeli(TL)	97.642.837
İhale Bedeli(TL)	97.642.837
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	76.299.042
2017 Yıl İçi Harcama	4.210.098
2017 Yılı Ödeneği(TL)	16.435.348
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	26
Fiziki Gerçekleşme (%)	80
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

- Adana-Toprakkale arası devreye alınmıştır.
- Trafo merkezlerinin geçici kabulleri yapıldı.
- Ulukışla-Yenice 2017 yılı ikinci yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.
- Ulukışla-Boğazköprü arası ile Adana-Mersin arasının 2017 yılı ikinci yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.
- Niğde Ulukışla devreye alınıp enerji verildi.

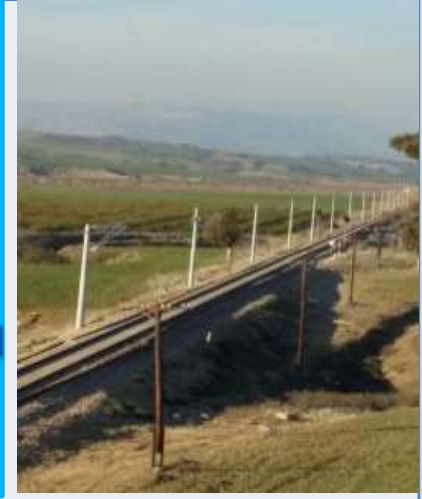

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Adana-Mersin (67*2=134 Km) İstasyonları Arasının 3. ve 4. Hat Yapımı
Proje No	2012.E010060.06.02
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma – Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	27.01.2015 – 04.01.2018
Proje Bedeli(TL)	66.267.334
İhale Bedeli(TL)	66.267.334
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	36.323.991
2017 Yıl İçi Harcama	25.264.118
2017 Yılı Ödeneği(TL)	33.333.334
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	23
Fiziki Gerçekleşme (%)	60
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

Güzergah kazısı, menfez inşaatları ve fore kazık imalatları devam etmektedir. Güzergah kazı ve dolgusu, Köprü ve Üstgeçit imalatları, Dolgu duvar işleri devam etmektedir.

Altyapı aktarmaları ve Alt ve üst geçit yapımları için ilgili kuruluşlar ve Belediyelerle görüşmeler devam ediyor.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ulukışla-Yenice Demiryolu Etüt, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık hizmetleri
Proje No	2012.E010060.08.03
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma – Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri (İlçe)	Pozantı, K.Bucağı
Başlama - Bitiş Tarihi	13.10.2015– 13.04.2017
Proje Bedeli(TL)	3.299.084
İhale Bedeli(TL)	3.299.084
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	1.656.469
2017 Yıl İçi Harcama	29.205
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.663.636
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	2
Fiziki Gerçekleşme (%)	45
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

1/5000 ölçekli plan profil onaylanmıştır. Sondaj çalışmaları tamamlanmıştır. 1/2000 ölçekli çalışmalar devam etmektedir. Sanat yapıları proje çalışmaları devam etmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Bucak-Durak İstasyonları arası muhtelif kilometrelerde altyapı iyileştirme ve yangın önleme amaçlı taş duvar ve balast tutucu duvar yapılması
Proje No	2017.E010010.06.27
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma – Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri(İlçe)	K.Bucağı
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	---
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	3.642.845
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	İA
Proje Özet Bilgisi	
Sözleşme aşamasında.	



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Yenice-Ulukışla arasına MOBESE Sistemi Kurulması İşi
Proje No	2017.E010040.03.06.0004
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma – Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri(İlçe)	Pozantı, K.Bucağı
Başlama - Bitiş Tarihi	21.12.2016– 11.09.2017
Proje Bedeli(TL)	2.148.309
İhale Bedeli(TL)	2.148.309
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.317.046
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	10
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

12.12.2016 tarihinde sözleşmesi yapılarak 21.12.2016 tarihinde çalışmalara başlanmıştır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Varda Köprüsünün aydınlatılması
Proje No	2017.E010060.01.06.0006
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma – Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri(İlçe)	K.Bucağı
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	---
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	675.058
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	İA

Proje Özet Bilgisi

Proje hazırlama aşamasında.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	MERSİN(Taşkent) – OSMANİYE(Toprakkale) İstasyonları Arası MOBESE Sistemi Kurulması ve Aydınlatma Yapılması İşi
Proje No	2017.E010040.03.06.0001
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma – Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan, Yüreğir, Ceyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	04.05.2015 - 19.06.2017
Proje Bedeli(TL)	4.115.888
İhale Bedeli(TL)	4.115.888
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	3.656.260
2017 Yıl İçi Harcama	145.179
2017 Yılı Ödeneği(TL)	757.794
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	80
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

Fiberoptik altyapı tamamlanmak üzere olup network ve kamera devreye alma işlemleri devam ediyor.




Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Adana - Mersin arasında muhtelif km.lerde toplam 11 adet yaya alt / üstgeçit projelerinin hazırlanmasına yönelik etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık işi
Proje No	2017.E010010.06.19
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma – Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri (İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	12.12.2016 - 19.05.2017
Proje Bedeli(TL)	120.372
İhale Bedeli(TL)	120.372
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	71.431
2017 Yılı Ödeneği(TL)	120.372
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

12.12.2016 tarihinde işe başlanmıştır. proje çalışmaları devam etmektedir.

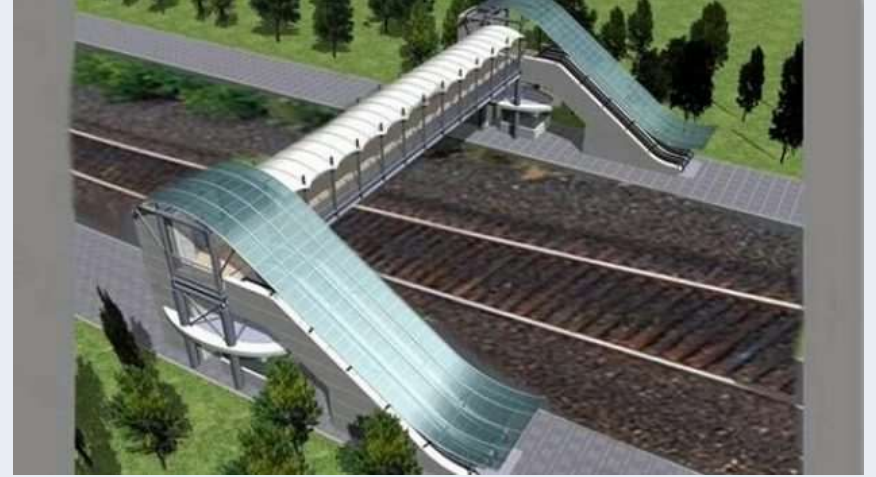

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Adana - Şehitlik İstasyonları arası Km.364+900'de yaya altgeçidi yapılması
Proje No	2017.E010010.06.21
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma – Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	09.01.2017 - 07.12.2017
Proje Bedeli(TL)	819.450
İhale Bedeli(TL)	819.450
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	775.833
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.192.190
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

07.08.2017 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	6. Bölge Müdürlüğü çevresinde güvenliği sağlamak için 3 adet x-ray cihazı alımı
Proje No	2017.E010060.38.06.0001
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma – Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	06.03.2017 - 04.06.2017
Proje Bedeli(TL)	138.111
İhale Bedeli(TL)	138.111
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	162.667
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

06.03.2017 tarihinde sözleşmesi yapılarak işe başlanmıştır. Mal alımı işi olup çalışmalar devam ediyor.




Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	6. Bölge Müdürlüğü Binası, Tesisler Binası ve Servis Depo Otoparkları için Araç Plaka Tanıma Sistemi Kurulumu
Proje No	2017.E010060.38.06.0007
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma – Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	06.03.2017 - 04.06.2017
Proje Bedeli(TL)	53.250
İhale Bedeli(TL)	53.250
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	53.250
2017 Yılı Ödeneği(TL)	53.250
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

Araç Plaka Tanıma Sistem Kurulumu Tamamlanmıştır.

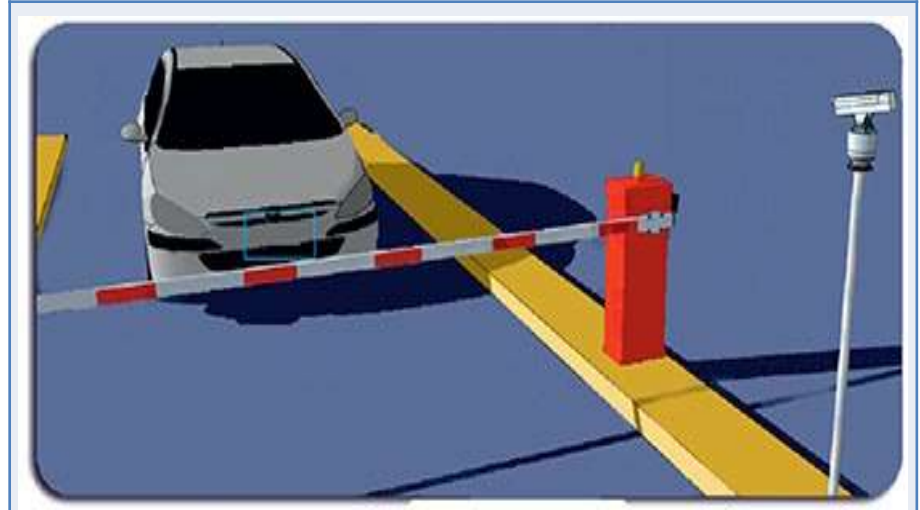

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Adana gar binasının RRR projeleri ile inşaat mekanik elektrik ve çevre düzenlenmesi işi projelerinin hazırlanması
Proje No	2017.E010060.27.06.0002
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma – Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri (İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	05.04.2016 - 31.12.2017
Proje Bedeli (TL)	166.000
İhale Bedeli (TL)	166.000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği (TL)	199.200
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek (TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	40
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

05.04.2016 tarihinde işe başlanmış olup röleve ve restitüsyon projeleri, hasar malzeme analizleri, fotoğraf albümleri ve teknik izah raporları Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğüne onaya gönderilmiştir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Adana-İncirlik-T.Kale arası 79 km 2.hat yapımı ve mevcut hat rehabilitasyonu
Proje No	2012.E010060.06.04
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma – Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan, Yüreğir, Ceyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	31.10.2016 - 30.06.2019
Proje Bedeli(TL)	248.307.009
İhale Bedeli(TL)	248.307.009
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	29.360.047
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	100.000.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

Adana-İncirlik-Toprakkale arasındaki mevcut 79 km'lik kesimin 160-200 km/saat hıza uygun, çift hatlı hale getirilmesi için altyapı ve üst yapı işi yapımında firma ile sözleşme imzalanmıştır. Ankara-Konya-Karaman-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattının bir bölümünü oluşturan bu hat aynı zamanda doğu ve güneydoğudan gelen yüklerin hızlı bir şekilde Mersin'e ulaşmasını sağlayacaktır.

Güzergah ve sanat yapıları projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Firma Ceyhan-Güngör güzergah plan profil ve geoteknik raporundaki eksikliklerle ilgili revize çalışmaları başlamıştır.Uygulama projeleri hazırlanıyor..





T.C.
ADANA VALİLİĞİ



ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Adı	Seyhan Yeni Hamam Restorasyonu
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	DHK-Sosyal/Sosyal Hizmetler ve Yardımlar
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	20.10.2015 - 11.06.2017
Proje Bedeli(TL)	4.247.895
İhale Bedeli(TL)	4.247.895
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	740.041
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.203.459
2017 Yılı Ödeneği(TL)	3.507.854
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	34
Fiziki Gerçekleşme (%)	40
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Restorasyon kapsamında Hamam sıcaklık ve ılıklik mahalleri ile zeminde mermer kaplama imalatları devam etmektedir. Hamam bahçe duvarı yapımı imalatları devam etmektedir. Soğukluk bölümünde yonu taşı çürütmeleri yapılmıştır.

Hamam batı cephesinde temel kazısı, blokaj, grobeton, yemel donatısı, yonu taşı kaplama çalışmaları yapıldı. Hamam batı cephesinde payanda duvarlar için paslanmaz çelik gergi çubuk imalatları yapılmıştır.



Proje Adı	Eski Çevik Kuvvetler Binası
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	DHK-Sosyal/Sosyal Hizmetler ve Yardımlar
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	11.01.2013 – 12.01.2016
Proje Bedeli(TL)	3.146.635
İhale Bedeli(TL)	3.146.635
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	50.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	0
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	30
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Hazırlanacak olan restorasyon projesine esas olmak üzere, Binanın iç kısmında sıva raspaşı yapılmıştır. Binanın güney cephesinde temel güçlendirmesi ve drenaj yapılabilmesi için kazı çalışması yapılmıştır. Restorasyon sonucu, tescilli vakıf kültür varlığı yapıya, Butik Otel fonksiyonu verilecektir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli olarak hazırlanarak Mart 2016 tarihinde onaylanan koruma amaçlı imar planında taşınmazın Resmi Kurum Alanı olarak imarı, Kültür-Turizm Alanı olarak değiştirilmiştir.

Ancak Yüklenici tarafından sözleşmenin tek taraflı fesh edilmesi yönünde dava açılmış ve dava derdest olduğundan proje ve restorasyon çalışmaları yapılamamaktadır.

İdareimizce tescilli yapının işgale uğramaması ve güvenliğin sağlanması için etrafı çevrilerek, gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.



RESTORASYON ÖNCESİ



KAZI SONRASI (GÜÇLENDİRME VE DRENAJ)

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Hacı Yunus Ağa Medresesi Arkeolojik Kazı ve Proje Temini İşi.
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	DHK-Sosyal/Sosyal Hizmetler ve Yardımlar
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	25.02.2016 – 30.03.2017
Proje Bedeli(TL)	248.780
İhale Bedeli(TL)	248.780
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	58.441
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	190.339
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	80
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Korunması gerekli vakıf kültür varlığı Hacı Yunus Ağa Medresesinin rekonstrüksiyon yoluyla yeniden yapılabilmesi için arkeolojik kazı yapılarak, buradan elde edilecek verilecek ve arşiv çalışmaları sonucu uygulama projelerinin hazırlanması işinin ihalesi yapılarak 25.02.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.

Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarının denetiminde kazı çalışmaları tamamlanmış olup, Koruma Kurulunun 31.03.2017 tarih ve 7746 sayılı kararı ile kazı sonrası 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı belirtilmiştir.



HACI YUNUS AĞA MEDERESESİ KAZI ALANI



HACI YUNUS AĞA MEDERESESİ KAZI ALANI

ADANA-YÜREĞİR
MİSİS KERVANSARAYI VE
LOKMAN HEKİM CAMİİ
RESTORASYONU
PROTOKOL

ojesi incelenerek onaylanmak üzere Koruma Kuruluna gönderilmiştir.

Mülkiyetleri İdaremize ait olan korunması gerekli vakıf kültür varlığı olarak tescilli Misis Kervansarayı restorasyon karşılığı kiralama suretiyle, aynı mahalde bulunan korunması gerekli vakıf kültür varlığı Lokman Hekim Camii' nin rekonstrüksiyonu yapılması işi protokol suretiyle Yüreğir İlçe Belediyesine verilmiştir.

Yüreğir İlçe Belediyesi her iki işi birleştirerek, Valilik Makamından almış olduğu katkı payı ile restorasyon ihalesini yapmıştır. Yüreğir İlçe Belediyesi tarafından 17.08.2015 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme düzenlenerek, 21.08.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin sözleşme bedeli 2.852.185,00 TL +K.D.V olup, işin süresi 150 gündür. İdaremiz bütçesinden, restorasyon işleri ile ilgili herhangi bir hakediş ödemesi yapılmayacaktır. İşlerin maddi kısmının tamamı Yüreğir İlçe Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Söz konusu işlerin kontrollüğü Yüreğir İlçe Belediyesi ile birlikte İdaremiz teknik personeli tarafından yürütülecektir.

Kervansaray ve Camide kazı ve temizlik çalışmaları tamamlanmıştır. Kazı sonrası hazırlanan Kervansaray ve Camiye ait kazı rölövesi Koruma Kuruluna sunulmuştur. Kazı sonrası Kervansaraya ve Camiye ait restorasyon projeleri de hazırlanarak Koruma Kuruluna sunulmuştur.



MİSİS KERVANSARAYI KAZI ALANI



LOKMAN HEKİM CAMİİ KAZI ALANI

ADANA-SEYHAN
CAFER PAŞA CAMİİ
REKONSTRÜKSİYON
PROTOKOL

Mülkiyeti İdaremize ait olan korunması gerekli vakıf kültür varlığı olarak tescilli Cafer Paşa Camisinin rekonstrüksiyonun yapılması işi ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğümüz ile Yüklenici şirket arasında düzenlenen Protokol; Genel Müdürlüğümüzce 25.07.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Yüklenici şirket' e 03.08.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak, işe başlanılmıştır. İşin süresi 24 aydır. İdaremiz bütçesinden, rekonstrüksiyon işleri ile ilgili herhangi bir hakediş ödemesi yapılmayacaktır. İşlerin maddi kısmının tamamı yüklenici şirket tarafından karşılanacaktır. İşin kontrollüğü İdaremiz teknik personeli tarafından yürütülecektir.

03.08.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Adana Müze Müdürlüğü denetiminde ve kontrolünde kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Kazı sonrası rölöve ve raporu, Koruma Kuruluna gönderilmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Kurul kararı sonrası uygulamaya geçilecektir.



CAFER PAŞA CAMİİ YIKILMADAN ÖNCE



CAFER PAŞA CAMİİ TEMEL İZLERİ



T.C.
ADANA VALİLİĞİ



ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	ORMAN İŞLETMECİLİĞİ PROJESİ
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	TARIM-Ormancılık
Proje Yeri(İlçe)	Muhtelif İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli(TL)	4.884.000
İhale Bedeli(TL)	4.884.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yılı İçi Harcama	3.319.997
2017 Yılı Ödeneği(TL)	4.884.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	68
Fiziki Gerçekleşme (%)	91
Projenin Bugünkü Durumu	İhale süreçleri devam etmektedir.
Proje Özet Bilgisi	
Bu Projede yıl sonu itibariyle; 1-Orman Yolu Yapımı: (3 adet planlama, 170 Km'lik aplikasyonun, 76 Km .yeniyol, 74Km. 'lik B.onarım , 32 Km üst yapının, 77 Km. sanat yapısı programı tamamlanmıştır. 2-Makine Teçhizat :(4 Adet Jenaratör, 4 adet Motorlu Testere alınacaktır.) 3-Tesisler: 1 Adet Trafo, 1 adet Sundurma, 1 adet Depo, 1 adet Kalorifer, 1 adet Garaj programı tamamlanmak üzeredir.	



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	FİDAN ÜRETİM PROJESİ
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	TARIM-Ormancılık
Proje Yeri(İlçe)	Muhtelif İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli(TL)	1.532.000
İhale Bedeli(TL)	1.532.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	145.900
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.532.000
2016 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	10
Fiziki Gerçekleşme (%)	34
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Bu Projede yıl sonu itibariyle;

1-Fidan Üretimi : 3.000.000 adet programa karşılık 2.000.000 adet üretilmiştir.

2-Fidan Bakımı : 5.000 adet fidan bakım programına karşılık 2.000.000 adet yapılmıştır.

3-Tesisler : (1 adet Soğuk Hava Deposu Tesisi yapılacaktır.)

4-Makine Teçhizat : (5 adet Muhtelif fidanlık teçhizatı alınacaktır.

5-Bina inşaatı:(1 Adet Muhtelif bina inşaatı.)

6-Tohum üretimi: (1.000 Kg. gerçekleştirilecektir.)



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	ORMAN KÖYLERİ ETÜT PLANLAMA PROJESİ
Proje No	2017A05060
Sektörü ve Altsektörü	TARIM-Ormancılık
Proje Yeri(İlçe)	Muhtelif İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli(TL)	15.000
İhale Bedeli(TL)	15.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	5.000
2017 Yılı Ödeneği(TL)	15.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	33
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Bu Proje yıl sonu itibariyle;
Proje bazında çalışmalar olup , Orman köylülerimizi kalkındırmaya dönük planlama çalışmaları yapılacaktır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	ORMAN KADASTRO PROJESİ
Proje No	2014A50040
Sektörü ve Altsektörü	TARIM-Ormancılık
Proje Yeri(İlçe)	Muhtelif İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli(TL)	100.000
İhale Bedeli(TL)	100.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	26.701
2017 Yılı Ödeneği(TL)	100.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	27
Fiziki Gerçekleşme (%)	7
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Proje bazında çalışmalar 10.000 Ha. Kadastro çalışması yapılması planlanmıştır. 250 Ha. Sahada çalışma tamamlanmıştır. Arazi ve büro çalışmaları devam etmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ
Proje No	2017A05030
Sektörü ve Altsektörü	TARIM-Ormancılık
Proje Yeri(İlçe)	Muhtelif İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli(TL)	4.714.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	126.699
2017 Yılı Ödeneği(TL)	4.714.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	3
Fiziki Gerçekleşme (%)	61
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlanacaktır.

Proje Özet Bilgisi

Bu Projede yıl sonu itibariyle;

1-Bina İnşaatları :

A-Yeni Bina İnşaatları : 1 Adet Yangın Gözetleme Kulesi. 2 Adet İlk Müdahale ekip binası, 1 Adet Teşhis ve Yırtıcı Böcek Üretim Laboratuvarı. programa uygun olarak ihaleleri yapılmış olup, inşaat süreçleri devam etmektedir.

B-İkmal Tevsii B.Onarım İnşaatları: 1 adet Yangın Gözetleme kulesi onarı

2-Orman Koruma : (12.830 adet calosoma üretimi yapılmıştır.)

3-Makine Teçhizat :

a) 22 Adet Sayısal Radyolink Sistemi Kurulacaktır.

b) 20 Adet muhtelif Laboratuvar cihazları tedarik edilecektir.

4-Tesisler: 40 Km. Yardop Tesisi programına karşılık 15 Km.lik kısmı tamamlanmıştır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	AĞAÇL. VE TOPRAK MUH.PROJESİ
Proje No	2017A05040
Sektörü ve Altsektörü	TARIM-Ormancılık
Proje Yeri(İlçe)	Muhtelif İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli(TL)	8.217.000.
İhale Bedeli(TL)	8.217.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	644.184
2017 Yılı Ödeneği(TL)	8.217.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	7
Fiziki Gerçekleşme (%)	30
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Bu Projede;

- 1-Ağaçlandırma : Tesis: 220 Ha programa karşılık, 85 Ha saha çalışması yapılmıştır.
- Bakım:1.200 Ha programa karşılık, 590 Ha saha çalışması yapılmıştır.
- 2-Rehabilitasyon: Tesis :880 Ha programa karşılık, 250 Ha saha çalışması yapılmıştır.
- Bakım: 2.000 Ha programa karşılık, 300 Ha saha çalışması yapılmıştır.
- 3-Maden Sahası Rehabilitasyonu: 11 Ha. Sahada çalışılacaktır.
- Bakım: 34 Ha Maden sahasında bakım çalışması yapılacaktır.
- 4-Toprak Muhafaza : Tesis : 2.000 Ha programa karşılık, 10 Ha saha çalışması yapılmıştır.
- 5-Fidan Üretimi : 2.300.000 adet fidana üretimi gerçekleştirilmiştir.
- 6-Fidan Bakımı : 5. 400.000 adet programa karşılık, 2.050.000 adet bakım çalışması yapılmıştır.
- 7-Tohum Üretimi : 4 ton tohum üretilmesi planlanmaktadır
- 8-Ağaç ve Tohum Islahı :43 Ha. Tohum Bahçesi Bakımı yapılacaktır.
- 9-Tesisler : 1 adet Sundurma Tesisi,
- 10- Makine Ekipman Alımı: 5 adet Muhtelif Fidanlık Makinaları alınacaktır.



T.C.
ADANA VALİLİĞİ

TEİAŞ 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kozan 380 TM Tevsiat
Proje No	11D030030
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Adana (Kozan)
Başlama - Bitiş Tarihi	2011-2018
Proje Bedeli(TL)	11.000.000
İhale Bedeli(TL)	8.737.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	5.000.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	3.132.591,22 TL
2017 Yılı Ödeneği(TL)	3.708.000 TL
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-1.292.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	84
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	bitti

Proje Özet Bilgisi

19.04.2017 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Yeşilhisar-Kozan TM (Toprak Telli Fiber Optikli)
Proje No	11D030070
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Adana (Kozan-Feke) Kayseri (Yahyalı- Yeşilhisar)
Başlama - Bitiş Tarihi	2011-2017
Proje Bedeli(TL)	100.000.000
İhale Bedeli	52.791.087 TL Kuzey Devresi için 54.881.381 TL Güney Devresi İçin
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	55.000.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	20.676.076 (2 Hat devre için)
2017 Yılı Ödeneği(TL)	45.000.000 (2 Hat devre için)
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	+25.000.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	46
Fiziki Gerçekleşme (%)	63,4 Kuzey devresi için 100 Güney devresi için
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Kuzey Devresi için:

288 adet direğin 288 adedinin alt montajı ve 259 adet direğin üst montajı tamamlandı. 232-290 nolu direkler arası tel çekimi yapıldı. Montaj çalışmaları devam ediyor.

Güney Devresi İçin: 02.05.2017 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Adana 380 TM Tevsiat
Proje No	14D030290
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Adana(Sarıçam)
Başlama - Bitiş Tarihi	2014–2018
Proje Bedeli(TL)	9.000.000
İhale Bedeli(TL)	5.381.440
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	900.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.136.477
2017 Yılı Ödeneği(TL)	4.000.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	28
Fiziki Gerçekleşme (%)	20
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

İnşaat:380 kV tarafında çalışmalara başlandı. Cihaz ve kesici temeli kazı-temel ve kolon çalışmaları devam ediyor.

Elektrik: Malzeme onayları devam ediyor.

Gecikme ile ilgili yazıldı.

Ayrıcılar, gerilim trafosu, akım trafosu, trep,parafudr, izolötör geldi.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Seyhan-Kuzey Adana Kablosu
Proje No	14D030150
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Adana(Çukurova)
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2019
Proje Bedeli(TL)	21.000.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	2.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.250.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	+2.248.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	İhale Aşamasında

Proje Özet Bilgisi

31.05.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, ihale değerlendirme çalışmaları devam ediyor.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Feke Havza - Kozan 380 EİH (Toprak Telli Fiber Optikli)
Proje No	14D030370
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Adana(Kozan-Feke)
Başlama - Bitiş Tarihi	2014–2018
Proje Bedeli(TL)	10.500.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	2.000.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	6.000.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	İhale Aşamasında

Proje Özet Bilgisi

SON DURUM:

- Kamulaştırma planı ihalesine çıkıldı
 - Orman izinleri ÇEDten sonra alıacaktır. (% 70'i orman) 15 Haziran'a kadar ÇED olumlu Kararı alınması hedeflenmektedir.
- Ağustos 2017 tarihinde tesis ihalesine çıkılabilir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Seyhan-Ceyhan 2 EİH Yenileme (Yeni Güzergah) (TTFO)
Proje No	14D030930
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Adana(Sarıçam)
Başlama - Bitiş Tarihi	2014–2018
Proje Bedeli(TL)	1.100.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	10.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödenęi(TL)	500.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	İhale aşamasında
Proje Özet Bilgisi	
<ul style="list-style-type: none">• Hava Mania planı ihalesine çıkılacaktır.	



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	(Kavşakbendi HES-Kozan 380 EİH) Brş.N-Aladağ EİH
Proje No	14D030950
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Adana(Aladağ-Kozan)
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2017
Proje Bedeli(TL)	5.000.000
İhale Bedeli(TL)	8.000.435
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	4.000.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	2.693.860,01
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.000.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	269
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	Bitti

Proje Özet Bilgisi

30.05.2017 de geçici kabulü yapıldı.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Feke Havza TM Tevsiat
Proje No	14D030980
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Adana(Feke)
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2018
Proje Bedeli(TL)	5.000.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	2.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.500.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	+500.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	İhale aşamasında

Proje Özet Bilgisi

Genel Müdürlüğümüzce ihale hazırlıkları yapılmaktadır
(21.07.2017 İhale tarihi)



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kozan TM Tevsiat
Proje No	15D030740
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Adana(Kozan)
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2018
Proje Bedeli(TL)	800.000
İhale Bedeli(TL)	535.460
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	2.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	500.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

22.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, malzeme onayları devam ediyor. Yüklenici Firmanın çalışmalarına başlaması bekleniyor.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Yüreğir TM Tevsiat
Proje No	15D030750
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Adana(Yüreğir)
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2017
Proje Bedeli(TL)	5.500.000
İhale Bedeli(TL)	3.063.181
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	3.500.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.657.034,91
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.000.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	+1.500.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	83
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	Bitti

Proje Özet Bilgisi

27.04.2017 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kozan 380 - Kozan EİH (Toprak Telli Fiber Optikli)
Proje No	15D030760
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Adana(Kozan)
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2017
Proje Bedeli(TL)	5.000.000
İhale Bedeli(TL)	17.826.491 (3 Proje Toplamıdır)
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	1.000.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	2.047.611,72
2017 Yılı Ödeneği(TL)	4.000.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	+1.000.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	51
Fiziki Gerçekleşme (%)	57
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor
Proje Özet Bilgisi	
<p>41 adet direğin alt montajı tamamlandı. 37 adet direğin üst montajı tamamlandı. Çalışmalar devam ediyor</p>	

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Karaisalı TM Tevsiat
Proje No	15D030770
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Adana(Karaisalı)
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2018
Proje Bedeli(TL)	3.300.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	2.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	400.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	+398.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	Hiç başlamadı.

Proje Özet Bilgisi

İhalesi Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ceyhan-2 TM Tevsiyat
Proje No	15D031120
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Adana(Ceyhan)
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2018
Proje Bedeli(TL)	800.000
İhale Bedeli(TL)	507.650
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	2.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	500.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

22.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, malzeme onayları devam ediyor. Yüklenici Firmanın çalışmalarına başlaması bekleniyor.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ceyhan 2 - Kozan Havza TM İrtibatları (TTFO)
Proje No	15D031130
Sektörü ve Altsektörü	ENERJİ
Proje Yeri(İlçe)	Adana(Ceyhan)
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2017
Proje Bedeli(TL)	440.000
İhale Bedeli(TL)	17.826.491 (3 Proje Toplamıdır)
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	100.000
2016 Yıl İçi Harcama (TL)	219.583,23
2016 Yılı Ödeneği(TL)	340.000
2016 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	65
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Ceyhan-2 TM'ne kablo girişi iptal oldu. Havai hatla giriş yapılacak olup yeni güzergah seçilerek plan-profil yapıldı. DTL oluşturuldu. Proje onaylandı.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ceyhan-1 TM Tevsiat
Proje No	15D031160
Sektörü ve Altsektörü	ENERJİ
Proje Yeri(İlçe)	Adana(Ceyhan)
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2018
Proje Bedeli(TL)	1.200.000
İhale Bedeli(TL)	1.314.500
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	2.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	560.687
2017 Yılı Ödeneği(TL)	500.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	112
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Yer teslimi yapılmış olup, malzeme onayları devam ediyor.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kozan-Ceyhan 2 EİH Yenileme
Proje No	15D031260
Sektörü ve Altsektörü	ENERJİ
Proje Yeri(İlçe)	Adana(Ceyhan-Kozan)
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2018
Proje Bedeli(TL)	17.000.000
İhale Bedeli(TL)	17.826.491 (3 Proje Toplamıdır)
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	4.000.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	3.571.898
2017 Yılı Ödeneği(TL)	12.000.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	+3.000.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	30
Fiziki Gerçekleşme (%)	44,7
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Tel demontajları tamamlandı. Demontaj edilecek 136 adet direğin 116 adedinin demontajı yapıldı. Montajı yapılacak olan 124 adet direğin; 104 adedinin alt ve 80 adet üst montajı tamamlandı. Çalışmalar devam ediyor.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Adana - Seydişehir EİH (KOP)(TTFO)
Proje No	16D000310
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam-Karaisalı-Pozantı
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2019
Proje Bedeli(TL)	130.000.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	1.000.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	14.000.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-35.000.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	Hiç başlamadı.

Proje Özet Bilgisi

ÇED ve kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Misis OSB TM
Proje No	16D000580
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	25.000.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	2.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.500.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-1.500.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	Hiç Başlamadı

Proje Özet Bilgisi

Adana Hacı Sabancı OSB tarafından bilabedel tahsisi yapıldıktan sonra çalışmalara başlanılacaktır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Adana 380 TM İrtibatları (TTFO)
Proje No	16D000690
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	500.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	2.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	100.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	Hiç Başlamadı

Proje Özet Bilgisi

Bölge Müdürlüğümüz tarafından proje hazırlıkları devam ediyor.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Karakuz - Eğlence HES EİH (TTFO)
Proje No	16D001460
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Karaisalı
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	2.500.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	2.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	500.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	Hiç Başlamadı



Temmuz 2017'de ÇED alınması

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	(Adana-Sugözü)Brş.-Misis OSB EİH
Proje No	17D000410
Sektörü ve Altsektörü	ENERJİ
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli(TL)	4.000.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	400.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	Hiç Başlamadı



Misis OSB TM'nin yer seçimi netleşmesi sonrası çalışmalara başlanılacaktır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Canlı Bakım İşletme Müdürlüğü Adana Canlı Bakım Atölyesi, Ambar, Garaj Yapımı
Proje No	17D001170
Sektörü ve Altsektörü	Enerji
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli(TL)	890.000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	100.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	Hiç Başlamadı

İhale ve projeyi Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır.





T.C.
ADANA VALİLİĞİ



ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	YUMURTALIK YAT LİMANI ETÜT PROJE İŞLERİ
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	TURİZM
Proje Yeri(İlçe)	YUMURTALIK
Başlama - Bitiş Tarihi	10.03.2016-28.01.2017
Proje Bedeli(TL)	500.000
İhale Bedeli(TL)	379.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	223.610
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	223.610
2017 Yılı Ödeneği(TL)	223.610
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	%100
Fiziki Gerçekleşme (%)	%100
Projenin Bugünkü Durumu	TAMAMLANDI

Proje Özet Bilgisi

Yumurtalık ilçesinde marina yapılması yönünde Kaymakamlık, Belediye, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün talepleri Bölge Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilerek, Bölge Müdürlüğümüz ve AYGM Araştırma Dairesi Başkanlığı teknik elemanlarınca yerinde incelemeler yapılmış ve 21.04.2014 tarihli "Araştırma Raporu" hazırlanmıştır. AYGM' nin 08.10.2015 tarih / 67342 sayılı Oluru ile ödenek tahsis edilmiştir.

İş Kapsamında:

- 850 mt. Ana Mendirek
- 400 mt. Tali Mendirek
- 770 mt. Rıhtım
- 300 Yat kapasitesi planlanmaktadır.

ÇED raporu 27.01.2017 tarihinde e-ÇED sistemi üzerinden ÇŞB'ye sunulmuş, 02.03.2017'de ÇED Halkın katılımı toplantısı yapılmıştır.

İmar planı dosyası 13.02.2017 tarihli yazımızla ÇŞB'ye sunulmuştur.

Proje ve hesaplar ile Fizibilite Raporları 16.02.2017 tarihli yazımızla AYGM'ye sunulmuştur.

Genel Müdürlükçe incelemeler devam etmektedir.





T.C.
ADANA VALİLİĞİ



T.C
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Çukurova Biyoçeşitlilik Müzesi
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Turizm
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli(TL)	8.000.000
İhale Bedeli(TL)	8.000.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	3.000.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	İhale Aşamasında

Proje Özet Bilgisi

03.07.2017 tarihinde ihalesi edilecek.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi (Karataş Kumluk Bakım Onarımı)
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Turizm
Proje Yeri(İlçe)	Karataş Kumluk Tabiat Parkı
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli(TL)	700.000
İhale Bedeli(TL)	453.430
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	700.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Devam eden işi

Proje Özet Bilgisi

Karataş Kumluk Tabiat Parkında Kır Lokantası bakım onarım işi 453.430TL' ye ihalesi edilip yapım aşamasındadır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Av Yaban Hayatı ve Su Ürünleri Projesi
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Turizm
Proje Yeri(İlçe)	Akyatan Yaban Hayatını Geliştirme Sahası
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli(TL)	600.000
İhale Bedeli(TL)	446.460
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	600.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Devam eden iş

Proje Özet Bilgisi

Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına 2 adet Kuş Gözlem ve Yürüyüş Yolu yapımı işi 446.460TL' olarak ihalesi edilip yapım işine başlanılmıştır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Korunan Alanlardaki Denetimin ve Kontrolün Etkinleştirilmesi
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Turizm
Proje Yeri(İlçe)	Karataş Kumluk Tabiat Parkı
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli(TL)	480.000
İhale Bedeli(TL)	299.800
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	480.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Sözleşme Kapsamında devam eden işi

Proje Özet Bilgisi

Karataş Kumluk Tabiat Parkı içerisine 4 adet Kır Evi (Bungalov) yapımı işi 29.05.2017 tarihinde 299.800TL olarak ihalesi edilip yapım işine başlanılmıştır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Diğer Kamu Hizmetleri
Proje Yeri(İlçe)	Aladağlar Milli Parkı
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli(TL)	130.000
İhale Bedeli(TL)	78.300
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	130.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Sözleşme aşamasında
Proje Özet Bilgisi	

Aladağlar Milli Parkı Acıman Yayasası Acısu mevkiinde yapılması planlanan Giriş Kontrol Ünitesi 78.300TL' ye ihalesi edilip sözleşme aşamasındadır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Etüd Plan Proje
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Turizm
Proje Yeri(İlçe)	Yumurtalık Lagünleri Milli Parkı
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli(TL)	65.000
İhale Bedeli(TL)	65.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	65.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Doğrudan teminle yapılmakta.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Etüd Plan Proje
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Diğer Kamu Hizmetleri
Proje Yeri(İlçe)	Belemedik Tabiat Parkı
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli(TL)	50.000
İhale Bedeli(TL)	50.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yılı İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	50.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Yapım aşamasında.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Diğer Kamu Hizmetleri
Proje Yeri(İlçe)	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli(TL)	50.000
İhale Bedeli(TL)	50.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yılı İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	50.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

Proje Özet Bilgisi

Ceyhan Açık Ceza infaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğünce kedi ve köpek barınağı yapımı işi tamamlanmış olup ödeme aşamasındadır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Av Yaban Hayatı Su Ürünleri Projesi
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Diğer Kamu Hizmetleri
Proje Yeri(İlçe)	Hançerderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli(TL)	20.000
İhale Bedeli(TL)	17.275
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yılı İçi Harcama	17.275
2017 Yılı Ödeneği(TL)	20.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	86
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı
Proje Özet Bilgisi	

Hançerderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki bekçi evi için su isale hattı yapımı işi Nisan 2017 tarihinde 17.275TL olarak tamamlandı.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Sulak Alanların Korunması Tanzimi ve Rehabilitasyonu
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Diğer Kamu Hizmetleri
Proje Yeri(İlçe)	Yumurtalık Lagünleri Milli Parkı
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli(TL)	30.000
İhale Bedeli(TL)	30.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yılı İçerisinde Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği(TL)	30.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Henüz Başlanmadı

Proje Özet Bilgisi

Kuşların göç mevsimine göre ayarlandığından eylül ayında yapılacaktır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Av Yaban Hayatı Su Ürünleri Projesi
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Diğer Kamu Hizmetleri
Proje Yeri(İlçe)	Hançerderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli(TL)	10.000
İhale Bedeli(TL)	8.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama	8.000
2017 Yılı Ödeneği(TL)	10.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	80
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

Proje Özet Bilgisi

04.04.2017 tarihinde 8.000TL olarak tamamlandı



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Ulaştırma
Proje Yeri(İlçe)	Aladağlar MP
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2017
Proje Bedeli(TL)	493.709,19
İhale Bedeli(TL)	493.709,19
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	473.078,66
2017Yıl İçi Harcama	
2017 Yılı Ödeneği(TL)	10.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	96
Fiziki Gerçekleşme (%)	98
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı
Proje Özet Bilgisi	
Aladağlar Milli Parkı Acıman yaylası ile küçükburun mevkiinde 7.340 metrelik yolun sanat yapıları , üst yapısı yapımı ve Kapuzbaşı şelalesi asfalt yol arası 15.300 metrelik yolun üst yapısının yapılması işi 2017 yılına sari olarak ihalesi yapılmıştır. 473.078,19 ' lik kısmı tamamlanan işin kalan kısmı tamamlandı ödeme aşamasında	





T.C.
ADANA VALİLİĞİ



ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Sağlık Kampüsü
Proje No	00000000000
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2017
Proje Bedeli(TL)	1.030.000.000
İhale Bedeli(TL)	1.030.000.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yılı İçi Harcama (TL)	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	0
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	93
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

İşin fiziki gerçekleşme oranı %93 seviyesindedir.

05.10.2013 tarihinde temel atma töreni yapılmıştır. 584 yataklı Bölge Hastanesi, 182 yataklı Onkoloji Hastanesi, 349 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 185 yataklı Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yatırımını kapsamaktadır. İnşaat devam etmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	250 Yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi
Proje No	1991I000090
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Ceyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	2012-2016
Proje Bedeli(TL)	46.762.220
İhale Bedeli(TL)	46.762.220
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	11.992.146
2017Yıl İçi Harcama (TL)	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	0
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	35
Projenin Bugünkü Durumu	İA

Proje Özet Bilgisi

İşin fiziki gerçekleşme oranı % 35 seviyesindedir.

TOKİ tarafından tasfiye işlemi tamamlanmıştır.Bakanlığımızca uygulama projeleri çalışmaları tamamlanmıştır. İhale evrakları Bakanlığımız ihale birimine ulaşıp olup 10.08.2017 tarihinde Bakanlığımızca ihalesi yapılacaktır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	200 Yataklı Çukurova Dr.Aşkim TÜFEKÇİ Devlet Hastanesi Ek Binası
Proje No	1991I000030
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2017
Proje Bedeli(TL)	70.505.000
İhale Bedeli(TL)	70.505.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	52.305.840
2017Yıl İçi Harcama (TL)	12.791.688
2017Yılı Ödeneği(TL)	18.199.160
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	70
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

İşin fiziki gerçekleşme oranı % 95 seviyesindedir.

Kabul aşamasındadır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	15 Yataklı Aladağ Entegre İlçe Hastanesi
Proje No	2009 I 000900
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Aladağ
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	8.788.640
İhale Bedeli(TL)	8.788.640
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	743.217
2017Yıl İçi Harcama	1.665.126
2017Yılı Ödeneği(TL)	8.045.423
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	20
Fiziki Gerçekleşme (%)	35
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

İşin fiziki gerçekleşme oranı % 35 seviyesindedir.

İnşaat devam etmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Seyhan Halk Sağlığı Merkezi (9 AHB) +Seyhan İlçe Sağlık Müd. +112 Adana-Seyhan ASHİ+ Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli(TL)	13.534.305
İhale Bedeli(TL)	13.534.305
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama (TL)	1.182.933
2017Yılı Ödeneği(TL)	1.182.933
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	10
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

İşin fiziki gerçekleşme oranı % 10 seviyesindedir.

İnşaat devam etmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Yüreğir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (50 Ünit)
Proje No	1991I000030
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2017
Proje Bedeli(TL)	9.338.005
İhale Bedeli(TL)	9.338.005
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama (TL)	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	4.500.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	25
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

İşin fiziki gerçekleşme oranı % 25 seviyesindedir.

İnşaat devam etmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ceyhan Toplum Sağlığı Merkezi
Proje No	000000000000
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Ceyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2017
Proje Bedeli(TL)	917.333
İhale Bedeli(TL)	917.333
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	511.616
2017Yıl İçi Harcama (TL)	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	405.717
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

İşin fiziki gerçekleşme oranı % 95 seviyesindedir. Firma cezalı çalışmaktadır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kozan Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Kozan
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli(TL)	5.475.200
İhale Bedeli(TL)	5.475.200
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama (TL)	1.142.000
2017Yılı Ödeneği(TL)	5.475.200
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	52
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

İşin fiziki gerçekleşme oranı % 52 seviyesindedir.

İnşaat devam etmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	İmamoğlu Devlet Hastanesi 35 Yataklı Ek Bina İnşaatı
Proje No	19911000040
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	İmamoğlu
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2017
Proje Bedeli(TL)	6.810.606
İhale Bedeli(TL)	6.810.606
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	4.035.989
2017Yıl İçi Harcama	3.527.034
2017Yılı Ödeneği(TL)	3.527.034
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	BT

Proje Özet Bilgisi

Geçici kabulü yapılmıştır. En kısa sürede hizmet verecektir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Sağlık Müdürlüğü Çok Amaçlı Toplantı Salonu
Proje No	0000000
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2017
Proje Bedeli(TL)	208.624
İhale Bedeli(TL)	208.624
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	208.624
2017Yılı Ödeneği(TL)	208.624
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	BT

Proje Özet Bilgisi

Geçici kabulü yapılmış ve hizmet vermeye başlamıştır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Adana Devlet Hastanesi
Proje No	1991I000030
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	45.000.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	0
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Mevcut binanın yıkım işleri tamamlanmıştır.

Bakanlığımız tarafından değerlendirilerek ihale edilecektir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	200 Yataklı Güney Seyhan Devlet Hastanesi+112 ASHİ+ASM
Proje No	1991I000030
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	40.000.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	2.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Bakanlığımızca 200 yataklı olarak yatırım planına alınmış olup, Adana Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından Bakanlığımızca talep edilen ihtiyaç tespit formu hazırlanmıştır. 1/1000 lik plan hazırlanmış ve Seyhan Belediye Başkanlığınca onaylanmıştır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ceyhan 2 Hekimlik ASM
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli(TL)	600.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	0
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Bakanlığımız tarafından, arsa sorununun çözülmemesi nedeniyle Yüreğir Sağlıklı Yaşam Merkezi yatırımının yerine Ceyhan ilçesinde, 2 hekimlik Kurtkulağı ASM yatırımının değiştirilmesi uygun görülmüştür. Arsa imar uygulama alanı dışındadır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Adana Halk Sağlığı Labaratuvarı
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	2.500.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	1.000.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Bakanlığımız 2017 yılı yatırım programında yer almakta olup Kazım Karabekir ASM'nin bulunduğu arsa içine yapılacaktır. Bakanlığımız tarafından projeleri L1 tipi olarak hazırlanmaktadır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Seyhan Yeşiloba Göçmen Sağlığı Merkezi + 112 İstasyonu
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Alt Sektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	1.500.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	2.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

11411 ada 2 parselde kayıtlı 1137 m2 arsa üzerine yapılacak olan. 6 Hekimli ASM ve 112 İstasyonu Bakanlığımızca yatırım planına alınmıştır. 1/1000 lik imar planları ve zemin etüdünün tamamlanmasına müteakip, özel proje hazırlanacaktır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kozan Ağlıboğaz Göçmen Sağlığı Merkezi + 112 İstasyonu
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Kozan
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	2.002.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	2.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Bakanlığımız 2017 yılı yatırım programında yer almakta olup 1/1000 lik imar planları ve zemin etüdünün tamamlanmasına müteakip, özel proje hazırlanacaktır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Pozantı Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi + 112 İstasyonu
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Pozantı
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	3.275.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	1.000.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Bakanlığımız 2017 yılı yatırım programında yer almakta olup Zafer Mahallesi 29 ada 9 parsel üzerinde yapılacaktır. Zemin etütleri için çalışmalar Müdürlüğümüzce yaptırılmaktadır. Zemin etüdünün tamamlanmasına müteakip, arsanın küçük olmasından dolayı özel proje hazırlanacaktır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	İsmailiye Göçmen Sağlığı Merkezi + 112 İstasyonu
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	552.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	2.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Hayırsever tarafından bağışlanan arsa üzerinde yapılacaktır. Zemin etüdü çalışmaları başlamıştır. Arsa imar uygulama alanı dışındadır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kireçocağı 4 Hekimli ASM + 112 İstasyonu
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	2.500.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	0
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

İlimiz Çukurova İlçesi, Kireç ocağı Mahallesi (100. Yıl) 12909 Ada 1 parselde kayıtlı maliye hazinesine ait Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsisli 1.623 m2 yüz ölçümüne sahip sağlık tesis alanı üzerine TRSM, 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi +112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacaktır. Bakanlığımız tarafından yatırım programına alınmıştır.Zemin etütleri için çalışmalar Müdürlüğümüzce yaptırılmaktadır. Zemin etüdünün tamamlanmasına müteakip, özel proje hazırlanacaktır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Alkol ve Madde Bağımlılıkları Merkezi (AMATEM) Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi (ÇEMATEM)
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	3.000.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	0
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Bakanlığımızca avan proje hazırlanmış olup, uygulama projeleri hazırlanmaktadır. Buna müteakip ihale edilecektir.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Şakirpaşa ASM+112 İstasyonu
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	1.500.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	0
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Bakanlığımız 2017 yılı yatırım programında yer almakta olup arsa çalışmaları devam etmektedir.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Güzelyalı ASM+112 ASHİ Yapılması
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	2.000.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	2.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Güzelyalı mahallesi 4977 ada 2 parsel üzerindeki arsaya yapılacaktır. Arsa üzerindeki işgalin kaldırılması için vatandaşlara 10.07.2017 tarihine kadar süre verilmiştir. Zemin etüdünün tamamlanmasına müteakip, özel proje hazırlanacaktır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Karaisalı 6 Hekimlik ASM
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Karaisalı
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	2.000.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	500.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

İlçe merkezinde daha önce Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılan arsa üzerinde inşa edilecektir. Mevcut binaların yıkım izni için 09.06.2017 tarihinde Bakanlığımıza yazı yazılmıştır. Zemin etüdünün tamamlanmasına müteakip, özel proje hazırlanacaktır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Çukurova Merkez 112 İstasyonu
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	417.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	2.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Bahçesine ikili ASHİ yapılacaktır. Zemin etüdü başlamıştır. Zemin etüdünün tamamlanmasına müteakip, tip proje olarak ihale edilecektir.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Bahçeşehir Mahallesi 112 İstasyonu
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	417.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	2.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Arsanın yarı sahibi olan DSİ Genel Müdürlüğünün izin vermesi beklenmektedir. İzin yazısının gelmesi ve zemin etüdünün tamamlanmasına müteakip, tip proje uygulanacaktır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Pınar Mahallesi 112 İstasyonu
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	417.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	2.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Bakanlığımız 2017 yılı yatırım programında yer almakta olup arsa çalışmaları devam etmektedir.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Güzelyalı Mahallesi 112 İstasyonu
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	417.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	2.000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Bakanlığımız 2017 yılı yatırım programında yer almakta olup arsa çalışmaları devam etmektedir.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Sarıçam Göçmen Sağlığı Merkezi
Proje No	2006I001500
Sektörü ve Altsektörü	Sağlık
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli(TL)	750.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği(TL)	0
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yapılması planlanmakta olup arsa bilgileri Bakanlığımıza gönderilmiştir. Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.



T.C.
ADANA VALİLİĞİ



İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ

Proje No	●	2010A020060
Sektörü ve Alt Sektörü	●	TARIM – Bitkisel Üretim
Proje Yeri	●	Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi	●	01.01.2017 – 31.12.2017
Proje Bedeli	●	74.000 TL
2017 Yılı İçi Harcama	●	42.586 TL
2017 Yılı Ödeneği	●	74.000 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek	●	62.765 TL
Nakdi Gerçekleşme	●	% 57
Fiziki Gerçekleşme	●	% 50

Birim alandan alınan verimin ve kalitenin artırılması amacı ile **yayım, tanıtım ve demonstrasyonlar** yapılmaktadır.

HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ

Proje No	●	2010A030010
Sektörü ve Alt Sektörü	●	TARIM – Hayvancılık
Proje Yeri	●	Merkez ve 15 İlçe
Başlama ve Bitiş Tarihi	●	01.01.2017 – 31.12.2017
Proje Bedeli	●	22.000 TL
2017 Yılı İçi Harcama	●	21.165 TL
2017 Yılı Ödeneği	●	22.000 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek	●	43.920 TL
Nakdi Gerçekleşme	●	% 36
Fiziki Gerçekleşme	●	% 50

Hayvan varlığımızın genetik yönden ilerlemesini sağlayarak **üstün verimli hayvanlar** elde edilmesi amaçlanmaktadır.

BİTKİ SAĞLIĞI VE UYGULAMALARI KONTROLÜ PROJESİ

Proje No	●	2010A020040
Sektörü ve Alt Sektörü	●	TARIM – Bitkisel Üretim
Proje Yeri	●	Merkez ve 15 İlçe
Başlama ve Bitiş Tarihi	●	01.01.2017 – 31.12.2017
Proje Bedeli	●	178.000 TL
2017 Yılı İçi Harcama	●	57.635 TL
2017 Yılı Ödeneği	●	178.000 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek	●	115.617 TL
Nakdi Gerçekleşme	●	% 32
Fiziki Gerçekleşme	●	% 50

Bitki Hastalık ve Zararlıları ile etkin mücadele yaparak **verim ve kalitenin artırılması** amaçlanmaktadır.

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ

Proje No	●	2003A030020
Sektörü ve Alt Sektörü	●	TARIM – Hayvancılık
Proje Yeri	●	Merkez ve 15 İlçe
Başlama ve Bitiş Tarihi	●	01.01.2017 – 31.12.2017
Proje Bedeli	●	95.000 TL
2017 Yılı İçi Harcama	●	24.871 TL
2017 Yılı Ödeneği	●	95.000 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek	●	37.570 TL
Nakdi Gerçekleşme	●	% 26
Fiziki Gerçekleşme	●	% 50

Hayvan hastalık ve zararlıları ile etkin mücadele yaparak **güvenilir hayvansal gıda üretimini** artırmak hedeflenmektedir.

ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

Proje No	●	2012A020070
Sektörü ve Alt Sektörü	●	TARIM – Bitkisel Üretim
Proje Yeri	●	Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi	●	01.01.2017 – 31.12.2017
Proje Bedeli	●	64.000 TL
2017 Yılı İçi Harcama	●	24.398 TL
2017 Yılı Ödeneği	●	64.000 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek	●	63.504 TL
Nakdi Gerçekleşme	●	% 38
Fiziki Gerçekleşme	●	% 50

İnsan sağlığına duyarlı, hayvan refahını artıran, doğal kaynakları koruyan ve güvenilir tarımsal ürünler sunan **organik tarımın yaygınlaştırılması** amaçlanmıştır

İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

Proje No	●	2010A020040
Sektörü ve Alt Sektörü	●	TARIM – Bitkisel Üretim
Proje Yeri	●	Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi	●	01.01.2017 – 31.12.2017
Proje Bedeli	●	51.500 TL
2017 Yılı İçi Harcama	●	5.707 TL
2017 Yılı Ödeneği	●	51.500 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek	●	51.919 TL
Nakdi Gerçekleşme	●	% 11
Fiziki Gerçekleşme	●	% 50

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğini sağlayan **iyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması** amaçlanmıştır

TARIMSAL YAYIM EĞİTİM VE YAYINI GELİŞTİRME PROJESİ

Proje No	●	2012A020060
Sektörü ve Alt Sektörü	●	TARIM – Bitkisel Üretim
Proje Yeri	●	Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi	●	01.01.2017 – 31.12.2017
Proje Bedeli	●	68.000 TL
2017 Yılı İçi Harcama	●	11.017 TL
2017 Yılı Ödeneği	●	68.000 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek	●	60.574 TL
Nakdi Gerçekleşme	●	% 16
Fiziki Gerçekleşme	●	% 50

Üretimde verimliliği artıracak teknik ve yöntemler konusunda **üreticiyi bilgilendirici, teşvik edici ve kırsal alanda yaşayan nüfusa geçim kaynaklarını artırıcı** tedbirler almak amaçlanmaktadır

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ

Proje No	●	2010A020100
Sektörü ve Alt Sektörü	●	TARIM – Bitkisel Üretim
Proje Yeri	●	Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi	●	01.01.2017 – 31.12.2017
Proje Bedeli	●	90.000 TL
2017 Yılı İçi Harcama	●	34.624 TL
2017 Yılı Ödeneği	●	90.000 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek	●	75.949 TL
Nakdi Gerçekleşme	●	% 38
Fiziki Gerçekleşme	●	% 50

Ortalama İşletme büyüklüğünün artırılarak **modern tarım işletmeciliğinin altyapısının tesis edilmesi** amaçlanmaktadır.

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Proje No	●	2014A040030
Sektörü ve Alt Sektörü	●	TARIM – Su Ürünleri
Proje Yeri	●	Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi	●	01.01.2017 – 31.12.2017
Proje Bedeli	●	3.000 TL
2017 Yılı İçi Harcama	●	8.668 TL
2017 Yılı Ödeneği	●	3.000 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek	●	9.201 TL
Nakdi Gerçekleşme	●	% 289
Fiziki Gerçekleşme	●	% 50

Su kaynaklarının etkin olarak kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ

Proje No	●	2009A020050
Sektörü ve Alt Sektörü	●	TARIM – Bitkisel Üretim
Proje Yeri	●	Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi	●	01.01.2017 – 31.12.2017
Proje Bedeli	●	6.000 TL
2017 Yılı İçi Harcama	●	2.350 TL
2017 Yılı Ödeneği	●	6.000 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek	●	8.350 TL
Nakdi Gerçekleşme	●	% 39
Fiziki Gerçekleşme	●	% 50

Kırsal alanda gelir düzeyini yükseltmek, tarımsal üretimle tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak, alternatif geçim kaynakları oluşturmak amaçlanmaktadır.

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE KAYNAK YÖN. GEL. PROJESİ

Proje No	●	2010A040050
Sektörü ve Alt Sektörü	●	TARIM – Su Ürünleri
Proje Yeri	●	Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi	●	01.01.2017 – 31.12.2017
Proje Bedeli	●	9.500 TL
2017 Yılı İçi Harcama	●	15.600 TL
2017 Yılı Ödeneği	●	9.500 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek	●	49.418 TL
Nakdi Gerçekleşme	●	% 164
Fiziki Gerçekleşme	●	% 50

Su ürünleri üretimini denetlemek, su ürünleri üretimini arttırmak için, **yetiştiricilik, açık deniz balıkçılığı ile stokları koruyucu, geliştirici faaliyet ve hizmetleri** amaçlamaktadır.

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI PROJESİ

Proje No	●	2009A020040
Sektörü ve Alt Sektörü	●	TARIM – Bitkisel Üretim
Proje Yeri	●	Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi	●	01.01.2017 – 31.12.2017
Proje Bedeli	●	7.600 TL
2017 Yılı İçi Harcama	●	7.593 TL
2017 Yılı Ödeneği	●	7.600 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek	●	7.597 TL
Nakdi Gerçekleşme	●	% 100
Fiziki Gerçekleşme	●	% 50

Erozyon ve olumsuz çevre etkilerine maruz kalan hassas bölgelerde, **su ve toprak kalitesi ile doğal bitki örtüsünün korunmasına yönelik** alternatif ürün ve üretim modellerinin uygulanması amaçlanmaktadır

SULARDA TARIMSAL FAAL. KAY. KİRLİLİĞİN İZLENMESİ PROJ.

Proje No	●	2015A020160
Sektörü ve Alt Sektörü	●	TARIM – Bitkisel Üretim
Proje Yeri	●	Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi	●	01.01.2017 – 31.12.2017
Proje Bedeli	●	4.000 TL
2017 Yılı İçi Harcama	●	778 TL
2017 Yılı Ödeneği	●	4.000 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek	●	1.998 TL
Nakdi Gerçekleşme	●	% 19
Fiziki Gerçekleşme	●	% 50

Yüzey ve yeraltı sularının tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğinin **etkin olarak izlenmesi, hassas alanların belirlenmesi ve kirliliğin önlenmesi** amaçlanmaktadır

GIDA VE YEM NUMUNESİ ALIM HİZ. GÜÇ. PROJESİ

Proje No	●	2015C010040
Sektörü ve Alt Sektörü	●	İMALAT – Gıda
Proje Yeri	●	Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi	●	01.01.2017 – 31.12.2017
Proje Bedeli	●	92.000 TL
2017 Yılı İçi Harcama	●	0 TL
2017 Yılı Ödeneği	●	92.000 TL
2017 Yılı Gönderilen Ödenek	●	0 TL
Nakdi Gerçekleşme	●	% 0
Fiziki Gerçekleşme	●	% 50

Ülke genelinde üretilen ve ithalat kapsamında ülkeye giren her türlü işlenmiş, işlenmemiş gıdaların veya gıda ile temas eden madde ve malzemelerin **güvenli bir şekilde arzını** sağlamak



T.C.
ADANA VALİLİĞİ



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Adı	SARIÇAM İLÇESİ YENİ STADYUM YAPIMI
Proje No	00000000000.
Sektörü ve Altsektörü	EĞİTİM - GENÇLİK VE BEDEN EĞİTİMİ SPOR
Proje Yeri(İlçe)	SARIÇAM
Başlama - Bitiş Tarihi	23.09.2013-770 GÜN (01.12.2015) SÜRE UZATIMI : (240 +251+280) =771 GÜN) İŞ BİTİM TARİHİ : 10.01.2018
Proje Bedeli(TL)	140.000.000
İhale Bedeli(TL)	126.201.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	74.689.371
2017Yıl İçi Harcama (TL)	7.783.494
2017Yılı Ödeneği(TL)	43.728.135
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	65
Fiziki Gerçekleşme (%)	75
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

İNCE İNŞAAT İŞLERİ KAPSAMINDA DUVAR SERAMİĞİ, ZEMİN SERAMİĞİ, MERMER VE GRANİT MERDİVEN BASAMAKLARI, GRANİT LAVABO TEZGAH MONTAJI, SATEN ALÇI İMALATLARI TAMAMLANMIŞTIR.

TAVAN BOYASI İMALATLARI BÜYÜK ORANDA TAMAMLANMIŞTIR. DUVAR BOYASI İMALATLARI DEVAM ETMEKTEDİR. METAL ASMA TAVAN İMALATLARI, ALÜMİNYUM VE ALÇIPAN ASMA TAVAN İMALATLARI TAMAMLANMAK ÜZEREDİR. ZEMİN EPOKSİ KAPLAMA İMALATI, AHŞAP KAPI KANAT MONTAJI DEVAM ETMEKTEDİR.

ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ İŞLERİ KAPSAMINDA DOLGU İŞLERİNE BAŞLANMIŞTIR. İSTİNAT DUVARLARI YAPIM İŞLERİ DEVAM ETMEKTEDİR. KISA ZAMAN İÇERİSİNDE ÇELİK ÇATI İMALATLARINA BAŞLANACAKTIR.



Proje Adı	YÜREĞİR İLÇESİ MERKEZ OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU YAPIMI
Proje No	00000000000.
Sektörü ve Altsektörü	EĞİTİM - GENÇLİK VE BEDEN EĞİTİMİ SPOR
Proje Yeri(İlçe)	YÜREĞİR
Başlama - Bitiş Tarihi	16/12/2016 -- (650 GÜN) 27/09/2018
Proje Bedeli(TL)	28.000.000
İhale Bedeli(TL)	24.953.460
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.108.772
2017 Yılı Ödeneği(TL)	23.844.688
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	----
Nakdi Gerçekleşme (%)	5
Fiziki Gerçekleşme (%)	15
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU YAPIMI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 02/11/2016 TARİHİNDE İHALE EDİLEREK, 16/12/2016 TARİHİNDE YER TESLİMİ YAPILIP, İŞE BAŞLANILMIŞ OLUP, TEMEL BETON VE İZOLASYON İŞLERİ TAMAMLANMIŞTIR. 03.05.2017 TARİHİ İTİBARI İLE İŞİN YAPIMI DURDURULMUŞ OLUP, MÜŞAVİR FİRMA TARAFINDAN GEREKLİ YAZIŞMA VE YASAL SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR.



Proje Adı	YÜREĞİR KAMP EĞİTİM MERKEZİ YAPIMI
Proje No	00000000000.
Sektörü ve Altsektörü	EĞİTİM - GENÇLİK VE BEDEN EĞİTİMİ SPOR
Proje Yeri(İlçe)	YÜREĞİR
Başlama - Bitiş Tarihi
Proje Bedeli(TL)	4.000.000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2016Yıl İçi Harcama (TL)	0
2016Yılı Ödeneği(TL)	400.000
2016Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	----
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	HB

Proje Özet Bilgisi

KAMP EĞİTİM MERKEZİ YAPILACAK ARAZİYE AİT 1/1000'LİK İMAR PLANI İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞ OLUP, İHALE İŞLEMLERİNE BAŞLANILMASI İÇİN 13.02.2017 TARİH VE 1112 SAYILI YAZIMIZ İLE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BİLDİRİLMİŞTİR.

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE İHALE ÖNCESİ İŞLEMLERİ DEVAM ETMEKTEDİR.





T.C.
ADANA VALİLİĞİ



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Adı	Osmangazi Mah. Anaokulu
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	19.09.2016-06.04.2017
Proje Bedeli(TL)	1.300.000,00
İhale Bedeli(TL)	1.146.370,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	368.074,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	763.251,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	778.296,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	99
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı bitti.

Proje Özet Bilgisi

Proje 7 derslikli olarak yapılmıştır.



Proje Adı	Cumhuriyet Mah. Anaokulu
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	07.10.2016-04.04.2017
Proje Bedeli(TL)	1.300.000,00
İhale Bedeli(TL)	1.184.484,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	366.329,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	795.520,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	818.155,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	98
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı bitti

Proje Özet Bilgisi

Proje 7 derslikli olarak yapılmıştır.



Proje Adı	Barış Mah. Anaokulu
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	20.01.2017-18.07.2017
Proje Bedeli(TL)	1.300.000,00
İhale Bedeli(TL)	1.161.946,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.112.264,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.161.946,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	95
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı bitti

Proje Özet Bilgisi

Proje 7 derslikli olarak yapılmıştır.



Proje Adı	Aydınlar Mah. İlkokulu
Proje No	10428
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	16.10.2015-29.09.2016
Proje Bedeli(TL)	2.500.000,00
İhale Bedeli(TL)	2.479.246,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	1.295.215,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.184.032,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	53
Fiziki Gerçekleşme (%)	70
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı tasfiye edildi

Proje Özet Bilgisi

Proje 28 derslikli olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu
Proje No	MEB.2014.24 OO
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	19.09.2016-14.08.2017
Proje Bedeli(TL)	10.500.000,00
İhale Bedeli(TL)	7.336.060,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	816.096,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.593.422,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	6.519.963,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	33
Fiziki Gerçekleşme (%)	80
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 24 derslikli olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Oğuzhan Ortaokulu
Proje No	MEB.2014.20 OO
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	27.01.2017-22.12.2017
Proje Bedeli(TL)	9.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	5.546.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.673.239,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	5.546.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	30
Fiziki Gerçekleşme (%)	40
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 20 derslikli olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Yeniyayla Köyü Ortaokulu İkmal İnşaatı
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	21.04.2017-20.07.2017
Proje Bedeli(TL)	229.200,00
İhale Bedeli(TL)	229.200,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	207.800,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	229.200,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	92
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 4 derslikli olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Yıldırım Beyazıt Ortaokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	15.04.2017-10.12.2017
Proje Bedeli(TL)	2.150.000,00
İhale Bedeli(TL)	1.709.820,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	136.705,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.709.820,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	8
Fiziki Gerçekleşme (%)	23
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor
Proje Özet Bilgisi	
Proje 16 derslikli olarak yapılmaktadır.	



Proje Adı	Saniye Hüsamettin Özaltın Ortaokulu
Proje No	10428
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	23.08.2016-12.10.2017
Proje Bedeli(TL)	3.628.000,00
İhale Bedeli(TL)	2.758.722,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.238.144,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.758.722,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	45
Fiziki Gerçekleşme (%)	53
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor
Proje Özet Bilgisi	
Proje 28 derslikli olarak yapılmaktadır.	



Proje Adı	Bahçeli Evler Mah. Ortaokulu
Proje No	MEB.2004.51
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	23.08.2016-23.11.2017
Proje Bedeli(TL)	7.100.000,00
İhale Bedeli(TL)	5.944.840,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	2.034.683,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	5.944.840,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	35
Fiziki Gerçekleşme (%)	63
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 32 derslikli olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Zeytinli İlkokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	30.03.2017-25.11.2017
Proje Bedeli(TL)	2.498.925,00
İhale Bedeli(TL)	2.230.200,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yılı İçi Harcama (TL)	350.500,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.230.200,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	15
Fiziki Gerçekleşme (%)	29
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 16 derslikli olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Başören Ortaokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Ceyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	29.05.2017-24.12.2017
Proje Bedeli(TL)	2.059.200,00
İhale Bedeli(TL)	2.190.080,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	162.403,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.007.939,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	8
Fiziki Gerçekleşme (%)	10
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 12 derslikli olarak yapılmaktadır.

Proje Adı	Yavuz Sultan Selim Mah. Ortaokulu
Proje No	10428
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	29.05.2017-22.02.2018
Proje Bedeli(TL)	4.353.600,00
İhale Bedeli(TL)	3.257.980,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.741.440,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	4
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi


Proje 28 derslikli olarak yapılmaktadır.

Proje Adı	Remzi Oğuz Arık Mah. İmam Hatip Ortaokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	29.05.2017-23.01.2018
Proje Bedeli(TL)	2.574.000,00
İhale Bedeli(TL)	2.232.560,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	229.430,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.287.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	10
Fiziki Gerçekleşme (%)	15
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor


Proje Özet Bilgisi

Proje 168 derslikli olarak yapılmaktadır.

Proje Adı	Yıldırım Beyazıt Mah. İlkokulu
Proje No	10428
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	4.353.600,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.700.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	11.04.2017 tarihinde ihalesi yapıldı, sözleşme aşamasında
Proje Özet Bilgisi	
Proje 28 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	Denizli Mah. Ortaokulu
Proje No	10428
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	4.353.600,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.700.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	11.04.2017 tarihinde ihalesi yapıldı, sözleşme aşamasında
Proje Özet Bilgisi	
Proje 28 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	İstiklal Mah. İmam Hatip Ortaokulu
Proje No	10428
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	4.353.600,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	870.720,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 28 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Sofulu Mah. İlkokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	2.574.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	514.800,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	İhale edilmek üzere YİKOB'a gönderilmiştir.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 16 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Oğuzcan Hasan Muratlı İlkokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	2.574.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.287.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	11.04.2017 tarihinde ihalesi yapıldı, sözleşme aşamasında

Proje Özet Bilgisi


Proje 16 derslikli olarak yapılacaktır.

Proje Adı	Aydınlar Mah. Ortaokulu
Proje No	10428
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	4.353.600,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	870.720,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	İhale edilmek üzere YİKOB'a gönderilmiştir.


Proje Özet Bilgisi

Proje 28 derslikli olarak yapılacaktır.


Proje Adı	Bariş Mah. Ortaokulu
Proje No	MEB.2014.24 Lİ R
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	9.694.400,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.938.880,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	İhale edilmek üzere YİKOB'a gönderilmiştir.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 24 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	Cemalpaşa Mah. Ortaokulu
Proje No	MEB.2014.24 Lİ R
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	9.694.400,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.938.880,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	İhale edilmek üzere YİKOB'a gönderilmiştir.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 24 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Gürselpaşa Mah. İlkokulu
Proje No	MEB.2014.24 İO
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	10.201.600,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.040.320,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 24 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	Yurt Mah. Ortaokulu
Proje No	MEB.2014.24 OO
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	11.268.800,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.253.760,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 24 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	Belediye Evleri Mah. Ortaokulu
Proje No	MEB.2014.24 Lİ R
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	9.694.400,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.938.800,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	İhale edilmek üzere YİKOB'a gönderilmiştir.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 24 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Kurttepe Mah. Ortaokulu
Proje No	10428
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	4.353.600,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	870.720,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 28 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	Yıldırım Beyazıt Mah. Ortaokulu
Proje No	MEB.2014.24 OO
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	11.268.800,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.253.760,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 24 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Atakent Mah. Ortaokulu
Proje No	MEB.2014.24 OO
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	11.268.800,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.253.760,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 24 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	ZincirliBağlar Mah. İlkokulu
Proje No	MEB.2014.24 İO
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	10.201.600,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.040.320,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 24 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	İstiklal Mah. Ortaokulu
Proje No	MEB.2014.24 Lİ R
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	9.694.400,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.938.800,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 24 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	İstiklal Mah. İlkokulu
Proje No	10428
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	4.353.600,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.568.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 28 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	Şehit Metin Malkav Ortaokulu
Proje No	MEB.2014.24 Lİ R
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	9.694.400,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.938.880,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 24 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	İstiklal Mah. İlkokulu
Proje No	MEB.2014.20 İO R
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	7.840.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.568.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 20 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Tuğrulbey Ortaokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	2.574.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	514.800,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 16 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	100. Yıl İlkokulu
Proje No	10428
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Kozan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	4.353.600,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	870.720,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 28 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	İsmet İnönü Ortaokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Kozan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	2.574.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	514.800,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 16 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Bağtepe İlkokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Kozan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	2.059.200,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	411.840,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 12 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	İstiklal İlkokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Tufanbeyli
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	2.059.200,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	411.840,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 12 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Cumhuriyet Mah. Ortaokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	İmamoğlu
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	2.574.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	514.800,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 16 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu
Proje No	MEB.2014.20 İO R
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	7.840.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.568.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 20 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Akşemsettin Ortaokulu
Proje No	MEB.2014.24 Lİ R
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	9.694.400,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.938.880,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 24 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	100. Yıl Mah. İmam Hatip Ortaokulu
Proje No	MEB.2014.24 Lİ R
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	9.694.400,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.938.880,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.

Proje Özet Bilgisi

Proje 24 derslikli olarak yapılacaktır.


Proje Adı	Kamışlı Fatih İlkokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Pozantı
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	1.544.400,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	308.880,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 8 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	Köklüce Mah. İlkokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	2.574.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	514.800,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 16 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Mehmet Adil İkiz Ortaokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	2.574.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	514.800,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 16 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	Kılıçlı Mah. Ortaokulu
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	2.574.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	514.800,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 16 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	Saimbeyli Anaokulu
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Saimbeyli
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	1.300.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	500.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 7 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	Mirzaçelebi Mah. Anaokulu
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	1.300.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	500.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 7 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	Akdeniz Mah. Anaokulu
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yumurtalık
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	1.300.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	500.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 7 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Huzurevleri Mah. Anaokulu
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	1.300.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	500.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 7 derslikli olarak yapılacaktır.	




Proje Adı	Beyceli Mah. Anaokulu
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	1.300.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	500.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 7 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Tufanpaşa Mah. Anaokulu
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Tufanbeyli
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	1.300.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	500.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 7 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	ZincirliBağlar Mah. Anaokulu
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	1.300.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	500.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 7 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Atakent Mah. Anaokulu
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	1.300.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	500.880,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 7 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Asmalı Göbeören İlkokulu Prefabrik Bina
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yumurtalık
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	200.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	200.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Bakanlığımızdan proje bekleniyor.

Proje Özet Bilgisi

Proje 2 derslikli olarak yapılacaktır.

Proje Adı	Gölovası İlkokulu Prefabrik Bina
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yumurtalık
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	200.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	200.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Bakanlığımızdan proje bekleniyor.

Proje Özet Bilgisi

Proje 2 derslikli olarak yapılacaktır.

Proje Adı	Kaldırım İlkokulu Prefabrik Bina
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yumurtalık
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	200.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	200.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Bakanlığımızdan proje bekleniyor.

Proje Özet Bilgisi

Proje 2 derslikli olarak yapılacaktır.

Proje Adı	Kaldırım Ortaokulu Prefabrik Bina
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yumurtalık
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	200.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	200.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Bakanlığımızdan proje bekleniyor.


Proje Özet Bilgisi

Proje 2 derslikli olarak yapılacaktır.


Proje Adı	Kuzupınarı Zeynepli İlkokulu Prefabrik Bina
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yumurtalık
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	200.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödenęi(TL)	200.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Bakanlığımızdan proje bekleniyor.

Proje Özet Bilgisi


Proje 2 derslikli olarak yapılacaktır.



Proje Adı	Meryem Ali Öztürk Ortaokulu Prefabrik Bina
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-İlköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yumurtalık
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	200.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödenęi(TL)	200.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Bakanlığımızdan proje bekleniyor.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 2 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Karagöçer İlkokulu Prefabrik Bina
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Karataş
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	400.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	400.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Bakanlığımızdan proje bekleniyor.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 4 derslikli olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Çavuşlu İlkokulu Prefabrik Bina
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Karataş
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	400.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	400.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Bakanlığımızdan proje bekleniyor.

Proje Özet Bilgisi

Proje 4 derslikli olarak yapılacaktır.

Proje Adı	Sirkenli İlkokulu Prefabrik Bina
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-ilköğretim
Proje Yeri(İlçe)	Karataş
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	400.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	400.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Bakanlığımızdan proje bekleniyor.

Proje Özet Bilgisi

Proje 4 derslikli olarak yapılacaktır.

Proje Adı	İmam Hatip Lisesi (Uçak Alanı Mah.)
Proje No	MEB.2004.51
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	23.07.2015-09.10.2016
Proje Bedeli(TL)	8.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	4.422.016,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	3.309.233,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	4.422.017,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	75
Fiziki Gerçekleşme (%)	80
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 32 derslikli olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Anadolu Lisesi
Proje No	MEB.2014.24 Lİ
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	23.08.2016-18.07.2017
Proje Bedeli(TL)	8.500.000,00
İhale Bedeli(TL)	6.512.420,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	1.162.850,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	3.304.842,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	5.357.150,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	70
Fiziki Gerçekleşme (%)	89
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 24 derslikli olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Anadolu Lisesi (Barış Mah.)
Proje No	MEB.2014.32 Lİ
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	10.08.2016-04.08.2017
Proje Bedeli(TL)	9.500.000,00
İhale Bedeli(TL)	9.192.701,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	1.972.555,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	5.392.769,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	7.227.445,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	80
Fiziki Gerçekleşme (%)	86
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 32 derslikli olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Anadolu Lisesi (Haydarođlu Mah.)
Proje No	MEB.2014.24 Lİ
Sektörü ve Altsektörü	Eđitim-Ortaöđretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüređir
Başlama - Bitiş Tarihi	19.08.2016-14.07.2017
Proje Bedeli(TL)	8.500.000,00
İhale Bedeli(TL)	6.439.850,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	1.275.620,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	2.303.913,00
2017 Yılı Ödeneđi(TL)	5.174.380,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	56
Fiziki Gerçekleşme (%)	91
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 24 derslikli olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Anadolu Lisesi (Kazım Karabekir Mah.)
Proje No	MEB.2014.24 Lİ
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	16.09.2016-11.08.2017
Proje Bedeli(TL)	8.500.000,00
İhale Bedeli(TL)	6.310.640,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	1.316.175,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	2.763.721,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	5.008.825,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	65
Fiziki Gerçekleşme (%)	82
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 24 derslikli olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Öğrenci Pansiyonu
Proje No	MEB.2004.76
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Feke
Başlama - Bitiş Tarihi	15.07.2016-09.07.2017
Proje Bedeli(TL)	5.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	4.186.640,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	1.250.047,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.287.909,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.949.953,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	61
Fiziki Gerçekleşme (%)	93
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 200 kişilik öğrenci pansiyonu olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	İmam Hatip Lisesi
Proje No	MEB.2014.16 İHL+MEB.2014.200 P
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Tufanbeyli
Başlama - Bitiş Tarihi	04.08.2016-27.10.2017
Proje Bedeli(TL)	12.100.000,00
İhale Bedeli(TL)	12.059.600,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	3.031.137,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.254.033,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	9.068.863,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	36
Fiziki Gerçekleşme (%)	70
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor


Proje Özet Bilgisi

Proje 16 derslik ve 200 kişilik öğrenci pansiyonu olarak yapılmaktadır.

Proje Adı	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mithatpaşa Mah.)
Proje No	MEB.2014.24 İHL
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri(İlçe)	Ceyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	19.08.2016-14.07.2017
Proje Bedeli(TL)	8.500.000,00
İhale Bedeli(TL)	7.444.620,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	1.532.292,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	3.287.669,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	6.967.708,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	65
Fiziki Gerçekleşme (%)	91
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor
Proje Özet Bilgisi	
Proje 24 derslik olarak yapılmaktadır.	



Proje Adı	Osmangazi İmam Hatip Lisesi Spor Salonu
Proje No	MEB.2004.63
Sektörü ve Altsektörü	Spor-Spor Salonu
Proje Yeri(İlçe)	Kozan
Başlama - Bitiş Tarihi	31.08.2016-28.03.2017
Proje Bedeli(TL)	2.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	1.749.940,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	380.678,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.303.521,00
2017 Yılı Ödenęi(TL)	1.619.322,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	96
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı bitti
Proje Özet Bilgisi	
Proje spor salonu olarak yapılmaktadır.	



Proje Adı	Doruk Çok Programlı Anadolu Lisesi Atölye Binası
Proje No	MEB.2000.35
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri(İlçe)	Ceyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	07.09.2016-04.04.2017
Proje Bedeli(TL)	2.010.000,00
İhale Bedeli(TL)	2.564.022,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	476.086,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	947.298,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.533.914,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	56
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor
Proje Özet Bilgisi	
Proje atölye binası olarak yapılmaktadır.	



Proje Adı	Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi Atölye Binası
Proje No	MEB.2000.32
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri(İlçe)	Kozan
Başlama - Bitiş Tarihi	26.08.2016-02.05.2017
Proje Bedeli(TL)	2.770.000,00
İhale Bedeli(TL)	2.765.920,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	576.735,00
2017 Yılı İçerisinde Harcama (TL)	752.395,00
2017 Yılı Ödenen(TL)	2.193.265,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	48
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor
Proje Özet Bilgisi	
Proje atölye binası olarak yapılmaktadır.	



Proje Adı	İmamoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binaları
Proje No	MEB.2000.32, MEB.2000.32
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri(İlçe)	İmamoğlu
Başlama - Bitiş Tarihi	01.08.2016-27.05.2017
Proje Bedeli(TL)	5.410.000,00
İhale Bedeli(TL)	5.409.920,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	1.789.850,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	2.220.346,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	3.860.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	75
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor
Proje Özet Bilgisi	
Proje 2 adet atölye binası olarak yapılmaktadır.	



Proje Adı	Anadolu Lisesi
Proje No	MEB.2014.24 Lİ
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	04.10.2016-29.08.2017
Proje Bedeli(TL)	8.500.000,00
İhale Bedeli(TL)	6.250.460,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	739.444,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	2.790.349,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	5.510.556,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	56
Fiziki Gerçekleşme (%)	77
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Proje 24 derslik olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Anadolu Lisesi
Proje No	MEB.2014.24 Lİ
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	14.11.2016-09.10.2017
Proje Bedeli(TL)	8.500.000,00
İhale Bedeli(TL)	6.193.584,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	481.775,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.276.480,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	5.718.225,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	28
Fiziki Gerçekleşme (%)	64
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Proje 24 derslik olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Proje No	MEB.2014.24 Lİ, MEB.2000.32, MEB.2004.60
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	21.10.2016-05.03.2018
Proje Bedeli(TL)	13.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	9.670.100,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	192.160,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	2.568.768,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	9.595.840,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	30
Fiziki Gerçekleşme (%)	47
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 24 derslik, 2 atölyeli olarak yapılmaktadır.	



Proje Adı	Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi Atölye Binası
Proje No	MEB.2004.60
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri(İlçe)	Aladağ
Başlama - Bitiş Tarihi	10.11.2016-07.07.2017
Proje Bedeli(TL)	2.250.000,00
İhale Bedeli(TL)	1.171.740,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	191.569,00
2017 Yılı İçerisi Harcama (TL)	243.518,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.073.431,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	37
Fiziki Gerçekleşme (%)	90
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Proje 1 adet atölye binası olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Mehmet Kemal Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binası
Proje No	MEB.2000.32
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	14.11.2016-12.05.2017
Proje Bedeli(TL)	2.250.000,00
İhale Bedeli(TL)	1.295.404,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	291.578,00
2017 Yılı İçerisinde Harcama (TL)	882.798,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.025.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	91
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı bitti.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 1 adet atölye binası olarak yapılmıştır.	



Proje Adı	Fen Lisesi
Proje No	MEB.2014.24 İHL, MEB.2014.200 P
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	02.11.2016-25.01.2018
Proje Bedeli(TL)	13.500.000,00
İhale Bedeli(TL)	12.355.780,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yılı İçerisinde Harcama (TL)	2.636.530,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	12.360.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	21
Fiziki Gerçekleşme (%)	50
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 24 derslik ve 200 kişilik öğrenci pansiyonu olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	İmam Hatip Lisesi
Proje No	MEB.2014.24 Lİ, MEB.2014.100 P
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	09.06.2017-03.08.2018
Proje Bedeli(TL)	12.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	10.989.340,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	778.005,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	10.300.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	7
Fiziki Gerçekleşme (%)	8
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Proje 24 derslik, 100 kişilik öğrenci pansiyonu olarak yapılacaktır.



Proje Adı	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Proje No	MEB.2014.24 Lİ, MEB.2000.32, MEB.2004.60
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	04.02.2017-24.07.2018
Proje Bedeli(TL)	13.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	8.447.266,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödenēği(TL)	9.450.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	24
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Proje 24 derslik, 2 atölyeli olarak yapılacaktır.




Proje Adı	Anadolu Lisesi
Proje No	MEB.2014.24 Lİ
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Kozan
Başlama - Bitiş Tarihi	30.01.2017-25.12.2017
Proje Bedeli(TL)	9.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	6.399.140,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	2.103.103,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	3.554.333,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	33
Fiziki Gerçekleşme (%)	41
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Proje 24 derslik olarak yapılacaktır.

Proje Adı	Erkek İmam Hatip Lisesi
Proje No	MEB.2014.24 Lİ
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	9.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.500.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	26.05.2017 tarihinde ihalesi yapıldı, sözleşme aşamasında.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 24 derslik olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Proje No	MEB.2014.32 Lİ, MEB.2000.32, MEB.2004.60
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	14.700.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödenęi(TL)	6.250.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	İhale edilmek üzere YİKOB'a gönderildi.

Proje Özet Bilgisi

Proje 32 derslik, 2 atölyeli olarak yapılacaktır.

Proje Adı	Fatma Zehra Kız İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu
Proje No	MEB.2014.200 P
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	20.01.2017-15.12.2017
Proje Bedeli(TL)	7.550.000,00
İhale Bedeli(TL)	5.857.284,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yılı İçerisinde Harcama (TL)	406.415,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.600.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	7
Fiziki Gerçekleşme (%)	10
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor.
Proje Özet Bilgisi	
Proje 200 kişilik öğrenci pansiyonu olarak yapılmaktadır.	



Proje Adı	Spor Salonu (ATO Anadolu Lisesi)
Proje No	MEB.2004.63
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	30.03.2017-25.09.2017
Proje Bedeli(TL)	2.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	1.495.060,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	153.810,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.300.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	10
Fiziki Gerçekleşme (%)	42
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Proje spor salonu olarak yapılmaktadır.



Proje Adı	Spor Salonu (Cumhuriyet Mah.)
Proje No	MEB.2004.63
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	2.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	300.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	26.05.2017 tarihinde ihalesi yapıldı, sözleşme aşamasında.
Proje Özet Bilgisi	
Proje spor salonu olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Anadolu Lisesi (Belediye Evleri Mah.)
Proje No	MEB.2014.24 Lİ
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	-----
Proje Bedeli(TL)	8.500.000,00
İhale Bedeli(TL)	-----
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	850.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır

Proje Özet Bilgisi


Proje 24 derslik olarak yapılacaktır.

Proje Adı	Anadolu Lisesi (Çamlıbel Mah.)
Proje No	MEB.2014.24 Lİ, MEB.2004.56
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	-----
Proje Bedeli(TL)	16.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	-----
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.600.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır


Proje Özet Bilgisi

Proje 24 derslik, 200 kişilik öğrenci pansiyonu olarak yapılacaktır.

Proje Adı	İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu
Proje No	MEB.2004.56
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	İmamoğlu
Başlama - Bitiş Tarihi	-----
Proje Bedeli(TL)	8.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	-----
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödenēi(TL)	1.000.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır
Proje Özet Bilgisi	
Proje 200 kişilik öğrenci pansiyonu olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Saimbeyli Spor Salonu
Proje No	MEB.2004.63
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Saimbeyli
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	2.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	642.420,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır
Proje Özet Bilgisi	
Proje spor salonu olarak yapılacaktır.	



Proje Adı	Spor Salonu (Atakent Mah.)
Proje No	MEB.2004.63
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Yüreğir
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	2.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	642.420,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır

Proje Özet Bilgisi

Proje spor salonu olarak yapılacaktır.

Proje Adı	Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Proje No	MEB.2014.24 Lİ +MEB.2000.32+MEB.2000.32+MEB.2004.63
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	14.700.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yılı İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	6.250.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır

Proje Özet Bilgisi

Proje 24 derslik, 2 atölye, spor salonu olarak yapılacaktır.

Proje Adı	Kıvanç Tekstil Anadolu İmam Hatip Lisesi
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	10.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	7.000.000,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.500.000,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	3.000.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	85
Fiziki Gerçekleşme (%)	85
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 58 derslikli olup Hayırsever Kuruluş Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş tarafından yaptırılmaktadır.




Proje Adı	TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri(İlçe)	Sarıçam
Başlama - Bitiş Tarihi	09.08.2016
Proje Bedeli(TL)	7.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	7.000.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	1.400.000,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	4.200.000,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	5.600.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	80
Fiziki Gerçekleşme (%)	80
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje 24 derslikli olup Hayırsever Kuruluş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılmaktadır.



Proje Adı	Tufanbeyli Enerjisa Mesleki ve Teknik Anadolu
Proje No	Özel Tip
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri(İlçe)	Tufanbeyli
Başlama - Bitiş Tarihi	15.08.2016-15.08.2017
Proje Bedeli(TL)	5.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödenęi(TL)	
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	15
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor
Proje Özet Bilgisi	
Proje 12 derslik ve 2 atölyeli olup Hayırsever Kuruluş Enerjisa tarafından yaptırılmaktadır.	



Proje Adı	Sanko Aladağ Anadolu Lisesi
Proje No	10370
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Aladağ
Başlama - Bitiş Tarihi	05.12.2016-10.09.2017
Proje Bedeli(TL)	2.500.000,00
İhale Bedeli(TL)	2.382.420,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yılı İçerisi Harcama (TL)	870.445,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.382.420,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	43
Fiziki Gerçekleşme (%)	65
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Proje 16 derslikli olup Hayırsever Kuruluş Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından para bağışında bulunulmuştur.



Proje Adı	İller Bankası Öğrenci Pansiyonu
Proje No	MEB.2014.300 P
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Aladağ
Başlama - Bitiş Tarihi	20.10.2016---15.01.2018
Proje Bedeli(TL)	10.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	8.512.520,00
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	425.626,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	2.000.442,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	8.086.894,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	30
Fiziki Gerçekleşme (%)	30
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaatı devam etmektedir.

Proje Özet Bilgisi

Proje 300 kişilik öğrenci pansiyonu olup Hayırsever Kuruluş İller Bankası A.Ş. tarafından yaptırılmaktadır.



Proje Adı	İmam Hatip Lisesi
Proje No	MEB.2014.16 İHO
Sektörü ve Altsektörü	Eğitim-Ortaöğretim
Proje Yeri(İlçe)	Pozantı
Başlama - Bitiş Tarihi	---
Proje Bedeli(TL)	5.000.000,00
İhale Bedeli(TL)	---
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği(TL)	
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır.

Proje Özet Bilgisi

Proje 16 derslikli olup Hayırsever Kuruluş Borsa İstanbul A.Ş tarafından yaptırılacaktır.



T.C.
ADANA VALİLİĞİ



ADANA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Huzurevi Ek bina inşaatı
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	
Proje Yeri (İlçe)	Çukurova
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli (TL)	17,650,000
İhale Bedeli (TL)	10.339,000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	300,000
2017Yıl İçi Harcama	0
2017Yılı Ödeneği (TL)	0
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek (TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	İhalesi yapıldı.

Proje Özet Bilgisi

Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ek 150 kapasiteli hizmet binasının ihalesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılmış olup, Yer teslimi yapılmıştır. İnşaat iş ve işlemleri devam etmektedir.




Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Çocuk Destek Merkez Hizmet binası inşaatı ve SHM-İl Müdürlüğü hizmet binası inşaatı
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	Diğer Kamu Hizmetleri
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	0
Proje Bedeli(TL)	14,750,000
İhale Bedeli(TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	159,000
2017Yıl İçi Harcama	
2017Yılı Ödeneği(TL)	350,000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	(EPI) aşamasında

Proje Özet Bilgisi

Mevcut imar planında sosyal ve kültürel alan olarak görünen arsa üzerine "Mekânsal Planlar Yapı Yönetmeliği'nin 5. Maddesi gereği resmi kurum yapılabilmesi için imar planında değişiklik yapılması gerekmektedir. Başvuru evrakları hazırlanıp Adana Büyükşehir Belediyesine imar planı değişikliği 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmış olup Seyhan Belediyesince 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 18 ve 19 maddeleri kısmi imar uygulamaları yapılması için Seyhan Belediyesi Encümenine dosya halinde sunulmuş olup, Encümen kararı ve imar durumu alınmasını müteakip Etüt+Proje+İnşaat iş ve işlemlerine başlanacaktır.

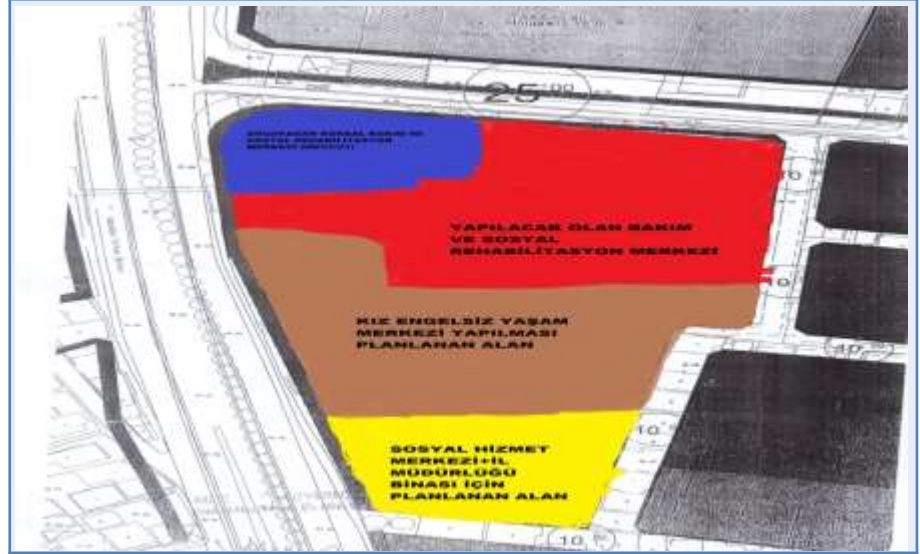

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kozan SHM Hizmet Bina inşası
Proje No	
Sektörü ve Alt sektörü	DEĞİR KAMU HİZMETİ
Proje Yeri(İlçe)	KOZAN
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	6.100,000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	
2017Yıl İçi Harcama	
2017Yılı Ödeneği (TL)	100,000
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek (TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	(E.P.İ AŞAMASINDA)

Proje Özet Bilgisi

Bakanlığımız 2017 yılı yatırım programında «Etüt+Proje+İnşaat» karakteristiğinde yer alan Kozan Sosyal Hizmet Merkezi hizmet binasının etüt, proje inşaat tüm iş ve işlemlerinin Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yaptırılması için Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 12.01.2017 tarih ve 441 sayılı yazımız ile Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yetki verilmesi talep edilmiş olup, Etüt+Proje+İnşaat iş ve işlemleri Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	CEYHAN Sakine GARİPOĞLU HUZUREVİ İNŞAATI 100 KAPASİTELİ
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	Diğer Kamu Hizmeti
Proje Yeri(İlçe)	Ceyhan
Başlama - Bitiş Tarihi	2017/Haziran Sonu
Proje Bedeli(TL)	
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017Yıl İçi Harcama	
2017Yılı Ödeneği(TL)	
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	İNŞAAT
Proje Özet Bilgisi	

- 24/07/2012 tarihinde protokol imzalandı. Protokole göre işin süresi 365 takvim günüdür.
- Ceyhan Belediyesi tarafından hazineye devredilen , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsisli 2920 m2 taşınmaz üzerine yapılan inşaat tamamlandığında Z+3 kat, toplam 1200 m2 kapalı alandan oluşacak.
- Kasım GARİPOĞLUNU'nun vefatı nedeniyle inşaat yarım kalmış olup, Aile mirasçılarına noter kanalıyla ihtarname çekilmiş ve Aileyle görüşülmüş olup Projeyi 2017 Haziran ayında bitirip teslim edeceklerini beyan etmişlerdir. Ancak yapılan görüşmelerde inşaatı devam ettiremeyeceklerini beyan etmeleri nedeniyle işbirliği protokolü tek taraflı fesh edilmiş olup, Ceyhan Kaymakamlığınca iş ve işlemler yürütülmektedir.





T.C.
ADANA VALİLİĞİ



ADANA RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Adı	ADANA YENİ MÜZE KOMPLEKSİ (ARKEOLOJİ, MOZAİK MÜZESİ) TEŞHİR TANZİM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Kültür ve Turizm
Proje Yeri(İlçe)	Seyhan / ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	04.03.2015 - 26.05.2017
Proje Bedeli (Keşif Artışı ile)(TL)	30.924.332,37
İhale Bedeli(TL)	20.634.587,76
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	22.922.521,95
2017Yıl İçi Harcama	2.673.504,76
2017Yılı Ödeneği(TL)	3.500.852,00
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	83 %
Fiziki Gerçekleşme (%)	95 %
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Müzenin bir kısmı ziyarete açılmış olup; iş devam etmektedir.



Proje Adı	ADANA YUMURTALIK SÜLEYMAN KULESİ RESTORASYONU İŞİ
Proje No	-
Sektörü ve Altsektörü	Kültür ve Turizm
Proje Yeri(İlçe)	Yumurtalık / ADANA
Başlama - Bitiş Tarihi	18.09.2015 - 15.04.2017
Proje Bedeli(TL)	1.762.815,76
İhale Bedeli(TL)	1.218.278,63
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	1.762.813,80
2017Yıl İçi Harcama	-
2017Yılı Ödeneği(TL)	-
2017Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	100 %
Fiziki Gerçekleşme (%)	100 %
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlandı

Proje Özet Bilgisi

Tüm imalatlar tamamlanmış olup; geçici kabul aşamasındadır.





T.C.
ADANA VALİLİĞİ



İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Tufanbeyli Kültür Merkezi
Proje No	
Sektörü ve Alt sektörü	Kültür ve Turizm
Proje Yeri (İlçe)	Tufanbeyli İlçesi
Başlama - Bitiş Tarihi	1996-
Proje Bedeli (TL)	4.250.000,00
İhale Bedeli (TL)	4.250.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	0
2017 Yılı Ödeneği (TL)	0
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek (TL) (önceki yıllardan devreden)	3.250.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Yarım Kaldı (YK)

Proje Özet Bilgisi

250 kişilik çok amaçlı salon, okuma salonları, işlikler, idari ve teknik mekanların yer alacağı Tufanbeyli Kültür Merkezi çizim projesi için önerilen arsa alanının küçük olması nedeni ile proje revize çalışmaları başlatıldı. İnşaatın bitirilip, hizmete açılabilmesi için ödeneye ihtiyaç vardır. Mevcut ödeneği 3.250.000,00.- TL olup İlimizin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) hesabında bulunmaktadır.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Magarsus Antik Kenti Tiyatro Kazısı
Proje No	
Sektörü ve Alt sektörü	Kültür ve Turizm
Proje Yeri (İlçe)	Karataş İlçesi
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-
Proje Bedeli (TL)	1.345.000,00
İhale Bedeli (TL)	1.345.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	1.290.000,00
2017 Yılı İçi Harcama	55.000,00
2017 Yılı Ödeneği (TL)	55.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek (TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor (DE)

Proje Özet Bilgisi

İlimiz Karataş ilçesinde bulunan Magarsus Antik Kenti Tiyatro kazı çalışmalarının 2016 yılına ait bütün çalışmalar bitirildi (I. ,II. ve III. Etap çalışmaları).

2017 yılı mali bütçesinden gelen ödenekler ile kazı çalışmaları devam etmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	AİGEAİ Antik Kenti Mozaik Kazısı
Proje No	
Sektörü ve Alt sektörü	Kültür ve Turizm
Proje Yeri (İlçe)	Yumurtalık İlçesi
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-
Proje Bedeli (TL)	277.000,00
İhale Bedeli (TL)	277.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	242.000,00
2017 Yılı İçi Harcama	35.000,00
2017 Yılı Ödeneği (TL)	35.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek (TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor (DE)

Proje Özet Bilgisi

İlimiz Yumurtalık ilçesinde bulunan AİGEAİ Antik Kenti kazı çalışmalarının 2016 yılı I. Etap ve II. Etap çalışmaları tamamlanmış olup 2017 yılı mali bütçesinden gelen ödenekler ile kazı çalışmaları devam etmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Tatarlı Höyük Kazısı
Proje No	
Sektörü ve Alt sektörü	Kültür ve Turizm
Proje Yeri (İlçe)	Ceyhan İlçesi
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-
Proje Bedeli (TL)	525.139,64
İhale Bedeli (TL)	525.139,64
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	500.000,00
2017 Yılı İçerisinde Harcama	25.139,64
2017 Yılı Ödeneği (TL)	50.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek (TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor (DE)

Proje Özet Bilgisi

İlimiz Ceyhan İlçesinde bulunan Tatarlı Höyük kazı çalışmaları 2017 yılı mali bütçesinden gelen ödenekler ile kazı çalışmaları devam etmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Anavarza Antik Kenti Kazısı
Proje No	
Sektörü ve Alt sektörü	Kültür ve Turizm
Proje Yeri (İlçe)	Kozan İlçesi
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-
Proje Bedeli (TL)	2.420.000,00
İhale Bedeli (TL)	2.420.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2.420.000,00
2017 Yıl İçi Harcama	-
2017 Yılı Ödeneği (TL)	80.000,00
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek (TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor (DE)

Proje Özet Bilgisi

İlimiz Kozan ilçesinde bulunan Anavarza Antik Kenti kazı çalışmalarının 2016 yılı 4. Etap arkeolojik kazı çalışmaları tamamlanmış olup 2017 yılı mali bütçesinden gelen ödenekler ile kazı çalışmaları devam etmektedir.





T.C.
ADANA VALİLİĞİ



DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	ANADOLU ALACASI GELİŞTİRME PROJ.
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	
Proje Yeri(İlçe)	YÜREĞİR
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	1143250
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017Yıl İçi Harcama (TL)	412015
2017Yılı Ödeneği(TL)	1143250
2016Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	BİTKİ HAST.VE ZARAR.MÜCADELE ARAŞ.PROJ.
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	
Proje Yeri(İlçe)	YÜREĞİR
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	20550
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017Yıl İçi Harcama (TL)	8172
2017Yılı Ödeneği(TL)	20550
2016Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	TARLA BİTKİLERİ ARAŞ.GEL.PROJ.
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	
Proje Yeri(İlçe)	YÜREĞİR
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	200000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017Yıl İçi Harcama (TL)	40597
2017Yılı Ödeneği(TL)	200000
2016Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	TARIMSAL EKONOMİ ARŞ.PROJ.
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	
Proje Yeri(İlçe)	YÜREĞİR
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	37375
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017Yıl İçi Harcama (TL)	24868
2017Yılı Ödeneği(TL)	37375
2016Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	BİOGÜVENLİK ARAŞ.GELŞ.PROJ.
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	
Proje Yeri(İlçe)	YÜREĞİR
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	190000
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017Yıl İçi Harcama (TL)	12000
2017Yılı Ödeneği(TL)	190000
2016Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞ.PROJ.
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	
Proje Yeri(İlçe)	YÜREĞİR
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	231200
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017Yıl İçi Harcama (TL)	62477
2017Yılı Ödeneği(TL)	231200
2016Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	MERA PROJESİ
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	
Proje Yeri(İlçe)	YÜREĞİR
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017Yıl İçi Harcama (TL)	12516
2017Yılı Ödeneği(TL)	75000
2016Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	TAGEM ARAŞ.ENS.SULAMA ALTYAPI MOD PROJ.
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	
Proje Yeri(İlçe)	YÜREĞİR
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017Yıl İçi Harcama (TL)	3636
2017Yılı Ödeneği(TL)	80000
2016Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞT.VE KORUNMASI PROJ
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	
Proje Yeri(İlçe)	YÜREĞİR
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli(TL)	
İhale Bedeli(TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	
2017Yıl İçi Harcama (TL)	3530
2017Yılı Ödeneği(TL)	10000
2016Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi
